


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratacion para la ejecucino de la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal

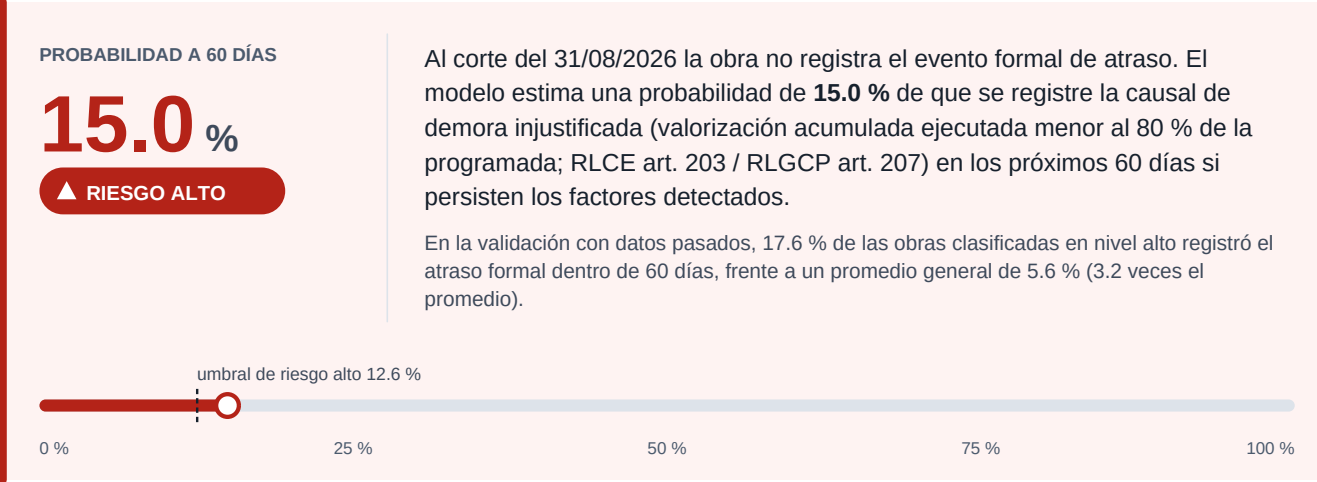


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	47 desde 16/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	contratacion para la ejecucino de la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
Contratista	CONSORCIO PISTAS ARKA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHUSCHI / CANGALLO / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2406444
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	47 asientos entre 16/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

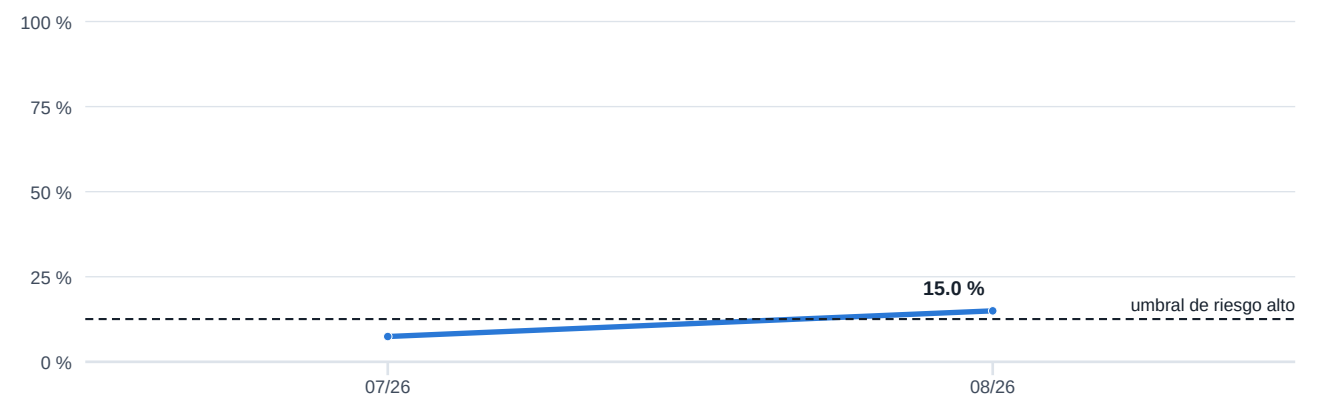

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.567
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.226
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.194
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.133
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.72 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.119
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.099
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Hubo registros en el cuaderno 17 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.066

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.0 %	14.8 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	15.0 %	15.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 42 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...acion y mantener activos aquellos frentes de trabajo o partidas que no se encuentren condicionados ni afectados directamente por la interferencia de las tuberías de agua potable, a fin de mitigar los retrasos en la ejecución total del proyecto. también se precisa que el día de hoy viernes 28.08.26 se tuvo una reunión en forma conjunta entre los funcionarios de la municipalidad distrital de chuschi, como ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_SPV · 25/08/2026

RESPUESTA RESPECTO A LAS CALLES ALFONSO UGARTE, BELLA VISTA, SAN MARTIN, SANTA ROSA Y JR AYACUCHO.: RESPUESTA RESPECTO A LAS CALLES ALFONSO UGARTE, BELLA VISTA, SAN MARTIN, SANTA ROSA Y JR AYACUCHO. Esta supervisión verifica y valida que los planos aprobados por la Entidad, respecto a las calles Alfonso Ugarte, Bella Vista, San Martin, Santa Rosa y Jr. Ayacucho (Asientos No 28, No 29 y No 34 del Residente) tienen defi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

... del residente en riesgos en interferencias de servicios y técnicos (23/07/2026), en el punto 02 se indica que existen instalaciones domiciliarias (agua potable y alcantarillado) nuevas las cuales se demoran en adquirir sus accesorios por los propietarios por lo cual no es posible culminar las instalaciones nuevas (agua potable y alcantarillado), también se muestra en el asiento n 021 del residente en a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...ion, en estos asientos e informes se informaron de la necesidad de realizar un levantamiento general luego de la cual era necesario realizar una evaluación y poderlo ejecutar por lo cual se generó en retraso en las partida de 02.01.01 corte de material compacto a nivel de sub rasante

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...ar a la residencia que según la programación de obra la partida de corte de material compacto a nivel de sub rasante tiene como fecha de inicio el 22.07.26 hasta el 13.08.26, en ese sentido existe un atraso en la ejecución de la partida se requiere la justificación respectiva ya que según el avance de las 20 calles programadas solo se tiene ejecutado 06 calles que representa un avance del 30% aproximad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Consultas · SOEC_SPV · 10/08/2026

ABSOLUCION DE CONSULTA - ASIENTO No 15: RESPUESTA A LA CONSULTA DEL ASIENTO No 015 DEL RESIDENTE DE OBRATeniendo en consideración los estudios de mecánica de suelos, la calicata C10 es la que representa al Jirón Lucanas, de las cuales se puede concluir lo siguiente: Cota de 0.00m hasta 0.20m, material de partícula fina, de color marrón con presencia de algunas raíces. Cota de 0.20m hasta 1.50m, es un suelo de clasifica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/07/2026

AUTORIZA CORTE EN JR CHIKLLARAZO Y JR 28 DE JULIO ULTIMA: Previa coordinación y validación de los puntos de control esta supervisión dentro de funciones y atribuciones autoriza el corte a nivel de la subrasante de las siguientes calles: • Jr Chikllarzo primera cuadra • Jr Chikllarzo segunda cuadra • Jr 28 de Julio ultima cuadra

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 7 · Órdenes · SOEC_SPV · 23/07/2026

OPINIÓN A LA NUEVA RASANTE EN JR CHIKLLARAZO: Esta supervisión verifica y valida que los planos aprobados respecto al Jr. Chikllarazo por la entidad tienen deficiencias y no guarda relación entre el plano de perfil con la sección. La contratista viene proponiendo la nueva sección y pendientes acorde a la topografía del terreno actual. luego de haber revisado los documentos adjuntos esta supervisión considera precedente...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
