


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: "mejoramiento de las vías vecinales en el tramo cambio puente - 14 incas - cascajal, distrito de chimbote, provincia de santa, departamento de ancash", con CUI N° 2554665

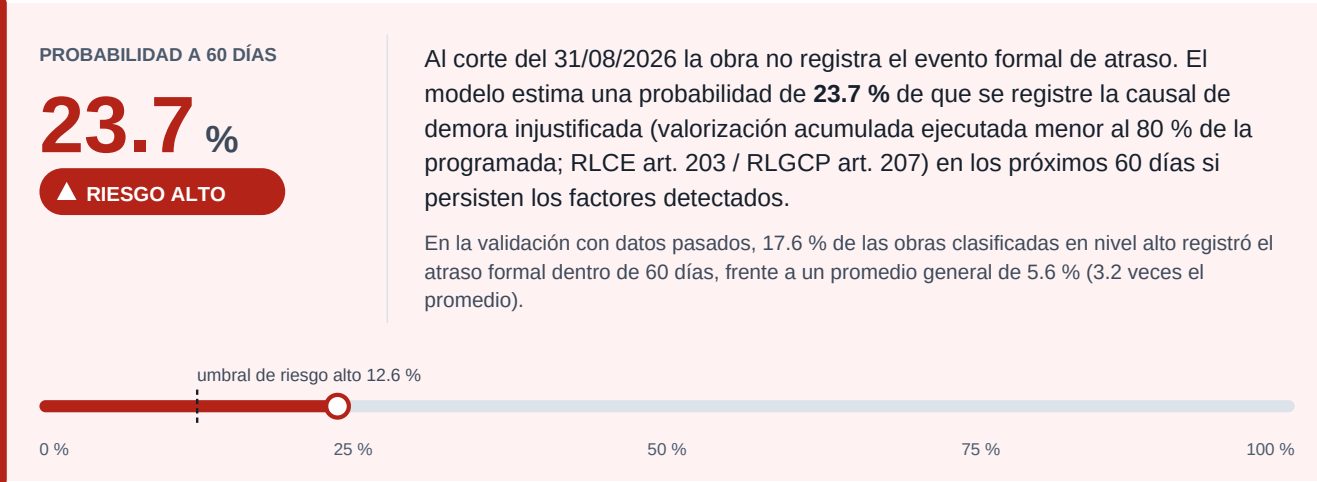


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 21,949,171.65	240 días	288 desde 12/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VECINALES EN EL TRAMO CAMBIO PUENTE - 14 INCAS - CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2554665
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO
Contratista	CONSORCIO GALA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHIMBOTE / SANTA / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2554665
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VECINALES EN EL TRAMO CAMBIO PUENTE - 14 INCAS - CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2377550
Monto del contrato	S/ 21,949,171.65
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,904,162.04
Cuaderno de obra digital	288 asientos entre 12/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

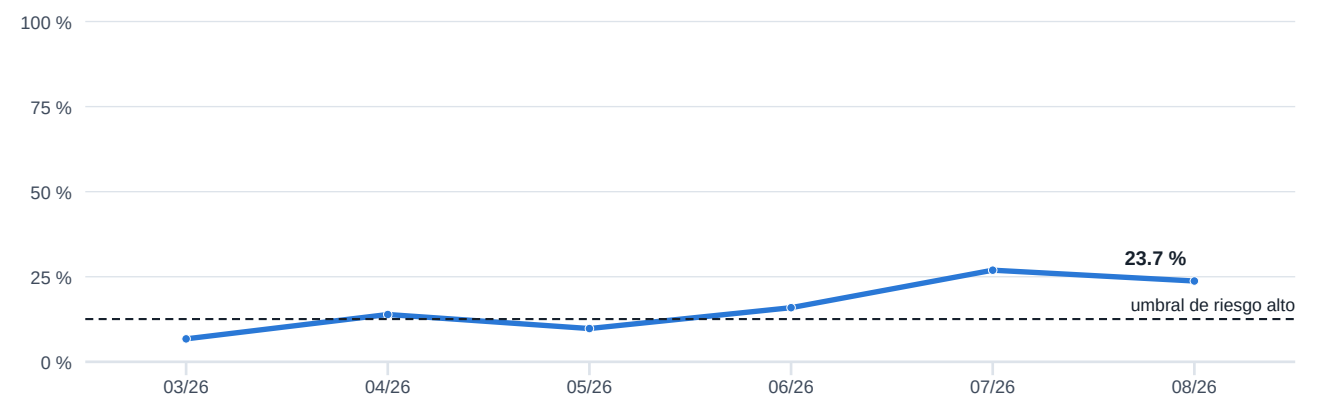

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.643
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.230
Faltan 75 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.211
4 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.163
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.135
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.129
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.109
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.102

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	23.7 %	23.5 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	23.7 %	23.5 %	-0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 273 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

ORDENES: EN LA PRESENTE FECHA LA ENTIDAD NOTIFICA AL SUSCRITO EL DOCUMENTO REMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CAMBIO PUENTE Y ANEXOS, DONDE SOLICITA DE MANERA URGENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA MITIGACION AMBIENTAL REFIRIENDOSE AL REGADO DEL DESVIO DE MANERA URGENTE, POR LO QUE SE LE ORDENA AL CONTRATISTA MEDIANTE EL RESIDENTE DE OBRA, REALIZAR EL RIEGO PERMANENTE DE DICHA VIA Y EVIDENCIARLA, PARA QUE REALIC...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 272 · Órdenes · SOEC_SPV · 19/08/2026

...ion de la partida tendra que seguir los procedimientos que se enmarca en el reglamento de la ley de contracciones del estado. en la presente fecha se ha recorrido la obra y se ha podido verificar, la falta de personal que el contratista debe implementar, en los frentes de trabajo, hay frentes libres y partidas autorizadas, que el contratista debe intervenir de manera inmediata y no incurrir en retrasos, si bien ha...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 272 · Órdenes · SOEC_SPV · 19/08/2026

ACCIONES PAR FRENTES DE TRABAJO Y ENSAYOS DE CALIDAD EN ARENA: RESPECTO AL ASIENTO 270 DEL RESIDENTE, SE LE ORDENA REALIZAR LA PARTIDA DE REUBICACION DE POSTES CONFORME LO INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO, DE ENCONTRAR ALGUNA OBSERVACION EN SU EJECUCION COMO LA QUE DESCRIBE EL RESDIENTE EN EL ASIENTO 270, PODRA EVALUAR LA CIRCUNSTANCIA Y PLANTEAR SUS OPCIONES A ESTA SUPERVISION PARA SER TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD, TODA PO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 272 · Órdenes · SOEC_SPV · 19/08/2026

...la falta de personal que el contratista debe implementar, en los frentes de trabajo, hay frentes libres y partidas autorizadas, que el contratista debe intervenir de manera inmediata y no incurrir en retrasos, si bien hay un adicional en elaboracion, se tiene ya dos adicionales aprobados de los cuales se hace necesaria la implementacion de mayor personal calificado, para que dean continuidad a las parti...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 258 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

INDICACIONES: EN RELACION AL ASIENTO N.º 253 DE FECHA 07/08/2026, DEL RESIDENTE DE OBRA REFERENTE A INCREMENTAR LA ALTURA DE OVER EN LAS PROGRESIVAS 4+690 A 4+750 SE HA VERIFICADO QUE EL NIVEL DE AGUA CORRE RIESGO DE INCREMENTAR POR EL CRECIMIENTO DEL DRENAJE Y RIEGO CONSTANTE DE LAS PARCELAS ALEDAÑAS POR LO QUE LA PROPUESTA DEL RESIDENTE DE OBRA ES VIABLE YA QUE FAVORECERA LA CIRCULACION DEL AGUA EN CONTRASTE SI SE M...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 259 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

...ento emitido, a fin de determinar las acciones tecnicas y contractuales que correspondan.respecto a la indicacion efectuada por la supervision sobre la programacion de obra y el riesgo de incurrir en retraso injustificado, se deja constancia que recientemente ha sido aprobada la prestacion adicional de obra n. 02, cuya ejecucion se encuentra vinculada a sectores que condicionan la continuidad de activid...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 258 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...as con material elastomerico y realizar la limpieza del area intervenida.asi mismo se indica al residente de obra revisar la programacion de obra y organizar frentes de trabajo para que no incurra en retraso injustificado, ya que en la presente fecha se debe terminar con la partida de conformacion y compactacion de subrasante con maquinaria.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 246 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026 ...vances de obra se ven mermados por el desabastecimiento de personal en frentes liberados para los trabajos, tomar en consideracion la programacion de obra y retomar el ritmo de inicio para no caer en retrasos injustificados.respecto al asiento precedente del residente de obra, el suscrito comunicara a la entidad lo acontecido para que se tomen las medidas necesarias y las acciones a tomar sean comunicad... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 239 · Órdenes · SOEC_SPV · 30/07/2026 ORDENES Y COMUNICACION SOBRE CONSULTA LIQUIDO MC - 30: EN LA PRESENTE FECHA SE HA REALIZADO EL RECORRIDO EN LOS TRAMOS DE OBRA Y SE HA PODIDO VERIFICAR, LAS ACTIVIDADES QUE VIENE REALIZANDO EL CONTRATISTA ENCONTRANDOSE EN EL TRAMO I ALGUNAS DEFICIENCIAS QUE DEBEN SER CORREGIDAS CUANTO ANTES COMO LA COORDINACION DEL ENCARGADO DEL TRAMO I CON LA RESIDENCIA DE OBRA, SOBRE LOS ALCANCES DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA A... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 237 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/07/2026 SOBRE CONSULTAS: EN LA PRESENTE FECHA SE REALIZA EL REGISTRO SIGUIENTE:EN RELACION A LA CONSULTA DEL RESIDENTE DE OBRA REGISTRADA EN LA FECHA 25/07/2026, RESPECTO A LA PENETRACION DEL LIQUIDO IMPRIMANTE EN LA QUE EL RESIDENTE DE OBRA EN SU ULTIMA PARTE INDICA QUE SE ADJUNTARA EL INFORME PARA REVISION Y EVALUACION DE LA SUPERVISION, SE HA PODIDO NOTAR QUE EN EL ASIENTO NO ADJUNTO NINGUN INFORME QUE EVALUAR Y REVISAR ... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 235 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/07/2026 ACTIVIDADES Y OCURRENCIAS: EN LA PRESENTE FECHA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:EL ESPECIALISTA DE CALIDAD DE LA SUPERVISION PRESENCIO LA ROTURA DE PROBETA DEL MURO DE ALCANTARILLA F'C = 210 Kg/Cm2, UBICADA EN AREA DEL ADICIONAL N° 01, CUYA RESISTENCIA OBTENIDA A LOS 8 DIAS ES DE 141 Kg/Cm2. RESULTADO QUE ESTA DENTRO DEL RANGO DE ACEPTACION.ASI MISMO SE VERIFICO ROTURA DE PROBETA DE TECHO DE ALCANTARILLA 280... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 216 · Órdenes · SOEC_SPV · 15/07/2026 AUTORIZACIONES Y ORDENES: EN LA PRESENTE FECHA, LA SUPERVISION ESTA REALIZANDO LA EVALUACION Y REVISION DEL SUSTENTO TECNICO DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA RESPECTO AL DESCALCE UBICADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+350 AL 0+930, PARA QUE DENTRO DE SU PLAZO NORMATIVO ELEVE A LA ENTIDAD EL INFORME TECNICO CORRESPÓNDIENTE.CON RELACION AL SIENTO N° 212 DEL RESIDENTE DE OBR... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
