


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio público de integración economicay social en el cc.pp. De huancano del distrito de huancano - provincia de pisco - departamento de ica con CUI N°2499047

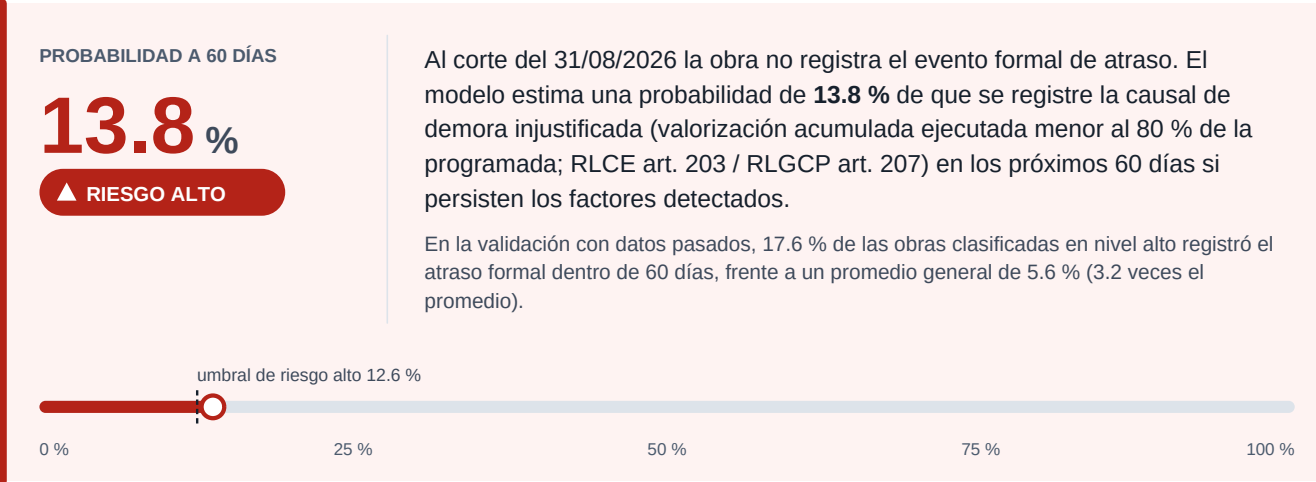


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	68 desde 29/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE INTEGRACIÓN ECONOMICAY SOCIAL EN EL CC.PP. DE HUANCANO DEL DISTRITO DE HUANCANO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI N°2499047
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
Contratista	CONSORCIO PARQUE DE HUAMANI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUANCANO / PISCO / ICA
Código Único de Inversión (CUI)	2499047
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE INTEGRACIÓN ECONOMICAY SOCIAL EN EL CC.PP. DE HUANCANO DEL DISTRITO DE HUANCANO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2393016
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 756,993.00
Cuaderno de obra digital	68 asientos entre 29/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

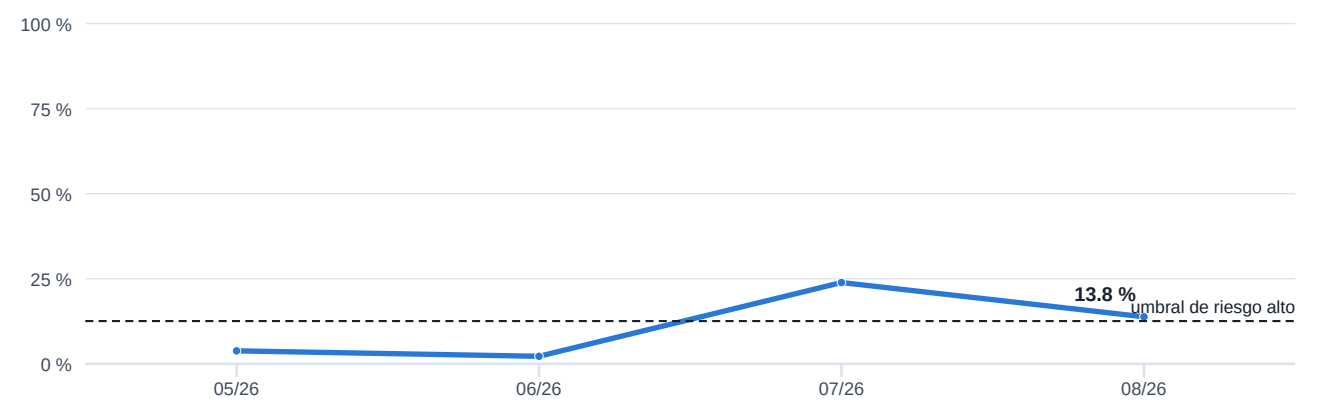

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.592
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.193
Departamento: Ica	Características de la obra		-0.162
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.136
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.134
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
2 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.079
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.059

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	13.8 %	12.7 %	-1.1 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.8 %	13.8 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	13.8 %	13.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 45 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 04/08/2026

...ntar formalmente dicha documentacion pese a los pedidos reiterativos verbales que se le efectuan. en consecuencia la contratista no cumple con la formalidad de la documentacion exigida por lo que los retrasos de obra son injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 45 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 04/08/2026

VERIFICACION DE TRABAJOS Y ACLARACION A LO SEÑALADO EN EL ASIENTO 44 DEL RESIDENTE.: Se prosiguen con los trabajos de movimiento de tierras en las zonas 1 y 3 de acuerdo al expediente tecnico, respecto a lo señalado por el residente de obra, respecto a la CARTA N°007-2026-CVH/RC/CED, la supervision esta a la espera que la Entidad autorice la reduccion de la prestacion (no ejecutar parte del muro de contencion) o dis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...idad.se deja constancia, que al igual a como se ha estado anotando en varios asientos precedentes, la situacion de interferencia y no disponibilidad total del terreno para el proyecto, esta generando retrasos en la culminacion de la partida de demolicion, y por ende en la construccion de las estructuras prtoyectadas. su ubicacion fue senalada en el informe de interferencias comunicadas con carta n 007-2...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 40 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 31/07/2026

RESPUESTA A CONSULTA 04: Respecto a la consulta n.º 04 por parte de la contratista a través de la carta n.º 016-2026-CHV/RC/CEDT de fecha de recepción 30 de julio de 2026 a horas 6:32pm, se debe de señalar que el informe contiene laminas topográficas ilegibles impresas en formato A4, por lo que su análisis es imposible, es en tal sentido que la contratista deberá de remitir dicha consulta y/o solicitud conteniendo el...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 38 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 31/07/2026

...campo . respecto a lo senalado por las interferencias que senala el residente de obra, sirvase indicar identificar la ubicacion especifica, tipo de interferencia, duracion y que actividad se trunca o retrasa, asimismo se insta a realizar los trabajos de movimiento de tierras respetando que las lineas de agua y desague no sufran deterioro y genera interrupcion del servicio a los beneficiarios, este senal...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/07/2026

...arretera los libertadores, los que estan impidiendo la conclusion de los trabajos de demolicion, y por ende estan afectando la programacion vigente, sobre todo la ruta critica y por tanto causando el retraso de los trabajos y partidas subsiguientes.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 26 · Aplicación de penalidades · SOEC_RESI · 21/07/2026

TRABAJOS DEL DÍA: EN LA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LA CHARLA DE SEGURIDAD A CARGO DEL ESPECIALISTA SSOMA.PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR 3. ASIMISMO SE EFECTUA EL CORTE PARA SUBRASANTE DE VEREDAS EN EL MISMO SECTOR. SE ESTÁN RETIRANDO LOS ÁRBOLES DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.EN RELACIÓN A LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE, COMO SE SEÑALÓ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 25 · Aplicación de penalidades · SOEC_RESI · 21/07/2026

TRABAJOS DEL DÍA: EN LA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LA CHARLA DE SEGURIDAD A CARGO DEL ESPECIALISTA SSOMA.PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR 3. ASIMISMO SE EFECTUA EL CORTE PARA SUBRASANTE DE VEREDAS EN EL MISMO SECTOR. SE ESTÁN RETIRANDO LOS ÁRBOLES DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.EN RELACIÓN A LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE, COMO SE SEÑALÓ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/07/2026**

...e senalar que debido a un error en el sistema del ci, el asiento n 25 ha sido duplicado y se repite como asiento n 26. asimismo el titulo que le corresponde es "trabajos del día", y no "aplicacion de penalidades" como ha quedado registrado.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 12 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 08/07/2026**

PARTIDA DE DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO: Se ha constatado que prosiguen con los trabajos de demolición en el sector 3 colindante con la carretera los libertadores, al respecto se insta a la contratista implemente una red perimetral y vigías en el proceso de carguío y eliminación de material desmonte producto de la demolición, asimismo se insta a la contratista a realizar una visita conjunta al botadero autoriz...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
