


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la URB. El ingeniero i del distrito de chiclayo - provincia de chiclayo - departamento de lambayeque CUI 2561992

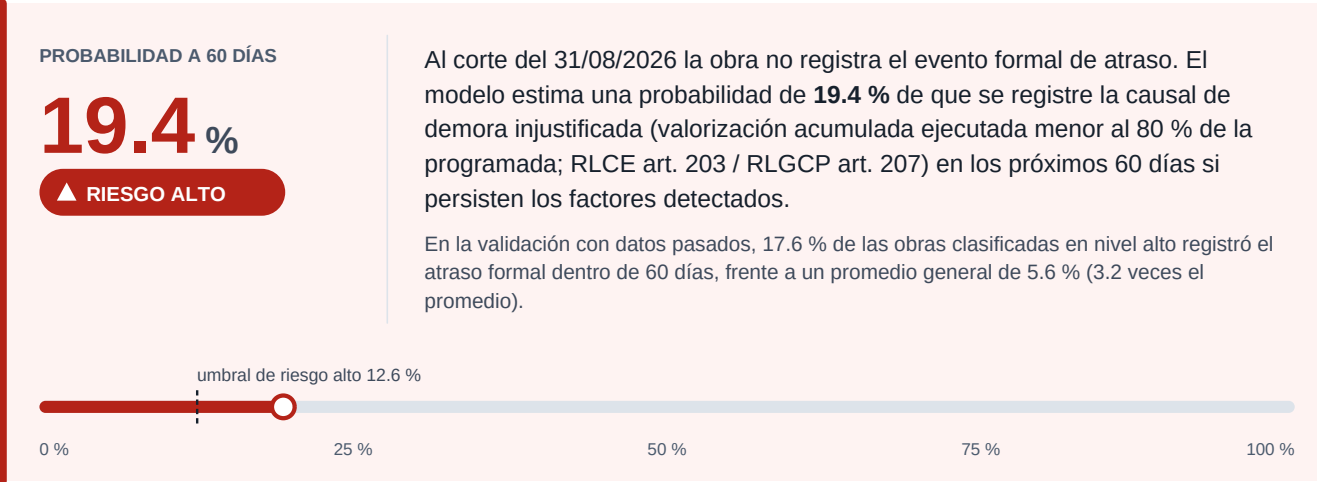


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	64 desde 16/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. EL INGENIERO I DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2561992
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Central
Contratista	CONSORCIO DOBLE AA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2561992
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. EL INGENIERO I DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2400584
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,478,870.07
Cuaderno de obra digital	64 asientos entre 16/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

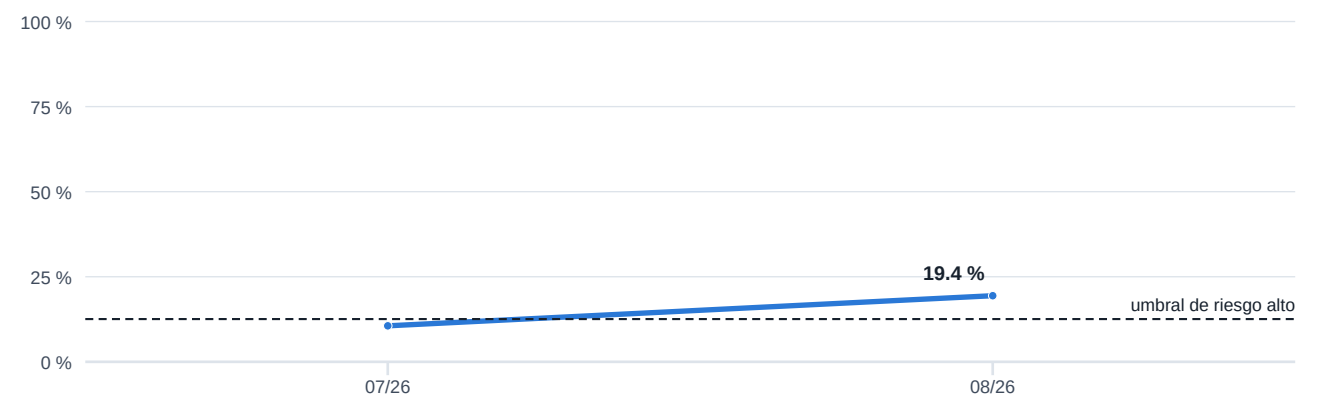

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.516
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.246
El 67 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.243
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		-0.136
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.71 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.105
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.095
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.095
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.083

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	19.4 %	19.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 57 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N°55 DEL RESIDENTE DE FECHA 26-08-2026: En consideración al Asiento N° 55 del Residente de Obra, en el cual indica: "EN EL PLANO REPLANTEADO APROBADO SE DETALLA LA UBICACIÓN DE RAMPAS UBICADAS EN LOS INGRESOS DE LAS VIVIENDAS LOS CUALES NO HAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PLANTEAMIENTO DE DEMOLICIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO ES INDISPENSABLE LA DEMOLICIÓN DE ESTAS DEBIDO QUE INTERFIEREN EN E...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Órdenes · SOEC_SPV · 18/08/2026

...ranulometrica esta esta por fuera de los valores permitidos concluyendose que es un material que tiene mucho porcentaje de finos en valores superiores a los permitidos, por lo que esta supervision lo rechaza para ser utilizada en este proyecto y se recomienda analizar el afirmado de la cantera planteada en el plano puc-01 (tres tomas ferrenafe). el estudio del afirmado debe tener todo lo indicado en las...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 40 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 14/08/2026

... muestra de afirmado para ser ensayada en laboratorio analisis granulometrico y proctor modificado con los resultados de laboratorio esta supervision emitira su pronunciamiento ya sea autorizando y/o rechazando el uso de dicho afirmado .

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

SE SOLICITA ENSAYOS DE AFIRMADO A UTILIZAR: Hoy se da inicio a los trabajos de compactado de sub-rasante con rodillo liso de 12T, se continua con trabajos de perfilado de sub-rasante. Se continua con trabajos de excavación, demolición de veredas, rampas y sardineles y trabajos de eliminación de material proveniente de excavaciones. Se comunica a la residencia de obra que el over a utilizar según expediente técnico es ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

...on oficio n005559-2026-gr.lamb/grin-dsl[516384764-22], el día de hoy 4 de agosto del 2026 via correo la entidad nos devuelve el cronograma de participacion del personal clave y no clave para subsanar observaciones. hoy se da inicio con la partida de perfilado de corte con utilizacion de motoniveladora, se continua con trabajos de corte y demolicion de veredas y eliminacion de material excedente con equipo pes...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026

SOLICITO METRADOS SEGUN PLANOS DE REPLANTEO: Se deja constancia de trabajos en demolición de sardineles, demolición de veredas, corte de terreno hasta sub rasante y eliminación de material excedente, se recomienda al residente de obra que implemente un personal de paletero afin de poder guiar a los volquetes al momento de salir de la urbanización ingenieros I y evitar algún posible accidente de tránsito. Se solicita ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
