


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: ¿mejoramiento del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de acopalca distrito de huancayo, provincia huancayo, departamento junín¿ con CUI N° 2609258.

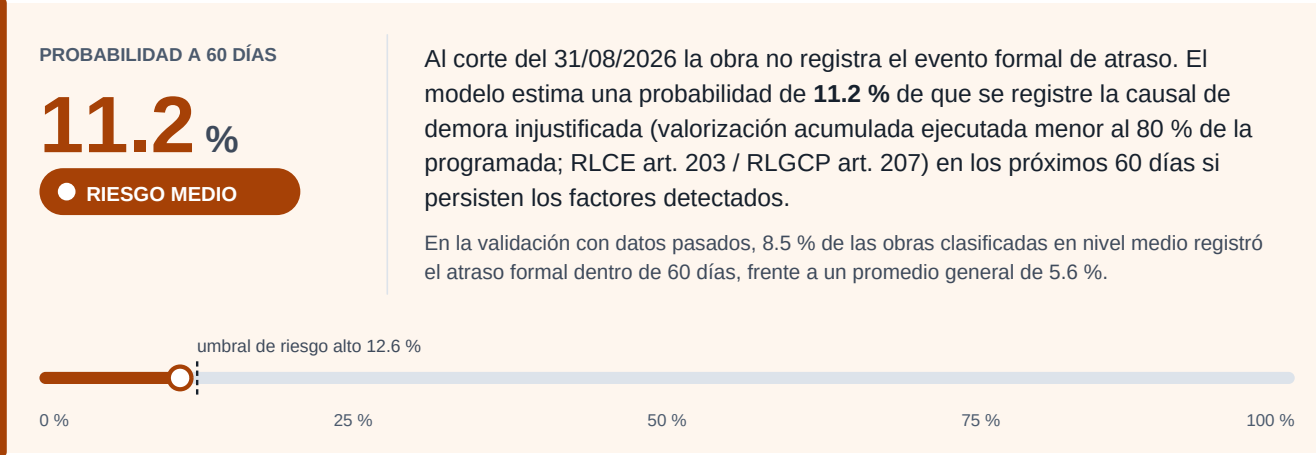


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	61 desde 22/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN¿ CON CUI N° 2609258.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO G&M
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUANCAYO / HUANCAYO / JUNIN
Código Único de Inversión (CUI)	2609258
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2409790
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,880,836.63
Cuaderno de obra digital	61 asientos entre 22/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

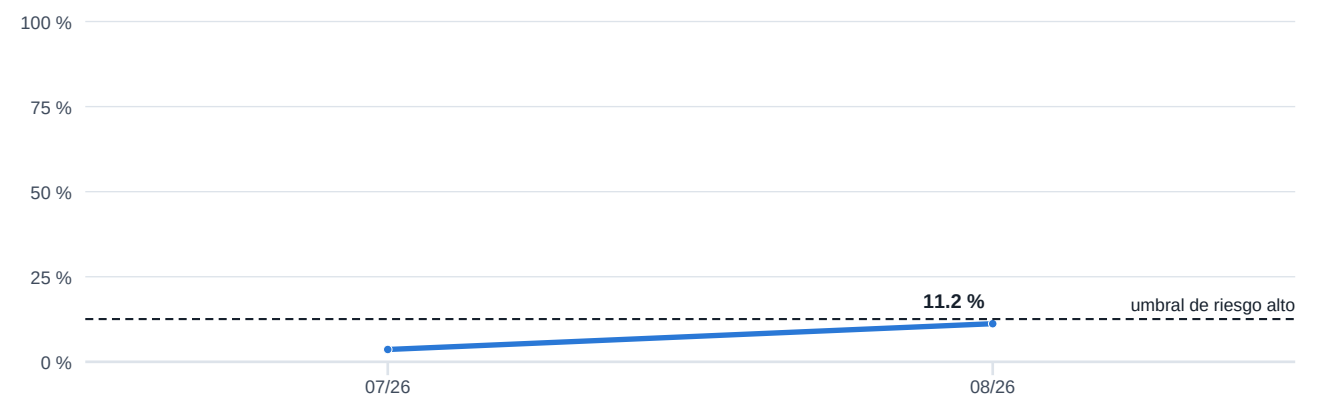

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.571
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.134
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.109
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.090
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.089
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 0	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.076
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.074
Departamento: Junín	Características de la obra		-0.055

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 52 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

ACTIVIDADES EN LA OBRA: Se realizaron excavaciones de redes de alcantarillado, perfilado y entubado. Se coordinó con los dirigentes de la población para realizar las charlas de los Especialistas. Se reitera al Especialista de Calidad me alcance los resultados de las pruebas de rotura de los primeros buzones conjuntamente con el diseño de mezcla. En la visita al Almacén de la obra se ha encontrado tubería para la red de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026 <i>...el concreto de los buzones.se exhorta que tengan mas responsabilidad en el manejo de los materiales en almacen.se exhorta que cumplan con los materiales que se necesitan para la obra ya que estan muy retrasados en el cronograma de avance.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 40 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026 <i>...e la obra, al especialista de calidad, al especialista ambiental y al especialista de seguridad para el día de mañana, sobre sus actividades durante el proceso constructivo de la obra. y el avance de retraso que se esta visualizando..</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026 <i>ACELERAR TODOS LOS FRENTE DE TRABAJO: Se verifica que el contratista viene desarrollando sus actividades a un ritmo lento.Sin acatar la mayoría de frentes de trabajo disponibles.Observándose que la captación no se esta ejecutando. Las redes tanto agua ni desagüe no se están tocando.Corresponde al contratista adoptar las acciones necesarias como aumento de personal en obra ya que se evidencia mas frentes por ejecutar...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 29 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 10/08/2026 <i>TRAZO Y REPLANTEO: Se continúan con los trabajos de excavación y curado de concreto. Se continúan con las coordinaciones con el CONSORCIO CGGC para intervenir en la vía que está a su cargoEl rendimiento del avance de la Obra está disminuyendo y las metas a cumplir este mes corre el riesgo de no alcanzar lo programado, se exige al CONSORCIO G&M aumentar cuadrilla para empezar los trabajos en la captación que no existe...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
SIAF · 01/07/2026 <i>Devengado 2026-07: S/ 0.00</i>

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
