


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de obra: MEJORAMIENT50 y apliacion del servicios deportivo de competencia en el coliseo municipal"carlota elias zuñe de aña" del distrito de ferreñafe de la provincia del departamento de lambayeque CUI 2639054

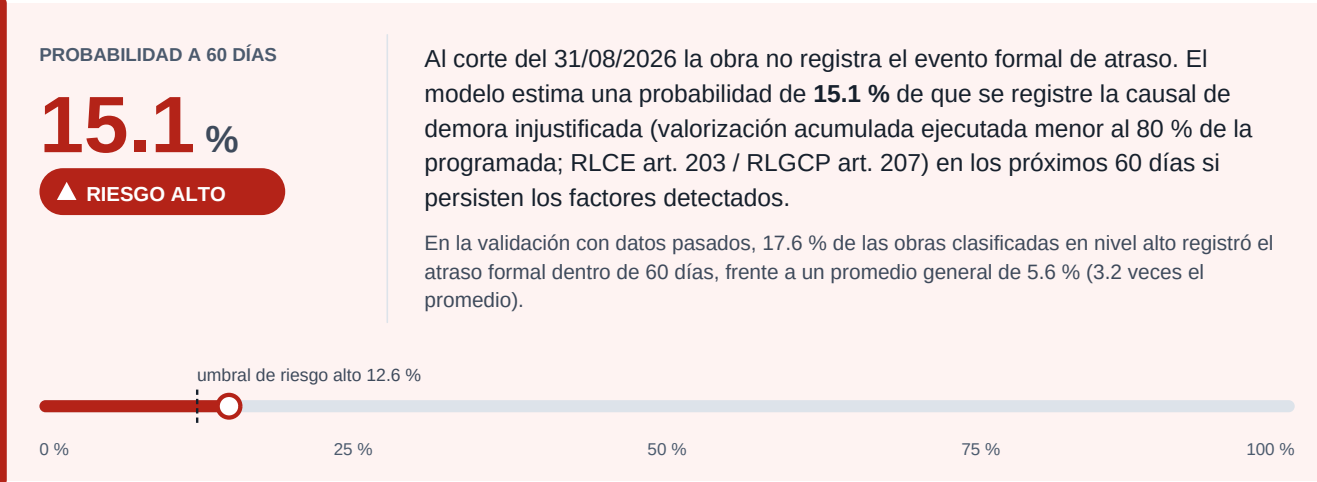


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 6,416,337.37	210 días	155 desde 27/01/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENT50 Y APLIACION DEL SERVICIOS DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL COLISEO MUNICIPAL"CARLOTA ELIAS ZUÑE DE AÑA" DEL DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2639054
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Contratista	CORPORACION ALJAR SAC
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	FERREÑAFE / FERREÑAFE / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2639054
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL COLISEO MUNICIPAL CARLOTA ELIAS ZUÑE DE AÑA DEL DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2372773
Monto del contrato	S/ 6,416,337.37
Monto aprobado de la inversión	S/ 6,410,139.16
Cuaderno de obra digital	155 asientos entre 27/01/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

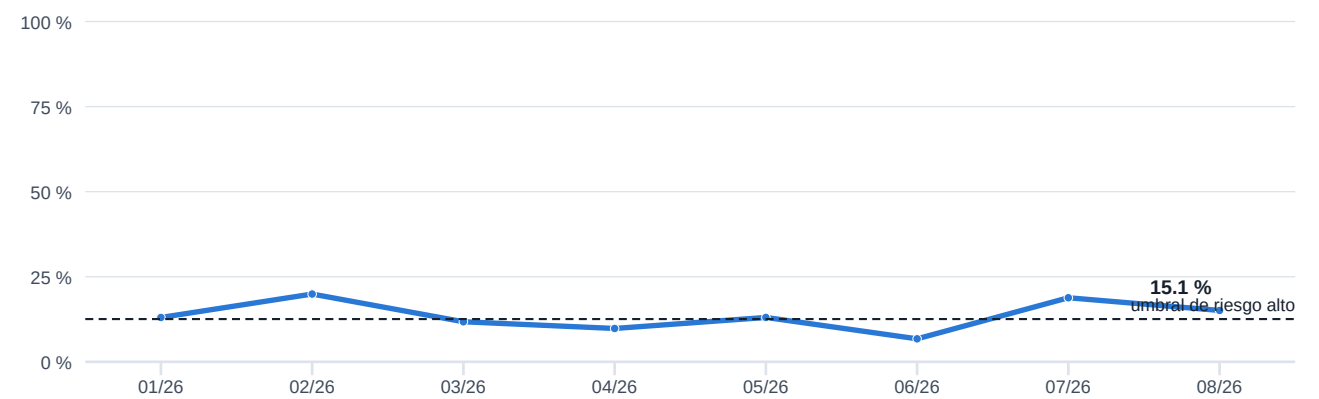

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.575
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.193
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.176
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.091
14 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.085
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.067
El 35 % de los asientos de los últimos 60 días menciona deficiencias del expediente técnico	Contenido de los asientos		+0.067
El 26 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		-0.062

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.1 %	15.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 143 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 13/08/2026

...ectricas del proyecto.se solicita la celeridad para el tramite y aprobacion de los adicionales y deductivos de obra mencionados a fin de no seguir dilatando el tiempo de ejecucion.a la fecha existe un retraso justificado en el avance del proyecto debido a que existen partidas que no se pueden ejecutar por estar vinculadas a los adicionales en tramite.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 139 · Adicionales · SOEC_SPV · 08/08/2026

ASIEN TO N° 139 DEL SUPERVISOR DE OBRA: RATIFICACIÓN DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 04SE DEJA CONSTANCIA QUE CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2026 LA ENTIDAD NOTIFICÓ AL CONTRATISTA, MEDIANTE CARTA N° 019-2026-ING.JDBR/MPF/INSPECTOR LA ABSOLUCION DE CONSULTAS DE OBRA POR PARTE DE ESPECIALISTAS Y DISPOSICIÓN PARA EVALUACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES, ADJUNTADO EL INFORME N° 001/EELMAD/MPF2026 SUSCRITO POR EL ESPECIALI...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 134 · Adicionales · SOEC_RESI · 05/08/2026

NECESIDAD DE PRESTACIONES ADICIONALES POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERIDAS A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA DEL COLISEO: EL DÍA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AL HABER LA ENTIDAD REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR EL CONTRATISTA, LA RESIDENCIA ANOTA EN EL CUADERNO DE OBRA, LA NECESIDAD DE REALIZAR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS RESPECTIVAMENTE DEBIDO A QUE NO HUBO RESPUESTA DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 130 · Consultas · SOEC_SPV · 04/08/2026

ASIEN TO N° 130 DEL SUPERVISOR DE OBRA: EN RELACIÓN CON EL ASIEN TO N° 127 DE FECHA 31/07/2026, MEDIANTE EL CUAL EL RESIDENTE DE OBRA HACE CONSULTAS REFERENTES A INCONGRUENCIAS Y FALTA DE INFORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA DEBO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:CON RESPECTO AL INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA Y SU ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE 22 PLANOS DE ARQUITECTURA (PUNTO V. ITEM A: DE LOS ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 129 · Adicionales · SOEC_SPV · 03/08/2026

ASIEN TO N° 129 DEL SUPERVISOR DE OBRA: RATIFICACIÓN DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 03SE DEJA CONSTANCIA QUE CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2026 LA ENTIDAD NOTIFICÓ AL CONTRATISTA, MEDIANTE CARTA N° 019-2026-ING.JDBR/MPF/INSPECTOR LA ABSOLUCION DE CONSULTAS DE OBRA POR PARTE DE ESPECIALISTAS Y DISPOSICIÓN PARA EVALUACIÓN DEMODIFICACIONES CONTRACTUALES, ADJUNTADO EL INFORME N° 001-2026/ING. N.M.L. – EIE. SUSCRITO POR EL ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 128 · Adicionales · SOEC_RESI · 01/08/2026

NECESIDAD DE ADICIONAL DE OBRA POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: EL DÍA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AL HABER LA ENTIDAD REALIZADO EL LEVANTAMIENTOVDE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR EL CONTRATISTA, LA RESIDENCIA ANOTA EN EL CUADERNO DE OBRA, LA NECESIDAD DE REALIZAR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS RESPECTIVAMENTE DEBIDO A QUE NO HUBO RESPUESTA DE RATIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR E...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 127 · Consultas · SOEC_RESI · 31/07/2026

CONSULTAS REFERENTES A INCONGRUENCIAS Y FALTA DE INFORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA: A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE OBRA, ADJUNTO AL PRESENTE ASIEN TO SE ADJUNTA LA EL INFORME TÉCNICO ACTUALIZADO CORRESPONDIENTE A LAS CONSULTAS REALIZADAS, RESPECTO DE LAS INCONGRUENCIAS Y DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, REFERIDAS A LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA,DICHO INFORME HA SIDO PRESENTADO EL DÍA DE...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 127 · Consultas · SOEC_RESI · 31/07/2026

...cto rean remitidas a la entidad a fin de ser absueltas por el proyectista o por la entidad misma.estas incongruencias deben ser absueltas para poder realizar los trabajos con toda normalidad y evitar retrasos y consultas fuera de tiempo.en tal sentido y en atencion al articulo n 190 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y sus numerales 190.1 y 190.2 se realiza la anotacion correspondient...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 122 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 29/07/2026

ASIENTO N° 122 DEL SUPERVISOR DE OBRA: PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO AL REITERADO DE CONSULTAS EN ARQUITECTURAEN RELACIÓN CON EL ASIENTO N° 119 DE FECHA 27/07/2026, MEDIANTE EL CUAL EL RESIDENTE DE OBRA REITERA LAS CONSULTAS SOBRE PRESUNTAS DEFICIENCIAS E INCONGRUENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA ORIGINALMENTE PLANTEADAS EN EL ASIENTO N° 44 DE FECHA 11/03/2026, ESTA SUPERVISIÓN QUE ASUMIÓ FUNCION...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
