


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra mejoramiento del servicio de agua potable urbano y mejoramiento del servicio de alcantarillado en el AA. HH. San judas tadeo, AA. Hh lucy villanueva y AA. Hh barrio especialista ¿ cono norte distrito de pariñas de la provincia de talara del departamento de piura

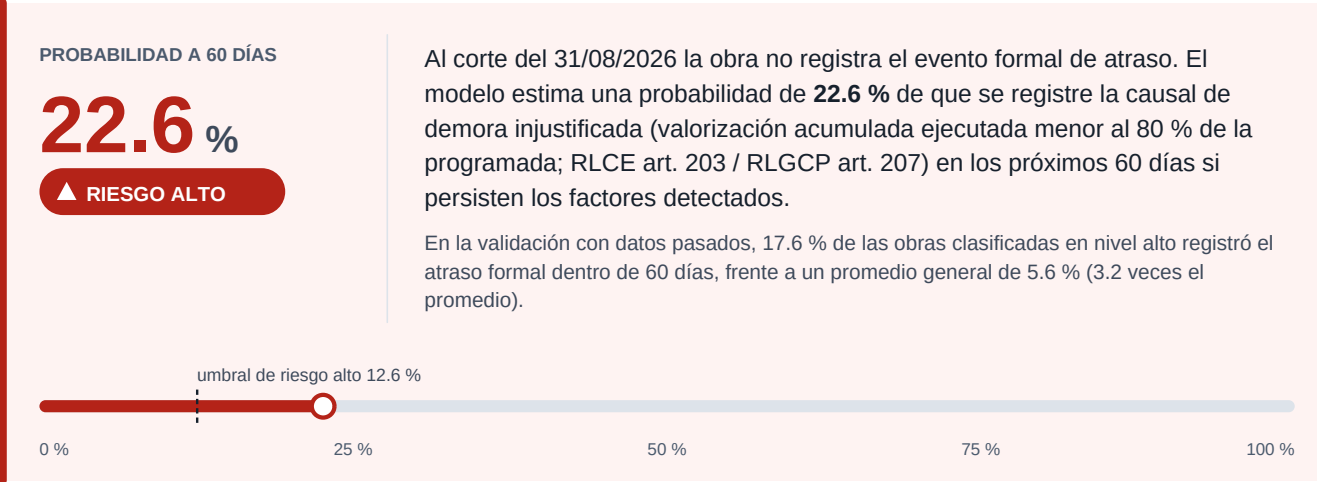


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 7,659,666.36    | 180 días       | 252<br>desde 11/04/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. SAN JUDAS TADEO, AA. HH LUCY VILLANUEVA Y AA. HH BARRIO ESPECIALISTA ¿ CONO NORTE DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contratista                                     | COSAT INDUSTRIAL S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | PARIÑAS / TALARA / PIURA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2628577                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. SAN JUDAS TADEO, AA. HH LUCY VILLANUEVA Y AA.HH BARRIO ESPECIALISTA ¿ CONO NORTE DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA                       |
| Función                                         | SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2317045                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monto del contrato                              | S/ 7,659,666.36                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 5,283,534.30                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cuaderno de obra digital                        | 252 asientos entre 11/04/2025 y 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

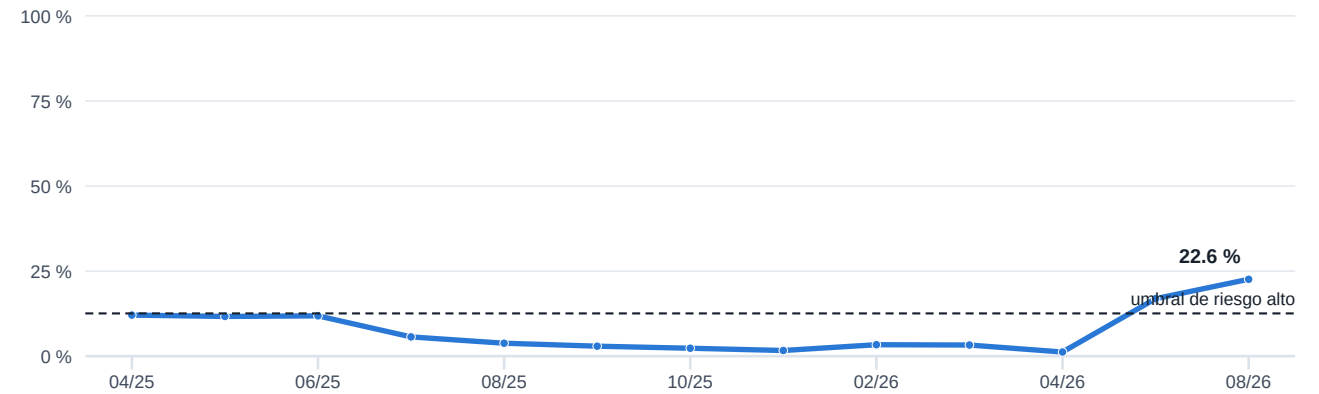

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 30/04/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.703 |
| El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.228 |
| El 62 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.195 |
| El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal                       | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.173 |
| El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.154 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.117 |
| 3 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.099 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)                     | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.097 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                                | Actual | Escenario | Cambio  |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes                  | 22.6 % | 22.6 %    | -0.0 pp |
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días  | 22.6 % | 22.6 %    | +0.0 pp |
| Ejecución financiera al día (devengado en el último mes) | 22.6 % | 22.6 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 248 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 27/08/2026

ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA: - REVISION Y APROBACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASIMISMO DE LOS SEGUROS SCTRY EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.- SE INDICA AL CONTRATISTA QUE ACELERE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN A RITMO LENTO, INCREMENTANDO MAS PARTES DEL TRABAJO Y CUADRILLA DE PERSONAL.- ESTA SUPERVISION HACE DE CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA QUE MEDIANTE CARTA N° 28-08-2026/CV...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 248 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 27/08/2026

...mas partes del trabajo y cuadrilla de personal.- esta supervision hace de conocimiento al contratista que mediante carta no 28-08-2026/cvcp alcanzo informe de revision y evaluacion de la solicitud de retraso justificado n. 01.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 247 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 25/08/2026

... fisicamente esta interferencia.bajo el principio de defensa activa, se solicita la inmediata constatacion en campo por parte de la supervision. se deja expresa reserva de derechos indicando que esta demora, generada por interferencias no mapeadas y causas ajenas al contratista, afectara nuestra ruta critica y constituira causal de ampliacion de plazo y el consecuente reconocimiento de mayores gastos ge...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 236 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 17/08/2026

OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES: - Se solicita al Contratista verificar sus rendimientos diarios, para el cumplimiento de los plazos previstos, de lo contrario incrementar cuadrillas y/o laborar doble turno para el cumplimiento de los plazos presentados y termino de obra.- Se le solicita al Contratista presentar el Adicional Deductivo Vinculante N° 01 habiendo ratificado la Supervisión según corresponde al procedimiento...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 231 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 14/08/2026

cambio de jefe de supervision . se deja constancia que el día 13 del presente se notifico mediante resolucion gerencial n60-08-2026-gdt-mpt, declara procedente el cambio de personal clave con el cargo de jefe de supervisor de obra. asimismo, dejo constancia que estando habilitado para ejercer dichas funciones. esta supervision verifico insitu que los trabajos que viene realizan...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 215 · Constatación física de la obra · SOEC\_SPV · 26/07/2026

...on fecha 22 de junio se le notifico los permisos para intervenir esa via. de no ejecutar y de culminar el plazo contractual es responsabilidad unica de la contratista y se procedera a cuantificar las penalidades correspondientes

Fuente: cod-asientos202607.csv

### Asiento N.º 212 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 24/07/2026

presentacion de documentos . el día de hoy la supervision entregado la solicitud de ampliacion de plazo por retraso justificado y/o ampliacion de plazo con carta n 17 -07-2026 y la carta n 18-07-2026 , en donde se presenta los cronogramas actualizados a la fecha de termino de obra

Fuente: cod-asientos202607.csv

### Asiento N.º 213 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 24/07/2026

presentacion de documentos . el día de hoy la supervision entregado la solicitud de ampliacion de plazo por retraso justificado y/o ampliacion de plazo con carta n 17 -07-2026 y la carta n 18-07-2026 , en donde se presenta los cronogramas actualizados a la fecha de termino de obra

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 209 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 22/07/2026**

*...ado las cajas de agua y desagüe, eliminación de desmonte, mitigación de impacto ambiental como es el regado con agua mediante cisterna, se le recomienda al contratista incrementar personal para evitar penalidades, se espera que la contratista la intervención de la panamericana para cambiar el alcantarillado programado. se cuenta con la visita de la eps grau.*

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 208 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 20/07/2026**

*...ado las cajas de agua y desagüe, eliminación de desmonte, mitigación de impacto ambiental como es el regado con agua mediante cisterna, se le recomienda al contratista incrementar personal para evitar penalidades, se espera a la contratista la intervención de la panamericana para cambiar el alcantarillado programado*

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
