


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para ejecucion de obra: ¿mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de los asentamientos humanos dos de mayo y juan noel lastra, parte alta de la ciudad de paita, distrito de paita-provincia de paita ¿departamento de piura¿-cui N°2545324.

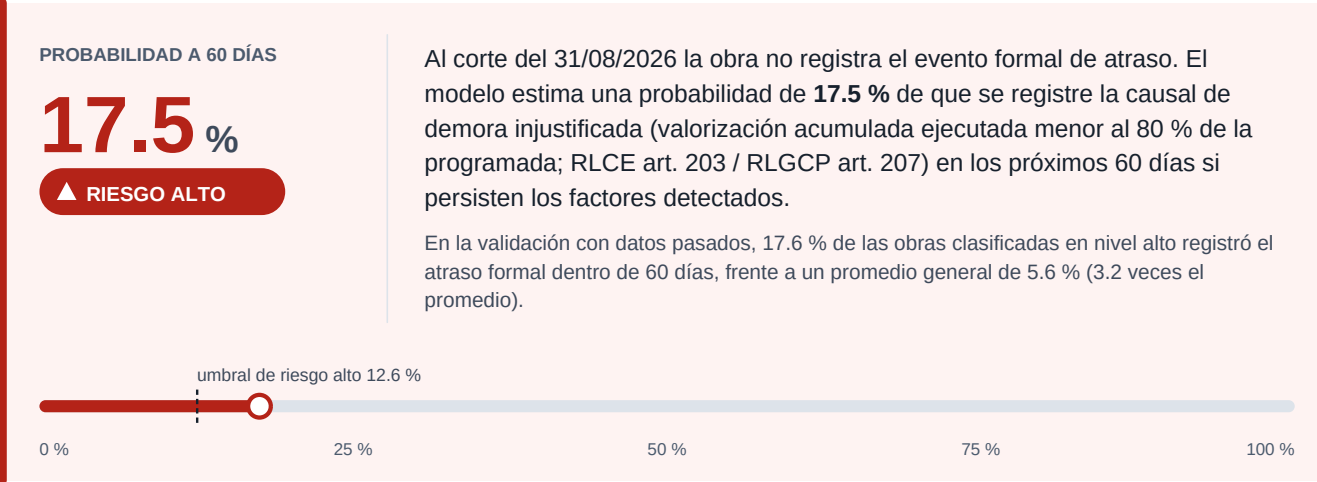


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 29,327,044.38	240 días	237 desde 20/02/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DOS DE MAYO Y JUAN NOEL LASTRA, PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA-PROVINCIA DE PAITA ¿DEPARTAMENTO DE PIURA¿-CUI N°2545324.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
Contratista	CONSORCIO WAYKA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PAITA / PAITA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2545324
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DOS DE MAYO Y JUAN NOEL LASTRA, PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2377344
Monto del contrato	S/ 29,327,044.38
Monto aprobado de la inversión	S/ 22,163,294.76
Cuaderno de obra digital	237 asientos entre 20/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

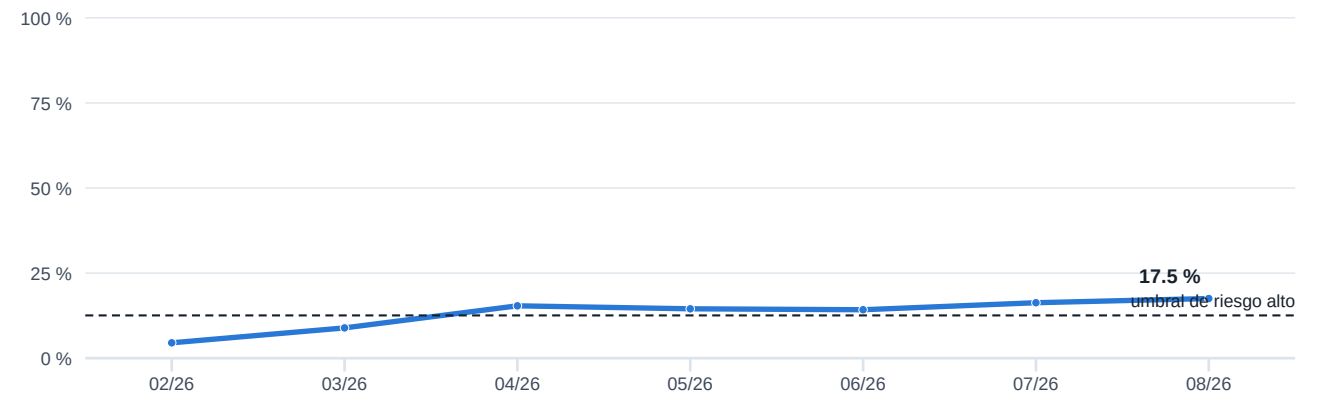

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.711
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.238
Faltan 48 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.178
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.144
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 3,775,475	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.130
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Hubo registros en el cuaderno 18 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.071

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	17.5 %	18.1 %	+0.6 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 215 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...n de consultas presenta ambigüedad, por ello estamos a la espera de la opinion tecnica por parte de la municipalidad provincial de paíta, cabe mencionar que la ruta critica se encuentra afectada y la demora en la aclaracion generara ampliacion de plazo de acuerdo al articulo 198 del reglamento de la ley general de contrataciones publicas.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 210 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/08/2026

...jos del drenaje pluvial, como movimientode tierras, conformacion del dren, colocacion de piedra en el dren existente. estamos a la espera que la entidad nos indique cual es la absolucion, debido a la demora no podemos ejecutar los trabajos en la calle campanillas lado derecho, via de evitamiento, lirios, madre selvas.se tomara en cuenta las recomendaciones de la supervision respecto al poste que tiene p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 205 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/08/2026

...l viene ocasionando la humeda constante del terreno, se ha solicitado a la eps grau que arreglen esa tubera, debido que el empalme estuvo mal ejecutado, se necesita colocar una union dresser de 6, la demora por parte de la eps grau nopermite iniciar con los trabajos de base granular en dicha calle.la contratista realizara el calendario acelerado de acuerdo al articulo 207 del reglamentode la ley general...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 203 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

...monitoreo y control de obras y consultoria de obras207.1. la supervision emplea herramientas para realizar el monitoreo y control conforme al literal i) del numeral 187.3 del articulo 187. en caso de retraso injustificado, en los avances parciales, cuando el supervisor verifica que la valorizacion acumulada ejecutada sea menor al 80% de la valorizacion acumulada programada o exista atraso en la ruta cri...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 191 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026

VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: EL DIA DE HOY SE HA VERIFICADO LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO EN LA CALLE LOS LIRIOS y CALLE CAMPANILLAS EN LA CICLO VIA, SIN EMBARGO, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE A COORDINADO CON EL RESIDENTE DE OBRA PARA INDICARLE QUE LAS TUBERIAS DE DRENAJES HAN SIDO CONSIDERADAS POR LA CICLO VIA POR LOQ UE DEBE ANALIZAR QUE ESTA NO DEBE SER VACEADA YA QUE SOLO UN TRAMO ES EL QUE SE ENCUENTRA LIBRE DE LO CON...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 188 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026

VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE HA SOLUCIANO EL PROBLEMA D EPAGO DE LOS TRABAJADORES OBREROS Y SE HA TRABAJADO CON NORMALIDAD, SE HA REALIZADO EL VACEADO EN LA CALLE CAMPANILLAS COMO EN LA CALLE LOS LIRIOS DE PAVIMENTACION, EN LA QUE HAN VACEADO 8 MIXER DE 10 M3 DE CONCRETO.SE HA REALIZADO EL ENCOFRADO EN LA CALLE LO S LIRIOS COMO EN LA CAMPANILLAS EN LA CICLO VIA, SIN EMBARGO, E...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 178 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/07/2026

SITUACION DE OBRA: El cierre de junio, el avance real ejecutado es de 2.92%. Si se comparase contra el avance real programado es de 13.84%, el contratista se encuentra atrasada ya que según los ejecutado acumulado este generaría una diferencia de ejecutado vs programado de un - 5.68%Que de acuerdo al Artículo 207. Monitoreo y control de obras y consultoría de obras207.1. La supervisión emplea herramientas para realiz...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 178 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/07/2026

...e físico acumulado es de 23.21%, la lentitud observada afecta los rendimientos diarios. por tanto, se le exhorta a reforzar el frente de trabajo para evitar una caída en la ruta crítica que derive en penalidades o eventuales intervenciones económicas o resoluciones de contrato.

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 48

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
