

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contrato de ejecucion de obra: "mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vias locales de la localidad de limbani distrito de limbani, provincia sandia departamento de puno"

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

27.1 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **27.1 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	65 desde 10/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD DE LIMBANI DISTRITO DE LIMBANI, PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO"
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
Contratista	CONSORCIO HURES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LIMBANI / SANDIA / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2674469
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA LOCALIDAD DE LIMBANI DISTRITO DE LIMBANI DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2396355
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 6,870,944.75
Cuaderno de obra digital	65 asientos entre 10/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

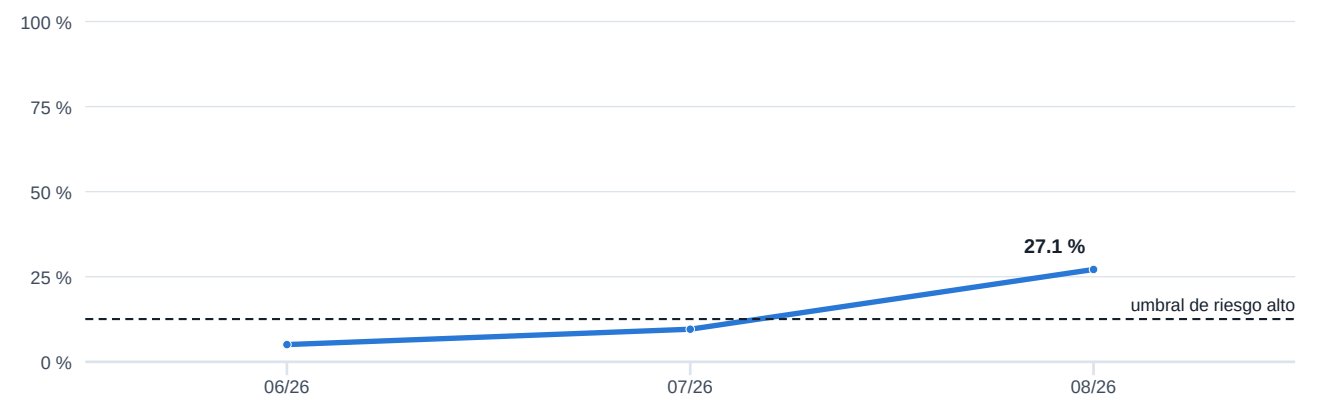

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.700
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.260
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.259
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.152
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.084
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.081
Extensión media de los asientos recientes: 540 caracteres	Contenido de los asientos		+0.070

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	27.1 %	26.7 %	-0.4 pp
Absolver todas las consultas pendientes	27.1 %	27.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 64 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

retraso en ejecucion de obra . se comunica al contratista tomar acciones debido a los retrasos evidenciados en el proceso de ejecucion de la obra, por otra parte, se comunica que hasta la presente no se ha ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 64 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...a elaboracion de la valorizacion de obra n 03, correspondiente al mes de agosto del 2026.se recomienda cumplir con los procedimientos normativos a fin de no incurrir en faltas que generarian posibles penalidades ante su incumplimiento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 62 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 25/08/2026

retrasos en ejecucion e incumplimiento de presentacion de valorizacion . esta supervision advierte al residente de obra tomar acciones a fin de dar celeridad a los trabajos programados ya que se viene obser...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS: De lo indicado en el ASIENTO N° 53, Del Residente de Obra, se ha verificado los trabajos ejecutados en la subrasante, esta supervision REITERA LA PRESENTACION DE PLANOS DE REPLANTEO del Jr. San Martin (prog. 0+000 a la prog. 0+215.62) a la brevedad, considerando que a la fecha se tiene retrasos en la ejecucion de los trabajos programados, queda indicar, que por procedimiento la aprobac...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...s ejecutados en la subrasante, esta supervision reitera la presentacion de planos de replanteo del jr. san martin (prog. 0+000 a la prog. 0+215.62) a la brevedad, considerando que a la fecha se tiene retrasos en la ejecucion de los trabajos programados, queda indicar, que por procedimiento la aprobacion de los trabajos ejecutados estan sujeto a la presentacion de los planos de replanteo para su verifica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 49 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 07/08/2026

cambio de residente de obra por segunda vez . del asiento n 45 del residente de obra, se pone se conocimiento sobre la sustitucion del personal clave, ing. severo ricardo apaza poma (residente de obra saliente) por el i...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 45 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

actividades administrativas . a la fecha se tiene la resolucion de cambio de residente de obra, el suscrito ing. arnaldo mamani apaza con registro cip 70931 asume funciones como residente de obra, por otro lado el dia de hoy se realizo las coordinaciones con la supervision de obra y ar...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 44 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026

...forma conjunta los metrados ejecutados para la presentacion de las valorizaciones, ademas queda a consideracion lo indicado en el contrato de ejecucion de obra n 002-2026-mdl, clausula decima cuarta: penalidades, otras penalidades, numeral 15: pactacion de metrados, (...) formulacion de metrados y la elaboracion de la valorizacion y no suba los metrados pactados al cuaderno de incidencias de obra digital, ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026**

...copio de material para conformacion de sub base en todo el tramo del jr. san martin prog. 0+000 a la prog. 0+215.62, en consideracion a lo indicado en el primer parrafo del presente asiento, se viene incumpliendo los protocolos de controles de procedimientos constructivos, materiales y otros.por lo inicado en los parrafos anteriores, se solicita al residente de obra la presentacion de los planos de repla...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026**

OBSERVACION A PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVOS Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CONTROLES DE CALIDAD: De acuerdo a lo indicado en el ASIENTO N° 26, ASIENTO N° 34, ASIENTO N° 35 y ASIENTO N° 42, del supervisor de obra, se reitera el cumplimiento estricto de los protocolos de control de calidad de materiales, equipos, procedimientos constructivos entre otros, controles que garanticen el cumplimiento de lo indicado en los pla...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
