


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el campo deportivo en la zona a de la asociación de pequeños industriales y vivienda el crucero la estrella distrito de cerro colorado de la provincia de arequipa del departamento de arequipa, CUI 2672519.

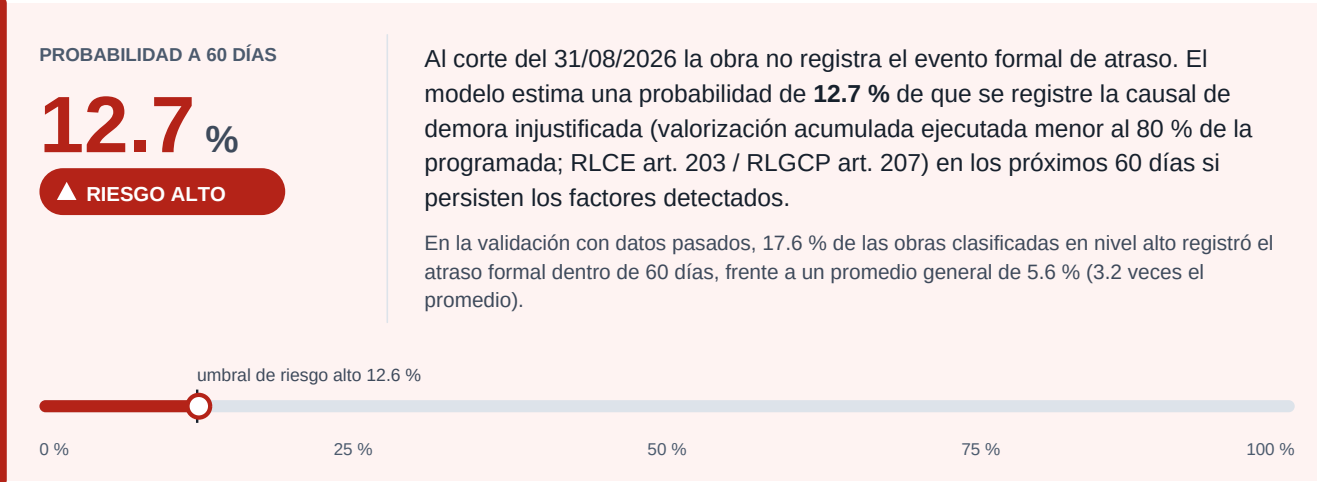


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	49 desde 04/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA ZONA A DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y VIVIENDA EL CRUCERO LA ESTRELLA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2672519.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Contratista	CONSORCIO ESTRELLA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2672519
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA ZONA ¿A¿ DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y VIVIENDA EL CRUCERO LA ESTRELLA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2406738
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,150,200.98
Cuaderno de obra digital	49 asientos entre 04/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

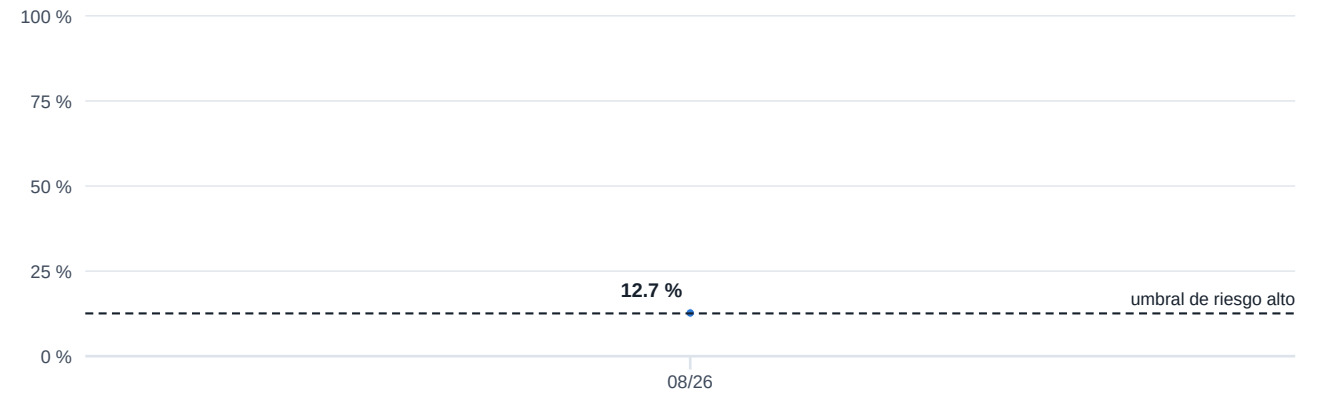

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.503
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.217
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.172
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.152
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.091
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.070
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.063
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.053

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.7 %	12.5 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 48 · Consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

ABSOLUCION DE CONSULTAS: En atención al Asiento de Obra N.º 28, mediante el cual el Residente de Obra comunica la continuidad de los trabajos de habilitación y colocación de acero, así como la programación del vaciado de concreto de muros de contención y zapatas, la Supervisión de Obra deja constancia que realizará la inspección y verificación previa de los elementos estructurales a vaciar, considerando la disposició...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...nstituye conformidad definitiva del elemento ejecutado, quedando esta sujeta a las verificaciones y controles de calidad posteriores al desencofrado.en caso de detectarse desviaciones, deficiencias o incumplimientos respecto de las condiciones técnicas y tolerancias aplicables, la supervision realizara la evaluacion correspondiente y dispondra las medidas correctivas que resulten técnicamente necesarias,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Consultas · SOEC_SPV · 24/08/2026

ABSOLUCION DE CONSULTAS: En atención a la consulta técnica formulada por la Residencia de Obra mediante Carta N° 018-2026-WRZ/RC/ESTRELLA e Informe N.º 22-2026/CESF/RO/ESTRELLA, relacionada con la interferencia identificada entre los pedestales PD-01 y PD-02 y los muros de contención MC-04 y MC-05, correspondiente a la losa deportiva de vóley, se deja constancia que la Supervisión ha efectuado la evaluación técnica d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Consultas · SOEC_SPV · 17/08/2026

CONSULTAS: Esta Supervisión toma conocimiento de los Asientos N.º 25, 26 y 27, de fecha 14/08/2026, mediante los cuales la Residencia de Obra comunica la documentación relacionada con la solicitud sobre la sección vial de la Calle Perimetral Sur/Los Sauces, la consulta formulada al Proyectista y la incidencia correspondiente a la paralización del gremio de transportistas.Respecto a la reserva de una eventual ampliaci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Consultas · SOEC_RESI · 14/08/2026

...7 y n 028-2026-cesf/ro/estrella, dejandose expresa reserva del derecho a solicitar ampliacion de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales en caso la definicion final de este extremo origine demora no atribuible al contratista.se solicita a la supervision de obra tomar conocimiento del presente asiento y pronunciarse conforme a sus atribuciones.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

...constancia de que la paralización señalada corresponde a una medida de fuerza realizada por terceros y es totalmente ajena a la voluntad, decision y control del contratista. por tal motivo, cualquier retraso que se genere como consecuencia de la imposibilidad o dificultad para trasladar al personal hacia el frente de trabajo no resulta atribuible al contratista.en ese sentido, y de acuerdo con lo establ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...encias . al respecto, se precisa que el articulo 198.1 literal a) del reglamento de la ley n. 32069, aprobado mediante decreto supremo n. 009-2025-ef, contempla como causal de ampliacion de plazo los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que estas modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento de la solicitud.por tanto, esta supervision de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

...rresponder, se efectuara la solicitud de ampliacion de plazo conforme al procedimiento establecido en el reglamento.lo senalado se deja registrado sin que ello implique asumir responsabilidad por los retrasos o afectaciones que puedan producirse como consecuencia de circunstancias ajenas al control del contratista.finalmente, se solicita a la supervision de obra tomar conocimiento de lo senalado en el p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
