


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra principal y contingencia del proyecto: ¿mejoramiento y ampliacion de atencion de los servicios de salud hospitalario en el hospital de emergencias chalhuanca, distrito de chalhuanca de la provincia de aymaraes¿ con CUI 2647032

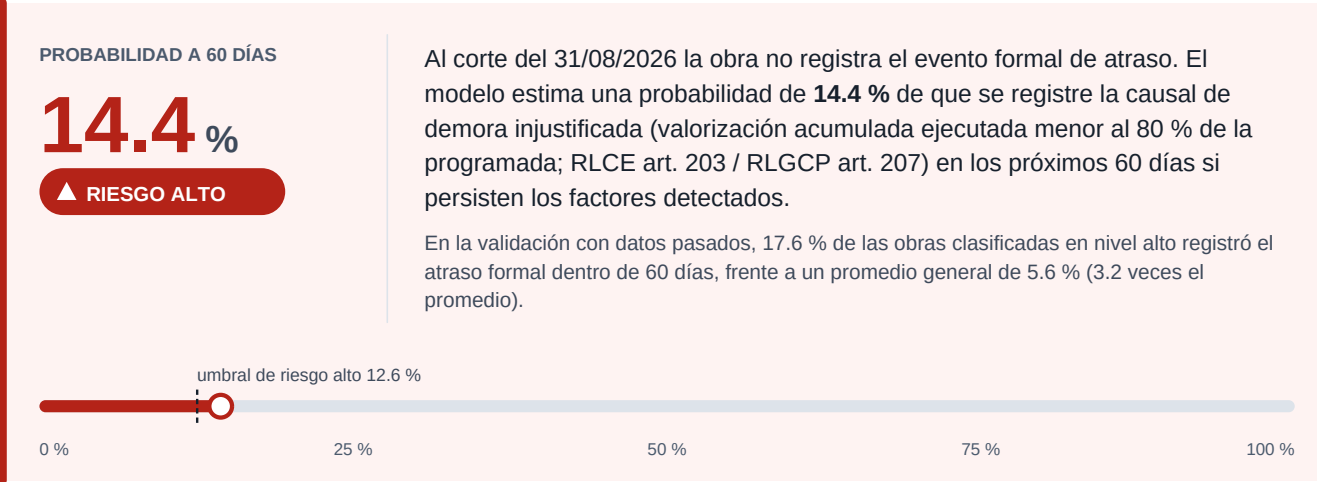


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 9,673,206.35	180 días	1,244 desde 11/11/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAEŚ¿ CON CUI 2647032
Entidad contratante	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Contratista	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHALHUANCA / AYMARAEŚ / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	2647032
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAEŚ DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2350442
Monto del contrato	S/ 9,673,206.35
Monto aprobado de la inversión	S/ 166,198,181.05
Cuaderno de obra digital	1244 asientos entre 11/11/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

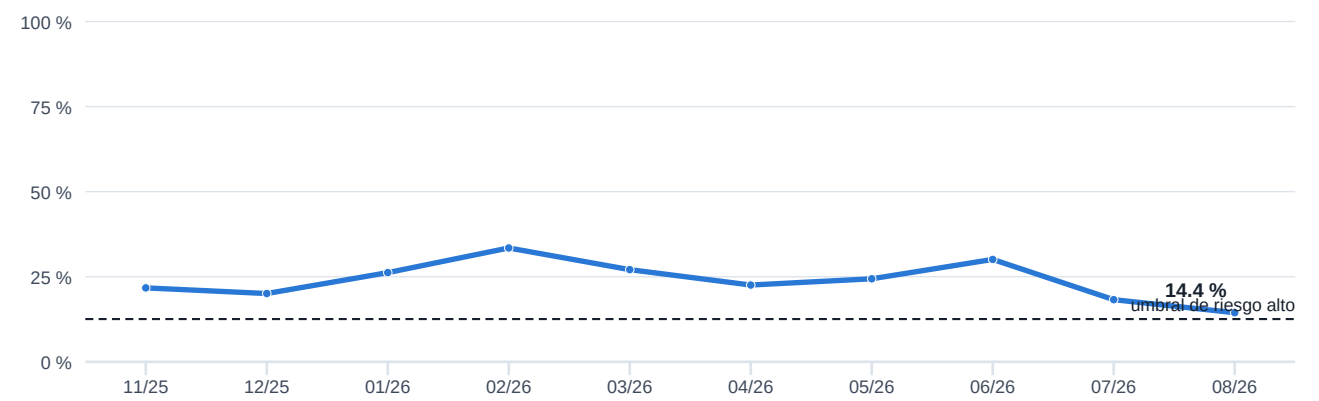

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.574
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.252
8 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.078
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.068
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.064
Monto aprobado de la inversión: S/ 166,198,181	Características de la obra		-0.063

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.4 %	14.4 %	-0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.4 %	15.1 %	+0.7 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1243 · Órdenes · SOEC_RESI · 31/08/2026

SOBRE AUTORIZACION DE VERTIDO DE CONCRETO FC 280 KG/CM2 ELEMENTOS PLACAS: Mediante el presente asiento y en atención a la falta de servidor de cuaderno de obra el día Sábado 29.08.26, se solicito a la Supervisión la autorización y liberación respectiva para proceder con el vaciado de concreto en las placas correspondientes al segundo nivel del Bloque C, trabajos enmarcados dentro de la Prestación Adicional de Obra N...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1225 · Órdenes · SOEC_RESI · 27/08/2026

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN BLOQUE D: Por medio del presente asiento, se comunica a la Supervisión para solicitar formalmente la autorización correspondiente para dar inicio a los trabajos de instalación de la carpintería de madera en las instalaciones del Bloque D, referidos específicamente a la partida 03.07.01 PUERTAS. Esta solicitud se ampara en el levantamiento previo de obs...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1220 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

demora en absoluciones de consultas y procedimientos independientes de consultas como adicionales. . como es de conocimiento de la supervision de obra, mediante carta n 242-2026/sclsp/hch/c de fecha 17 de a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1228 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...a autorizacion de liberacion de las placas. esta liberacion es indispensable para proceder con la programacion y posterior ejecucion del vaciado de concreto en el frente de trabajo indicado, evitando retrasos en la ruta critica del proyecto.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1221 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

demora en absoluciones de consultas y procedimientos independientes de consultas como adicionales.vienecomo resultado de dicha reunion, se ha podido advertir que, a la fecha, las consultas actualmente...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1222 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

demora en absoluciones de consultas y procedimientos independientes de consultas como adicionalesvieneen tal sentido, considerando el criterio establecido por la direccion tecnico normativa del oece, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1229 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

SOBRE AUTORIZACION DE VACIADO DE PLACAS DEL BLOQUE C VINCULADO A PAO 01: Con relación a la solicitud de autorización de trabajos, anotada en su asiento N°1228, se indica que se han constatado las condiciones técnicas adecuadas, disposición de recursos, materiales y equipos, implementación de controles de calidad, seguridad y medio ambiente, liberando el inicio de la actividad y portanto se autoriza la ejecución de la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1227 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

SOBRE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN BLOQUE D: Con relación a lo señalado en su asiento N°1225 en el que solicita la autorización correspondiente para dar inicio a los trabajos de instalación de la carpintería de madera en las instalaciones del Bloque D, de la partida 03.07.01 PUERTAS, amparada en el levantamiento previo de observaciones en taller, comprendiendo la ejecución de las u...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 1211 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/08/2026**

AUTORIZACION DE TRABAJOS VACIADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA Y VIGAS - ADO-01: Con relación a la solicitud de autorización de trabajos, anotada en su asiento N°1210, se indica que se han constatado las condiciones técnicas adecuadas, disposición de recursos, materiales y equipos, implementación de controles de calidad, seguridad y medio ambiente, liberando el inicio de la actividad y por tanto se autoriza la ejecuc...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 1197 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 21/08/2026**

PRESENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CALENDARIOS DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05: Mediante Carta N° 243-2026/SCLSP/HCH/C de fecha 19/08/2026, recepcionada por la Supervisión el mismo día (19/08/2026, Folio 25), el Contratista Sinohydro presenta el Programa de Ejecución de Obra, Calendario de Avance de Obra valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y Utilización de Equipos, actualizados por la a...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 1172 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026**

PRESENTACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE PROCEDIMIENTO DE RELLENO FLUIDO: En la fecha, se hace de conocimiento de la Supervisión de Obra que, mediante Carta N° 238-2026/SINOHYDRO-CVZ/RES/C y en atención a la Carta N° 114-2026 CSH.CHALHUANCA/JMCC/JS, se ha procedido con la presentación formal del levantamiento de observaciones correspondiente al Procedimiento Constructivo Relleno Fluido con Suelo Cemento (Cód...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
