


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Vista Alegre y Calles Colindantes al Parque Ramon Castilla, distrito de Oyotún de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque¿

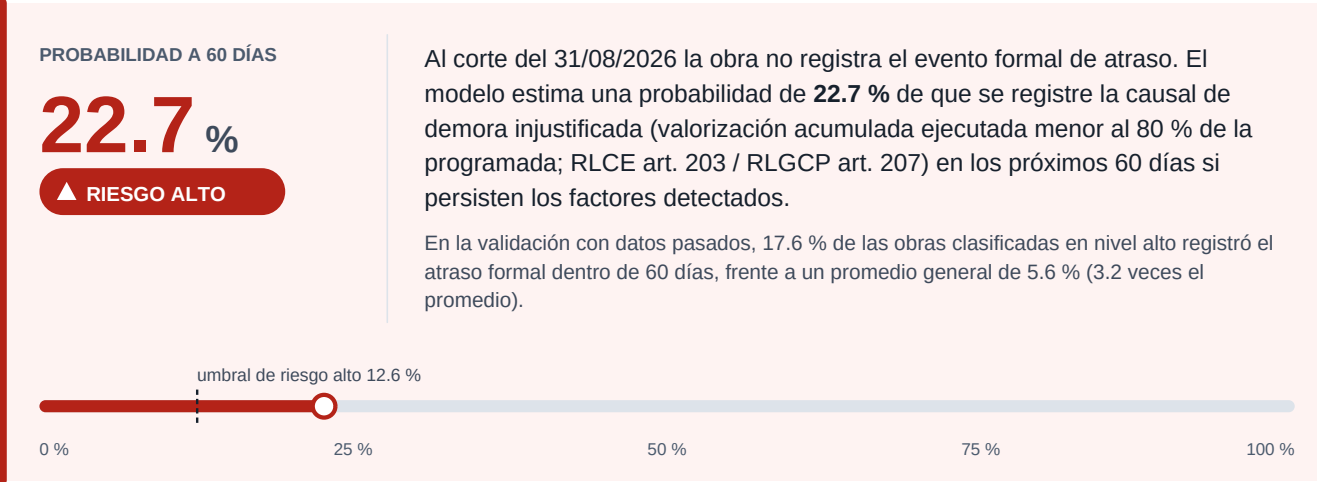


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 11,238,122.96	240 días	360 desde 10/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	ejecución de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Vista Alegre y Calles Colindantes al Parque Ramon Castilla, distrito de Oyotún de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque¿
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR MI BARRIO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	OYOTUN / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2661724
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR VISTA ALEGRE Y CALLES COLINDANTES AL PARQUE RAMON CASTILLA, DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2373744
Monto del contrato	S/ 11,238,122.96
Monto aprobado de la inversión	S/ 13,995,088.23
Cuaderno de obra digital	360 asientos entre 10/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

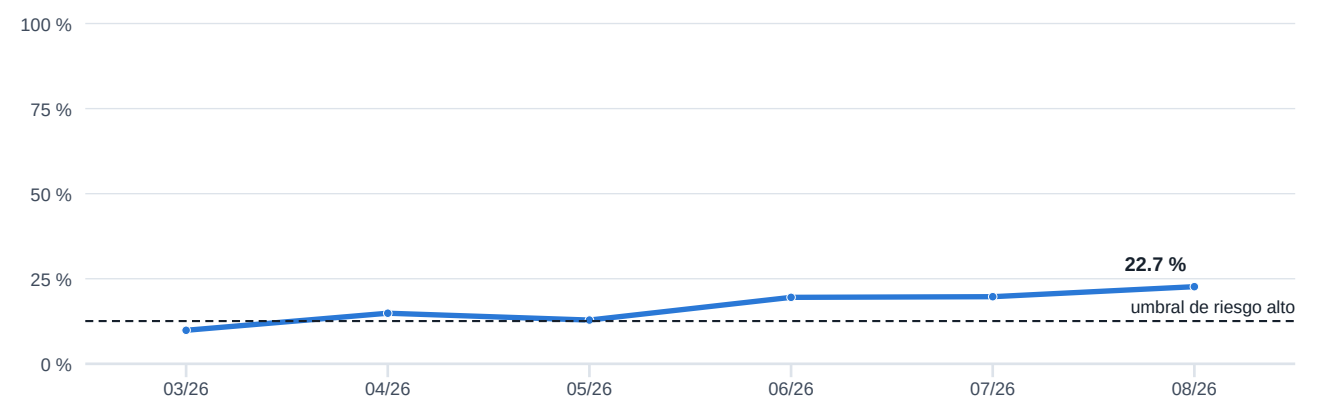

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.686
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.240
El 57 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.210
Faltan 62 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.191
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.189
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.132
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.122
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 5,209,942	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.107

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	22.7 %	22.6 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 320 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

ASIEN TO N.º 320 DE LA SUPERVISIÓN: PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO, NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL DE LA SUPERVISIÓN Respecto a lo manifestado por el Residente de Obra en el Asiento N.º 316 sobre las pendientes y desniveles de 0.60" m" y 1.00" m" aproximados en las rampas proyectadas en la Canchita de CO, esta Supervisión precisa y responde lo siguiente: Falta de Sustento Técnico Formal: El Residente de Obra no ha presentado a l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 318 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

ASIEN TO N.º 318 DE LA SUPERVISIÓN VIENE DEL ASIEN TO ANTERIOR: VIENE DEL ASIEN TO ANTERIOREl cumplimiento de los procesos de curado del concreto conforme a lo dispuesto en la Norma Técnica E.060 (Concreto Armado) del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).2. Respecto a la Interferencia / Incompatibilidad Técnica en Rampas de la Canchita de CO (Item 6) Respecto a la observación planteada por la Contratista a través d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 321 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

...rtes) y, en paralelo, readecuar la programacion de sus frentes de trabajo movilizand o personal a las partidas de la ruta critica no afectadas por esta interferencia puntual, evitando la generacion de demoras no justificadas imputables al ejecutor.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 308 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 06/08/2026

...trucc ion tecnica expresa y previamente notificada mediante el asiento n298, cuya inobservancia motivo el vaciado no conforme de sardineles reportado en el asiento n300. en consecuencia, la causal del atraso es directamente atribuible a la contratista y no constituye supuesto habilitante para ampliacion de plazo ni para reconocimiento de mayores gastos generales conforme a la ley n32069 y su reglamento,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 301 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

...rde con la normativa vigente.4.- tampoco puede la supervision instruir se efectue una correccion tecnica del trazo de estas calles, justo cuando estamos en proceso de ejecucion desde hace dos semanas atras, en este sector, habiendose la misma supervision aprobado el trazo y replanteo con antelacion mediante el cual ejecutamos nuestras actividades programadas que diariamente describimos y que son aproba...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 300 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

...rde con la normativa vigente.4.- tampoco puede la supervision instruir se efectue una correccion tecnica del trazo de estas calles, justo cuando estamos en proceso de ejecucion desde hace dos semanas atras, en este sector, habiendose la misma supervision aprobado el trazo y replanteo con antelacion mediante el cual ejecutamos nuestras actividades programadas que diariamente describimos y que son aproba...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 229 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/07/2026

ASIEN TO N.º 229 DE LA SUPERVISIÓN: Se recuerda al Contratista que, de manera obligatoria y previa a cada vaciado de concreto premezclado (veredas, losas, martillos, sardineles o pavimento), se deberá contar con la liberación y firma en campo por parte de esta Supervisión de los frentes encofrados y niveles topográficos correspondientes. Sobre protocolos Se le indico al encargado de presentar los protocolos que cumpla c...

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 62

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
