


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio educativo del nivel, primaria y secundaria de la i.e claverito, distrito de iquitos, provincia de maynas, departamento de loreto, con CUI N° 2609257

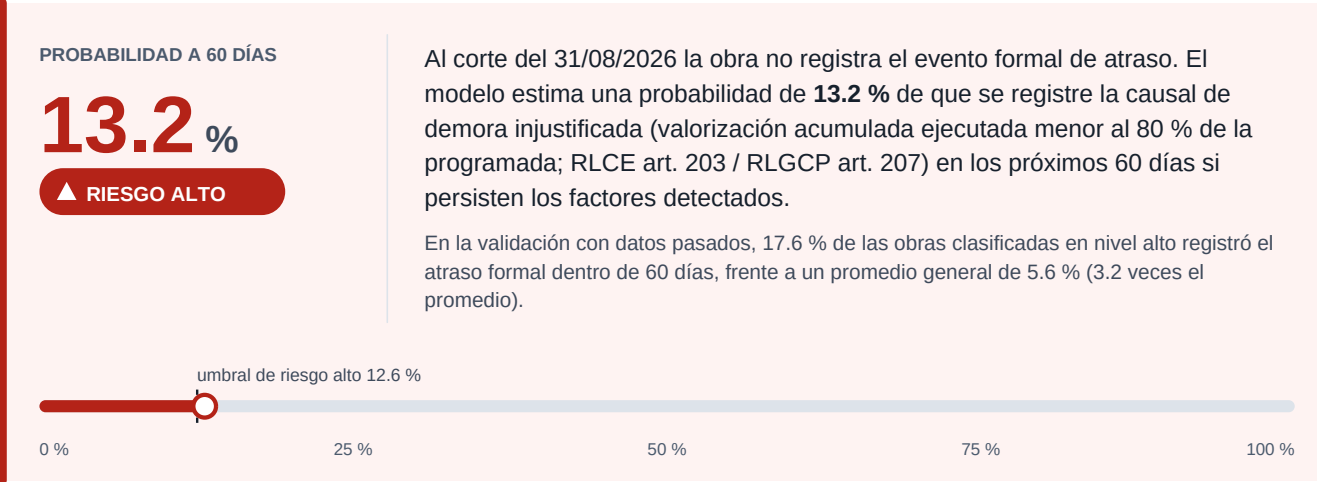


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 45,677,395.00	480 días	388 desde 09/08/2025	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E CLAVERITO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N° 2609257
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO EDUCATIVO CLAVERITO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Código Único de Inversión (CUI)	2609257
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. CLAVERITO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2321872
Monto del contrato	S/ 45,677,395.00
Monto aprobado de la inversión	S/ 19,702,152.25
Cuaderno de obra digital	388 asientos entre 09/08/2025 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

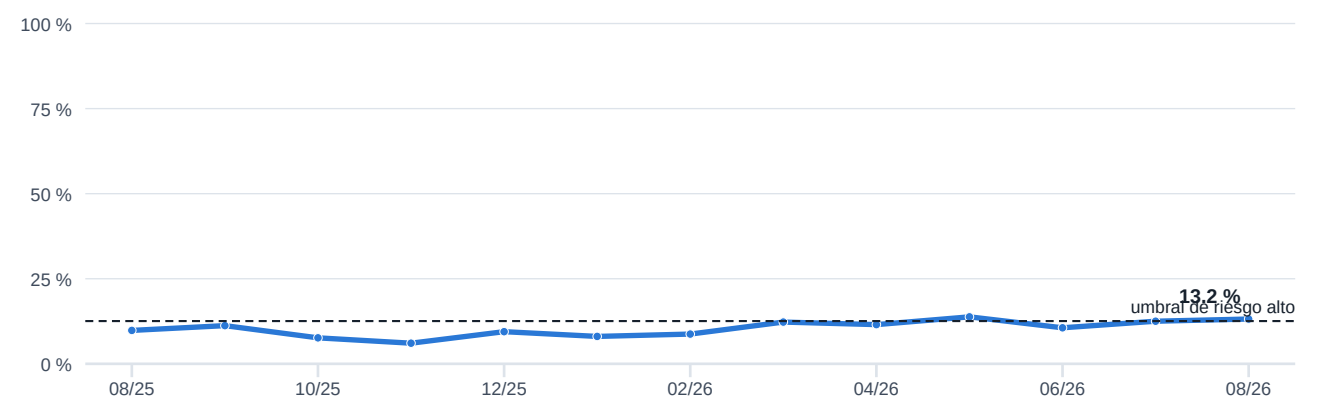

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.635
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.205
Faltan 93 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.147
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 8,192,287	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.145
Departamento: Loreto	Características de la obra		+0.141
El 75 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.141
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.117
13 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.093

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.2 %	13.6 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 386 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 26/08/2026

...lo 198 del reglamento. asimismo, a mayor abundamiento cumplimos con indicar en el asiento n384 y 385 de fecha 25/08/2026 se consigno que, debido a las protestas sociales paro regional, la obra sufrió retrasos en su ejecución, al no contar con el personal clave y obrero, para proseguir con la ejecución de la obra, por lo que el programa de ejecución de obra vigente se ha afectado, lo que ha generado la c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 385 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...de ejecución de obra vigente, dado que escapa del ámbito de control del contratista, el día de hoy se inicia la causal de ampliación de plazo al estar incurso en la causal tipificada en el literal a) atrasos por causas no atribuibles al contratista, de artículo 197 de dicho cuerpo legal. en consecuencia, toda vez que el riesgo no ha sido previsto ni en el estudio de gestión de riesgos del expediente te...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 385 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

INICIO DE CAUSAL POR PARO REGIONAL DE LA CGTP_02: -----> viene de Asiento 384 Por lo que, de conformidad a lo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en razón de los efectos ocasionados por el paro de transportistas que se ha iniciado el día de hoy sobre los trabajos programados que impiden el cumplimiento del programa de ejecución de obra vigente, dado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 379 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 14/08/2026

SOLICITA PROGRAMA DE TRABAJO: SE SOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA ALCANZAR A ESTA SUPERVISION EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PRESENTE MES EN FUNCION AL CALENDARIO DE OBRA VIGENTE, CON FINES QUE ESTA SUPERVISION HAGA EL SIGUIIMIENTO Y CONTROL DE DICHO PROGRAMA Y QUE LA OBRA NO SUFRA ATRASO ALGUNO Y CON CONSECUENCIAS POSTERIORES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 379 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 14/08/2026

...sta supervision el programa de trabajo del presente mes en funcion al calendario de obra vigente, con fines que esta supervision haga el seguimiento y control de dicho programa y que la obra no sufra atraso alguno y con consecuencias posteriores atribuibles al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 370 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026

...firmado con la entidad.en caso que la entidad incumpla con 03 meses de falta de pago en sus valorizaciones la contratista tiene derecho a una paralización de obra.finalmente se deja constancia que el atraso de ejecución de obra del día de hoy va en perjuicio a la programación de obra vigente. se recomienda el residente de obra solucionar lo mas pronto este impase para el bienestar de la obra.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 369 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026

VERIFICACION DE TRABAJOS: SE REITERA AL RESIDENTE DE OBRA LO ANOTADO EN ASIENTO N° 364 SOBRE EL ATRASO EN LOS INICIOS DE PARTIDAS DE EJECUCION EN ARQUITECTURA Y SANITARIAS, QUE DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VIGENTE DEBIERON INICIARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO RESPECTIVAMENTE.SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION Y DE COLUMNAS EN MODULOS.

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 93

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
