


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la vía colectora comprendida por las calles san pedro, acomayo y AV. La unión (tramo: AV. 26 de noviembre ¿ AV. Victor malasquez), distrito de villa maria del triunfo distrito de pachacamac de la provincia de lima del departamento de lima, CUI 2599396, primera etapa (km 00+00 a 3+080)

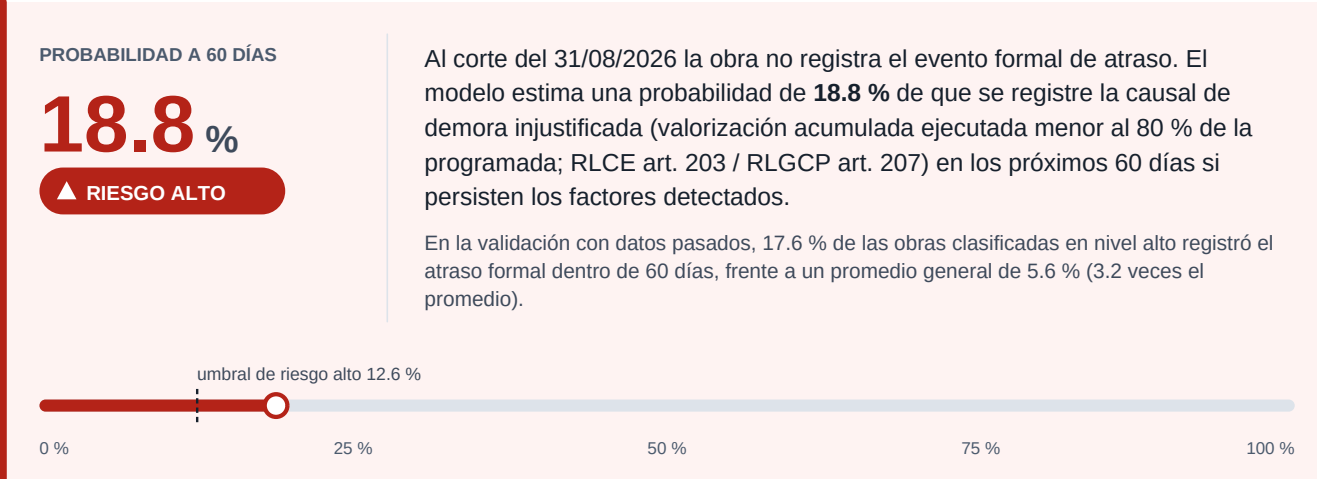

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 16,175,222.18	150 días	303 desde 04/02/2026	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNIÓN (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE ¿ AV. VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI 2599396, PRIMERA ETAPA (KM 00+00 A 3+080)
Entidad contratante	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
Contratista	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VILLA MARIA DEL TRIUNFO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2599396
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNIÓN (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE ¿ AV. VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2350678
Monto del contrato	S/ 16,175,222.18

Monto aprobado de la inversión	S/ 74,083,254.29
Cuaderno de obra digital	303 asientos entre 04/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

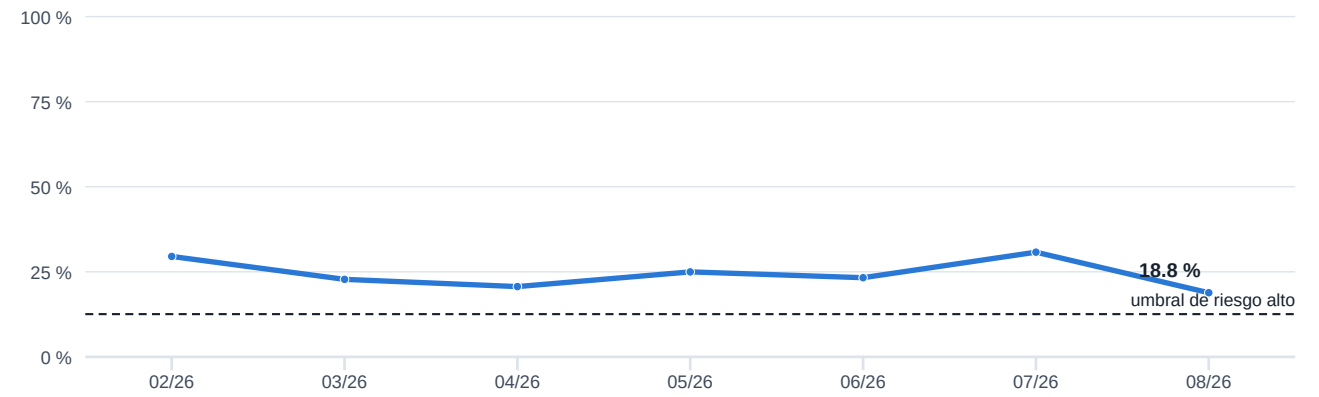

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.696
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.210
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.197
8 asientos de calendario de avance valorizado desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.102
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.099
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.094

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.8 %	18.3 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.8 %	19.5 %	+0.7 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 289 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 25/08/2026

NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA ACTUALIZADO – AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04: POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO, ESTA SUPERVISIÓN DE OBRA NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RECEPCIÓN DE LA CARTA N° 000629-2026-EMAPE/GOS DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2026, MEDIANTE LA CUAL LA GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE EMAPE S.A. OTORGA CONFORMIDAD AL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE O...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 283 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_SPV · 24/08/2026

...re formalidades no esenciales y procurando una gestion contractual eficiente. en ese sentido, corresponde adoptar y encauzar la solucion tecnicamente determinada sin generar tramites innecesarios que retrasen la ejecucion de una solucion ya evaluada y sustentada, observando los principios de eficacia, eficiencia y cumplimiento oportuno de los fines publicos que inspiran la ley n. 32069. la propia ley es...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 281 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 22/08/2026

...ninguna de ellas presenta filtracion o fuga por lo que eso implica que en alguna de las 44 abrazaderas de la tuberia que llega a la matriz de agua puede estar mal.la situacion indicada esta generando retraso en la ejecucion de los trabajos del adicional de obra n 01, lo que puede generar el riesgo de ampliacion de plazo por retraso justificado no atribuible al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 273 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 19/08/2026

... de pruebas hidraulicas y su incidencia en la ejecucion de las partidas 01.06.01 y 01.07.01.al respecto, se precisa que, conforme al articulo 198.1, literal a), del reglamento de la ley n. 32069, los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista constituyen causal de ampliacion de plazo, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente.en tal sentido, la su...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 272 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

...causal de ampliacion de plazo por afectacion de ruta critica . viene...en tal sentido, se ha configurado la causal de ampliacion de plazo al estar incurso en la causal tipificada en el literal a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del articulo 198 del rlce vigente a la fecha de contratacion, por lo que, por estas circunstancias que a criterio de esta residencia det...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 257 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

DAÑOS EN VEREDAS EJECUTADAS: EN ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 252, LA SUPERVISIÓN PRECISA QUE NO CORRESPONDE ATRIBUIR LOS DAÑOS EN LAS VEREDAS EJECUTADAS A DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, TODA VEZ QUE LOS HECHOS DESCRITOS OBEDECEN PRINCIPALMENTE AL TRÁNSITO Y ESTACIONAMIENTO INDEBIDO DE VEHÍCULOS SOBRE TRABAJOS YA EJECUTADOS.DE ACUERDO CON LA LEY N.º 32069 Y SU REGLAMENTO, CORRESPONDE AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 243 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 04/08/2026

CONFORMIDAD AL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 03: SE INFORMA A LA CONTRATISTA DE LA CARTA N.º 000552-2026-EMAPE/GOS, DE FECHA 24/07/2026, MEDIANTE LA CUAL LA GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE EMAPE COMUNICA LA CONFORMIDAD AL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO, DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 03, SUSTENTADA EN EL INFOR...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 244 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 04/08/2026 CONFORMIDAD A LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.º 01: SE INFORMA AL CONTRATISTA DE LA CARTA N.º 000560-2026-EMAPE/GOS, MEDIANTE LA CUAL LA GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE EMAPE COMUNICA LA CONFORMIDAD A LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.º 01, EN MÉRITO AL INFORME N.º 023-2026-ZLUC-EMAPE-GOS, EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE OBRA.ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ENTIDAD HA VER... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 231 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 30/07/2026 EVALUACIÓN Y ELEVACIÓN DE LA CONSULTA N.º 10 A LA ENTIDAD: EN ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 222 DEL RESIDENTE, ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LA CONSULTA N.º 10 Y EL INFORME TÉCNICO QUE LA SUSTENTA, REFERENTE AL CAMBIO DE USO DE VEREDA CORRIDA POR BOCACALLE EN LAS PROGRESIVAS 2+020 Y 2+060 DE LA AV. UNIÓN.DE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE ADVIERTE QUE LA PROPUESTA IMPLICA UNA ... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 213 · Participación de profesionales adicionales al personal clave · SOEC_SPV · 22/07/2026 respuesta a asiento n. 212 conformidad al cambio de especialista no clave . en atencion al asiento n. 212, mediante el cual la contratista comunica la aplicación del silencio administrativo positivo respecto a la solicitud de cambio del especialista en topografía,... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 212 · Participación de profesionales adicionales al personal clave · SOEC_RESI · 22/07/2026 informo consentimiento de cambio de especialista no clave . se informa a la supervision que con carta n 370-2026/ccdi-sa de fecha 03/06/2026, la contratista solicito a la entidad el cambio del especialista en topografia, trazo y diseno vial, el mis... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 209 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 21/07/2026 APROBACIÓN DEL CALENDARIO ACTUALIZADO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 02: VISTA LA CARTA N.º 543-2026-EMAPE/GOS, MEDIANTE LA CUAL LA ENTIDAD OTORGA CONFORMIDAD AL CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 02.EN ESE SENTIDO, VERIFICADA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA QUE EL CALENDARIO APROBADO CONSTITUYE EL INSTRUMENTO VIGENTE PAR... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
