

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

"mejoramiento del servicio educativo inicial en la i.e.i. N 581 del centro poblado centro palma, distrito de tacabamba - provincia de chota - región cajamarca"

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

16.8 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **16.8 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	150 desde 28/11/2025	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. N 581 DEL CENTRO POBLADO CENTRO PALMA, DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA"
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Contratista	CONSORCIO HD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TACABAMBA / CHOTA / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2344661
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS I.E.I. N 569 DEL CENTRO POBLADO EL NARANJO, DISTRITO CHALAMARCA Y EN LAS I.E.I. N 581 DEL CENTRO POBLADO CENTRO PALMA Y I.E.I. N 10463 DEL CENTRO POBLADO VILCASIT, DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2343489
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,333,514.00
Cuaderno de obra digital	150 asientos entre 28/11/2025 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

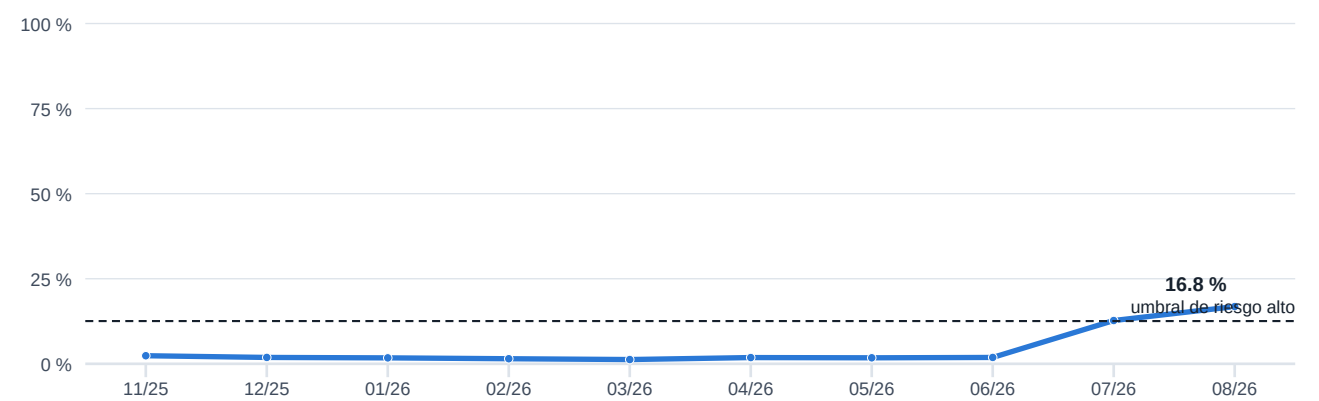

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.699
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.252
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.209
El 87 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.203
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.126
14 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.114
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
7 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.100

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	16.8 %	15.4 %	-1.4 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	16.8 %	16.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 146 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

CONTROL DE TRABAJOS EJECUTADOS: El día de hoy se ha supervisado la ejecución de los siguientes trabajos:• Tarrajeo de superficies de vigas, columnas, muros interiores y derrames de la elevación frontal interior del aula del Módulo III. Asimismo, se reitera al Contratista la necesidad de incrementar la cantidad de trabajadores y cuadrillas en los diferentes frentes de trabajo, teniendo en consideración el estado actual...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 144 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...ntralista no de cumplimiento a lo requerido en el referido asiento no 142 y no cuente con la autorizacion correspondiente, debiera abstenerse de continuar con la ejecucion de dicha partida. en caso de incumplimiento, los trabajos que sean ejecutados bajo dicha condicion y responsabilidad del contratista no seran aprobados ni considerados para efectos de la valorizacion de obra mientras no se acredite su c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 139 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 06/08/2026

...disposiciones impartidos por esta supervision mediante los asientos del cuaderno de obra digital, a fin de garantizar la normal continuidad de la ejecucion de la obra y evitar la generacion de nuevos retrasos injustificados o el agravamiento de los ya existentes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 138 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 04/08/2026

alcance del limite maximo de la penalidad por mora . sirva el presente asiento para dejar constancia que, conforme al calculo efectuado por esta supervision en aplicacion de la formula de penalidad por mora prevista en la clausula decimo cua...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 138 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 04/08/2026

...alcanzado el limite maximo de la penalidad por mora aplicable al contrato de obra. dicho calculo se sustenta en el monto contractual, el plazo de ejecucion establecido en el contrato y el computo del retraso injustificado generado desde el 09/07/2026, fecha a partir de la cual la obra viene ejecutandose con posterioridad al vencimiento del plazo contractual ocurrido el 08/07/2026, sin que, a la fecha, e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 136 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026

...parte del contratista, precisando que no reiniciaran las labores hasta que se efectuen los pagos correspondientes.se deja constancia que la persistencia de esta paralizacion continua incrementando el retraso en la ejecucion de la obra, la cual viene ejecutandose fuera del plazo contractual, cuyo vencimiento se produjo el 08/07/2026.en tal sentido, esta supervision exhorta nuevamente al contratista a ado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 135 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

... contratista no ha logrado implementar medidas eficaces que permitan restablecer las condiciones necesarias para garantizar la continuidad normal de los trabajos, incrementandose el riesgo de mayores retrasos en la ejecucion de la obra.en tal sentido, se exhorta al contratista a adoptar de manera inmediata las acciones que resulten necesarias para superar la situacion descrita y restablecer la normal ej...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 135 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

...uencia de ello, no fue posible ejecutar las partidas contempladas para la fecha, generandose una afectacion directa al desarrollo de la obra.asimismo, se deja constancia que esta situacion agrava los incumplimientos advertidos mediante los asientos precedentes, evidenciando que, pese a las reiteradas observaciones formuladas por esta supervision respecto de las deficiencias tecnicas, administrativas y co...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 133 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026**

incumplimiento de las disposiciones de seguridad y ejecucion de trabajos sin autorizacion de la supervision . debido a la extension del asiento, se procede a cargar el respectivo archivo en pdf para darle co...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 125 · Órdenes · SOEC_SPV · 15/07/2026**

ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MATERIALES A OBRA: Sirva el presente asiento para dejar constancia que, durante las labores de supervisión efectuadas el día de hoy, se verificó que el Contratista dispuso el traslado de arena gruesa con la finalidad de ingresarla a la obra, sin haber gestionado previamente la autorización expresa de esta Supervisión, incumpliendo el procedimiento es...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
