


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la asociacion de vivienda los 04 suyos del distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa de la provincia de tacna del departamento de tacna

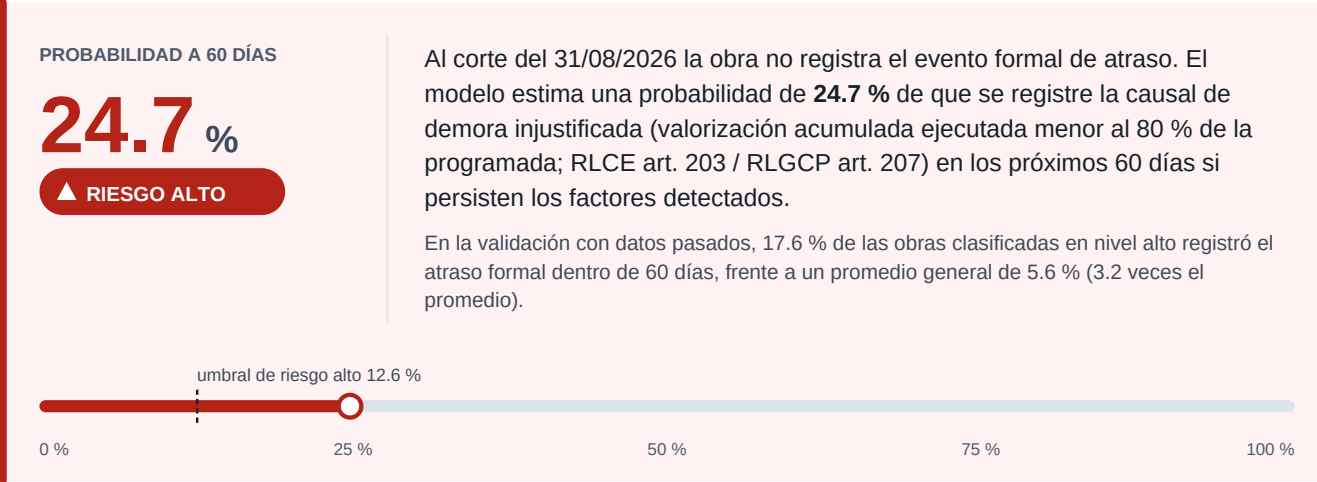


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	198 desde 19/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS 04 SUYOS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	CONSORCIO VIAL YURA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2609406
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS 04 SUYOS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2391291
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,651,338.65
Cuaderno de obra digital	198 asientos entre 19/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

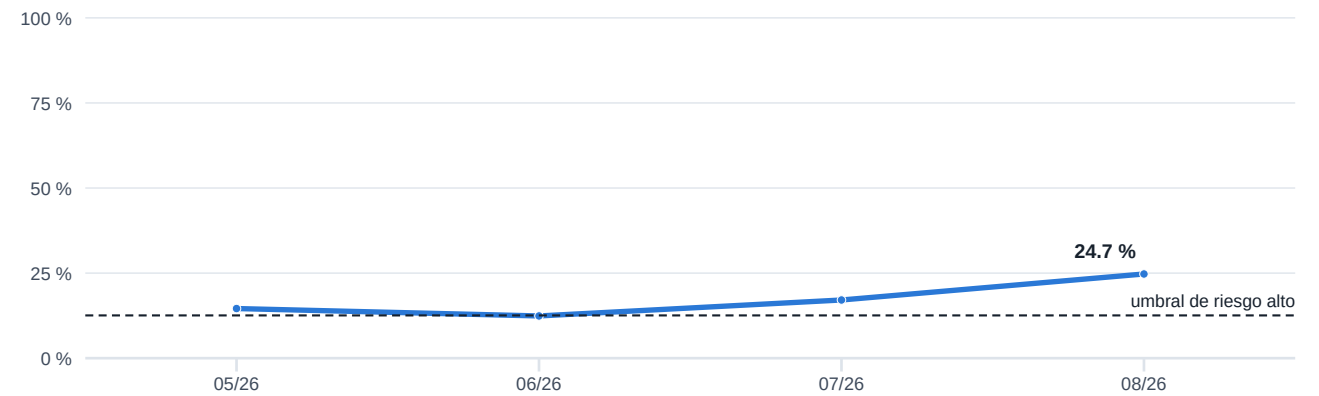

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.601
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.250
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.242
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.218
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
El 33 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		-0.088
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.084
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.078

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	24.7 %	24.5 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	24.7 %	24.5 %	-0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 197 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

... de incremento de recursos, autorizacion de mayores gastos generales ni modificaciones contractuales, con el unico objetivo de revertir la condicion situacional y evitar la configuracion formal de un atraso injustificado conforme al rlce (ley n. 32069)

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 195 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA CONSULTA N.º 17 – ACLARACION DE OBSERVACIONES AL SISTEMA ELECTRICO: EN ATENCIÓN A LA CONSULTA N.º 17 DEL RESIDENTE (ASIENTO N.º 192 Y CARTA N.º 094-2026-RC/CI), SOBRE INCOMPATIBILIDADES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y SU IMPACTO EN OBRAS CIVILES, ESTA SUPERVISIÓN EMITE PRONUNCIAMIENTO MEDIANTE CARTA N.º 078-2026-YAM-CSS TRAS EVALUAR LA CONSULTA N.º 17, SE CONFIRMARON OMISION...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 196 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...t)de la evaluacion de campo al cierre del mes, se advierte la posibilidad que el avance fisico acumulado ejecutado se mantendria por debajo del programado vigente. la condicion fisica y porcentaje de atraso frente al cronograma vigente se consolidaran oficialmente con el calculo de la valorizacion mensual n. 04. de confirmarse un atraso injustificado, se requeriran de inmediato las acciones correctivas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 198 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

...pada de los materiales y equipos hse y seguridad fisicase realiza los requerimientos de epps al personla riesgos externosel contratista viene realizando las compras directamente evitando tercerizar y demorasla mano de obra esta siendo evaluada constantemente y el ingresos en conforme se apertura frentes de trabajo riesgos de la direccion de proyectosse cuenta con la poliza de seguros se concluye que se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 190 · Consultas · SOEC_RESI · 26/08/2026

...la partida 01.10.01.05.02 suministro e instalacion de bancas de acero y madera, por 09 unidades ,el riesgo de no determinar los detalles y el diseno es la no ejecucion de la banca de acero y madera e incumplimiento de metas del proyecto

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 183 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...nciamiento sobre la consulta n. 11, registrada por el residente de obra en el asiento n. 164, referida a la omision del plano de detalle e indeterminacion del busto para el monumento de la plaza civicatras evaluar la documentacion tecnica del proyecto, esta supervision declara la consulta tecnica y legalmente procedente. de la revision del expediente tecnico se verifica que la partida busto para monume...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA CONSULTA N.º 10 - ALTURA DE POSTES DE C°A°C°: EN ATENCIÓN A LA CONSULTA N.º 10 DEL RESIDENTE (ASIENTO N.º 163 Y CARTA N.º 076-2026-RC/CI REC. 14/08/2026), ESTA SUPERVISIÓN EMITE RESPUESTA CONFORME AL ART. 190 DEL RLCE (LEY N.º 32069), NOTIFICADA FORMALMENTE AL CONTRATISTA EL 19/08/2026 MEDIANTE CARTA N.º 067-2026-YAAM-CSS Y RESPALDADA EN EL INFORME N.º 062-2026-ERCCH-S...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 118 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_RESI · 21/07/2026

...desenocfrado caravistael metrado que se ejecutara sera de 145.38 m2 (ver planilla metrados adjunto)la no aprobacion de la solicitud significara la no ejecucion de la totalidad de metrados por ende el incumplimiento demetas del proyecto

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 99 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026**

incumplimiento en subsanacion de observaciones al plan de manejo ambiental y control contractual . se deja expresa constancia de que el contratista ejecutor (consorcio innova) persiste en el incumplimiento r...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 98 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026**

CONTROL INOPINADO DE PERMANENCIA Y CONSTATACIÓN DE AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE: SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA SUPERVISIÓN EXTERNA REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN INOPINADA Y PRESENCIAL EN OBRA PARA CONTROLAR LA PERMANENCIA FÍSICA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA (CONSORCIO INNOVA). ESTE CONTROL SE EJECUTA EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, EL CUAL CUENTA CON CONFORMIDAD TÉCNICA DEFI...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
