


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de servicio de consultoria para la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion fisica del proyecto: Creacion de siembra y cosecha de agua en thp quebrada las zorras, distrito de yarabamba, provincia arequipa, departamento arequipa

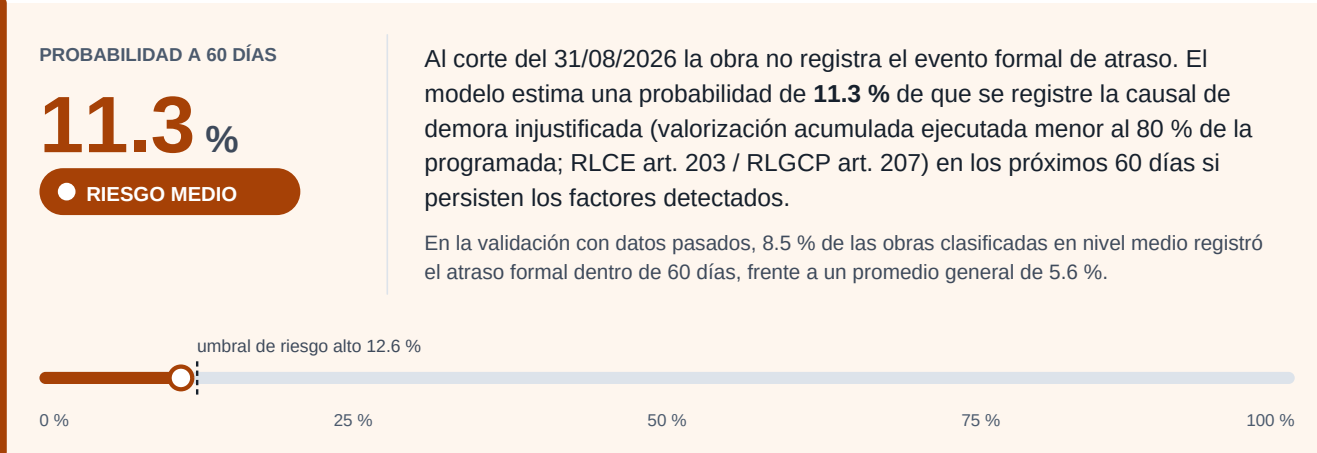


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	79 desde 05/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION FISICA DEL PROYECTO: CREACION DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN THP QUEBRADA LAS ZORRAS, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Contratista	GENUS SVC S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YARABAMBA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2671264
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN THP QUEBRADA DE LAS ZORRAS DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	AMBIENTE
Identificador del contrato (SEACE)	2335310
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 64,145,616.07
Cuaderno de obra digital	79 asientos entre 05/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

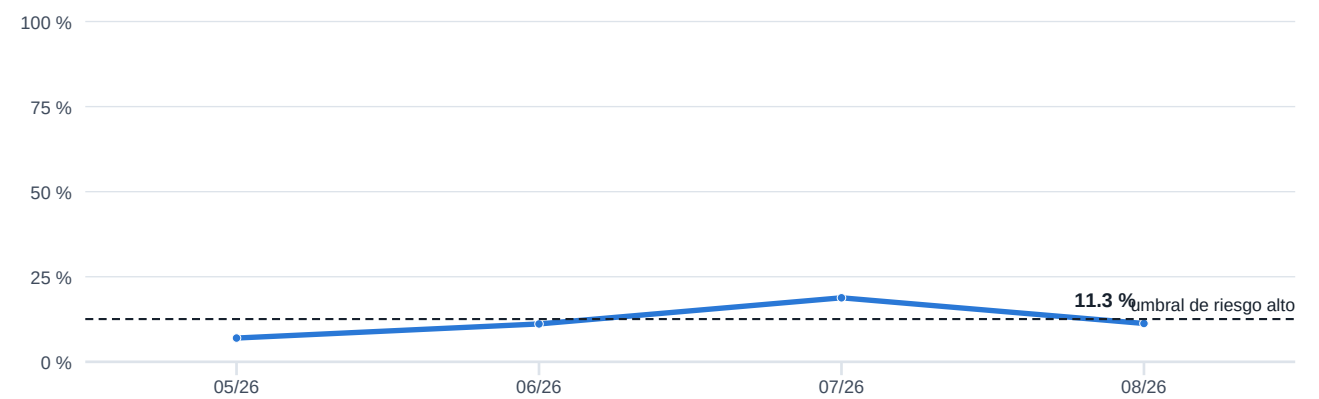

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.215
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.45 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.146
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.142
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.139
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.113
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.107
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.094

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.3 %	11.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 79 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 31/08/2026

VERIFICACION DE ACTIVIDADES: La supervisión continua con la revisión de las charlas de inducción en seguridad y salud laboral a los trabajadores de la obra, realizado por el especialista en SSOMA del contratista, antes del inicio de la jornada laboral. Se continua con las actividades de la conformación de la presa 3D en la quebrada las zorras, con las partidas correspondientes para su ejecución (carguío, traslado, y f...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 63 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 11/08/2026

VERIFICACION DE ACTIVIDADES: La supervisión de obra, verificaron las charlas de inducción en seguridad y salud laboral a los trabajadores de la obra, realizado por el especialista en SSOMA del contratista, antes del inicio de la jornada laboral. Se continua con las actividades de la conformación de la presa 3D en la quebrada las zorras, con las partidas correspondientes para su ejecución (fraccionamiento de roca en cu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 60 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 06/08/2026

...ersible en el cauce, hasta el pronunciamiento del midagri formalice la adecuacion ambiental, del tramite realizado. con esta autorizacion se esta respetando el cronograma de ejecucion, para no caer en retrasos injustificados, y cumplir con los avances de obra programados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026

...sion . respecto a lo senalado por la supervision, esta residencia de obra discrepa con la interpretacion efectuada, toda vez que la restriccion de las areas de intervencion no obedece a una omision o incumplimiento del contratista, sino a la falta de pronunciamiento por parte del ministerio de cultura respecto a los procedimientos administrativos iniciados oportunamente. en efecto, el contratista cumplio...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026

RESPUESTA AL ASIEN TO N°38 DE SUPERVISION: Respecto a lo señalado por la Supervisión, esta Residencia de Obra discrepa con la interpretación efectuada, toda vez que la restricción de las áreas de intervención no obedece a una omisión o incumplimiento del Contratista, sino a la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio de Cultura respecto a los procedimientos administrativos iniciados oportunamente. En efecto, ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026

...diseno y construccion corresponde al contratista elaborar y tramitar los instrumentos tecnicos y administrativos necesarios para la ejecucion de la obra, ello no implica asumir responsabilidad por la demora en la evaluacion y emision de actos administrativos por parte de entidades publicas, toda vez que dichas actuaciones dependen exclusivamente de la autoridad competente. en ese sentido, resulta improc...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

...da de las zorras, distrito de yarabamba de la provincia de arequipa del departamento de arequipa", se deja constancia que de acuerdo a la carta gerencial n. 516-2026-gidur-jemr-mdy remito respuesta a cambio de personal acreditado jefe de supervision, se ha dispuesto el cambio del profesional acreditado para el cargo de jefe de supervision. en tal sentido, se asume el cargo a partir del 16 de julio de 2026, en reempl...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 38 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026**

...responsabilidad integral del expediente tecnico y la ejecucion, la evaluacion, el monitoreo y el rescate arqueologico son actividades inherentes al desarrollo del proyecto. en consecuencia, cualquier retraso o restriccion derivado de la omision en tramitar el plan de monitoreo arqueologico (pmar) o similares constituye un riesgo propio de su gestion contractual, no imputable a la entidad

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 37 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 14/07/2026**

...ha, la ejecucion de la obra continua viendose afectada por la falta de liberacion de las areas de intervencion, situacion que impide el desarrollo normal de las partidas programadas y viene generando retrasos en la ejecucion fisica de la obra, afectando el cumplimiento del cronograma contractual. al respecto, se deja constancia que mediante acta informatizada de inspeccion n. 2026_ddc_aregql/mc, corresp...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
