


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra mejoramiento del servicio de espacios públicos verdes en parque recreacional miguel grau, distrito de cristo nos valga, de la provincia de sechura, del departamento de piura, CUI N° 2591754

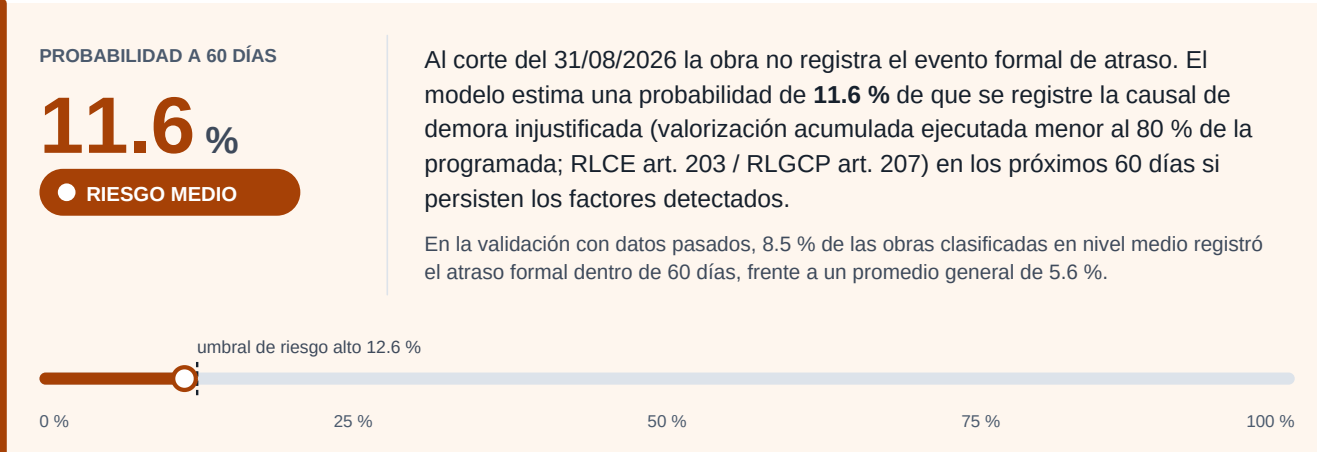


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	32 desde 13/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN PARQUE RECREACIONAL MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2591754
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR CPR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CRISTO NOS VALGA / SECHURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2591754
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN PARQUE RECREACIONAL MIGUEL GRAU DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	AMBIENTE
Identificador del contrato (SEACE)	2412848
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,389,043.14
Cuaderno de obra digital	32 asientos entre 13/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

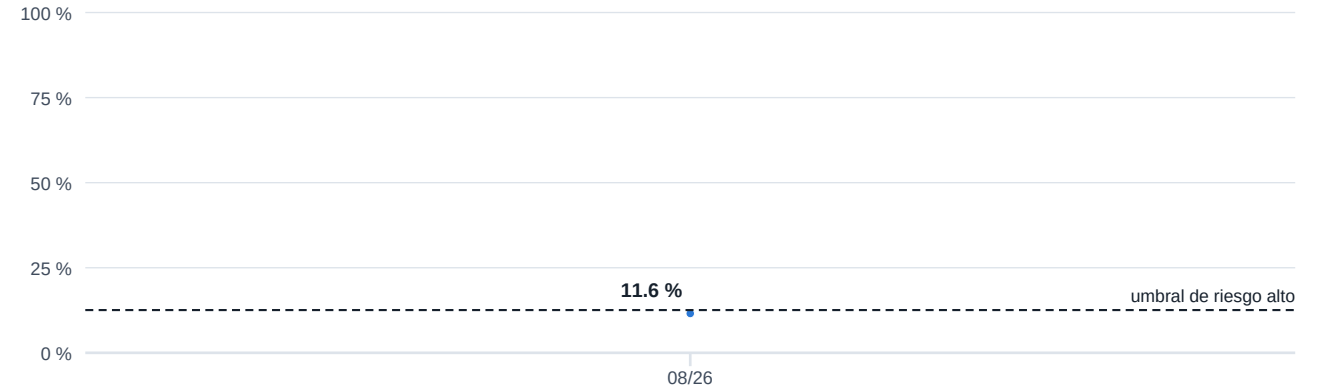

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.670
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.205
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.199
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.109
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.103
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.088
Extensión media de los asientos recientes: 1,332 caracteres	Contenido de los asientos		-0.059
Entidad contratante: municipalidad distrital	Características de la obra		-0.048

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.6 %	11.3 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

CONTINUACION DE ASIEN TO: o modificación técnica del expediente. 3.1.2 Requerimiento Normativo de Informe Técnico (Numeral 190.2 del Art. 190):De conformidad con lo dispuesto en el numeral 190.2 del Artículo 190 del Reglamento, el cual establece expresamente que: "Cuando la anotación formulada por el contratista conlleve a una modificación del expediente técnico, debe estar acompañada de un informe técnico, caso contr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 23 · Consultas · SOEC_RESI · 26/08/2026

...seria la imagen a utilizar.2. pronunciarse respecto a la propuesta de utilizar granito volcanico como material de la escultura.se agradece atender dicha consulta lo antes posible, a fin de no generar demoras en el cronograma de obra.sin otro particular, se deja el presente asiento para conocimiento y absolucion de la consulta planteada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

... a enosa.4. sobre la reserva del derecho a ampliacion de plazo:se le recuerda a la contratista que, al estar la tramitacion y ejecucion de la reubicacion a su cargo dentro de la partida 01.04.03, las demoras derivadas de la falta de impulso oportuno o la presentacion tardia de los requisitos ante la empresa concesionaria seran de su entera responsabilidad. para mitigar cualquier afeccion a la ruta criti...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

CONTROL DE CALIDAD: SUSTENTO TÉCNICO Y NORMATIVO: PROTOCOLO DE LIBERACIÓN: El Contratista deberá presentar el protocolo firmado de la partida 04.04.03.01.04 para la liberación formal por parte de esta Supervisión antes de proceder con el vaciado de concreto en la partida 04.04.03.02.01. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD: Se recuerda que la recepción definitiva de la cisterna estará sujeta a la prueba hidráulica (llenado) confor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Constatación física de la obra · SOEC_RESI · 21/08/2026

...endo sido notificado al consorcio del pacifico norte mediante oficio n 325-2026/mdcnv-a la resolucion gerencial n59-2026-mdcnv-pcmch de fecha 20/08/2026, mediante la cual se aprueba la aceptacion del cambio de residente de obra (sustitucion del ing. julio nelson beltran balta) dejo constancia de lo siguiente:habiendo efectuado el recorrido de verificacion en campo juntamente con la supervision, se constata el siguei...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

OBRAS PRELIMINARES: 1. De acuerdo a la normativa de obras públicas en el Perú, la presencia del residente de obra en la ejecución del proyecto es de carácter permanente y obligatorio. Aquellas actividades o partidas que requieran dirección técnica, control de calidad o supervisión directa de seguridad no pueden ejecutarse hasta que el nuevo residente esté legalmente habilitado o autorizado de forma provisional.2. Se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...constancia que mediante oficio n 325-2026/mdcnv-a , la entidad ha notificado al consorcio del pacifico norte la resolucion gerencial n59 2026mdcnv-pcmch, mediante la cual se aprueba la aceptacion del cambio de residente de obra, formalizando la sustitucion solicitada por causal de fuerza mayor (motivos de salud), conforme al articulo 189.3 del reglamento de la ley n 32069. dicha notificacion ha sido puesta en conoci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
