


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: ¿creación del servicio de protección y control de inundaciones en la margen izquierda y derecha del rio luricocha, en las localidades de cedrohuerta y luricocha, distrito de luricocha - provincia de huanta - departamento de ayacucho¿ con CUI N° 2448645.

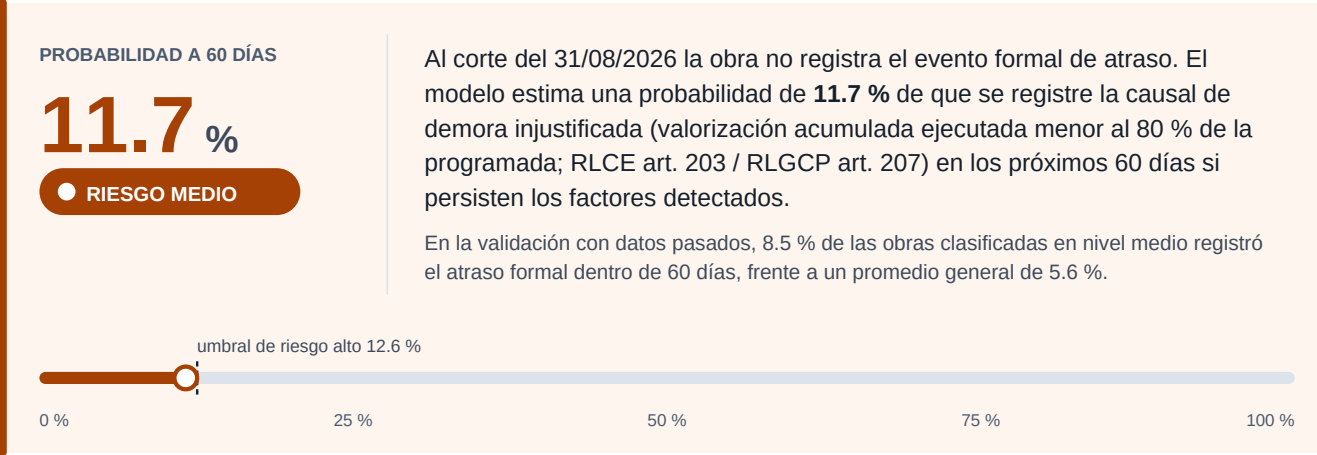


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	50 desde 01/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO LURICOCHA, EN LAS LOCALIDADES DE CEDROHUERTA Y LURICOCHA, DISTRITO DE LURICOCHA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿ CON CUI N° 2448645.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA
Contratista	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LURICOCHA / HUANTA / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	2448645
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO LURICOCHA, EN LAS LOCALIDADES DE CEDROHUERTA Y LURICOCHA, DISTRITO DE LURICOCHA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Función	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Identificador del contrato (SEACE)	2406623
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,805,105.53
Cuaderno de obra digital	50 asientos entre 01/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

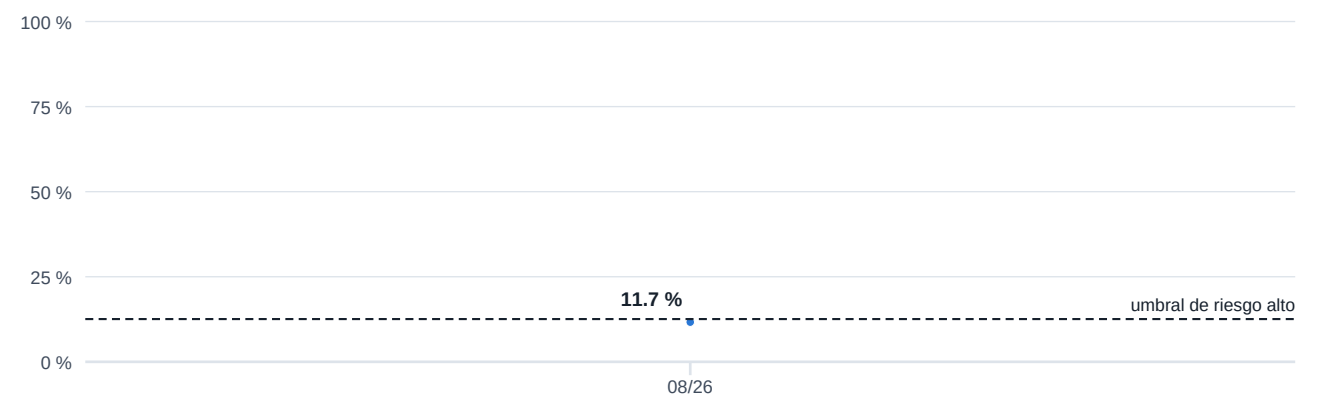

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.474
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.223
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.177
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.101
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.096
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.088
Extensión media de los asientos recientes: 1,293 caracteres	Contenido de los asientos		-0.061

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 40 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...: presentacion del ensayo de laboratorio de agregados y diseno de mezcla concreto $f_c=210\text{kg/cm}^2$ remitida por el ingeniero residente de obra y la carta no0118-2026/rodema e.i.r.l. con asunto: solicito cambio de personal clave ingeniero especialista hidraulico, remitida por el contratista, las mismas seran atendidas dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ley.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Consultas · SOEC_RESI · 12/08/2026

...tructivo, sin perjuicio de continuar con las demas actividades no afectadas.4. al encontrarse esta partida en la ruta critica del cronograma, se solicita pronunciamiento a la brevedad para no generar demoras en el vaciado de zapatas.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA: Hoy se tuvo reunión con representantes del Ministerio de Cultura, sobre excavaciones cercanas al puente de origen colonial existente al finalizar la obra aguas abajo, quedando acta de inspección firmada por la ejecución y supervisión de obra. Se analizó el asiento N°19 en la que el Contratista ejecutor, comunica trabajos de excavación entre las progresivas 0+200 a 0+235, se le comunica al Residen...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Consultas · SOEC_SPV · 06/08/2026

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: Se ha tomado conocimiento de las consultas efectuadas por el Residente de Obra y se puede mencionar lo siguiente: con respecto a la consulta del asiento N° 10 se procederá a realizar las coordinaciones con la entidad para definir los botaderos y se procederá a notificar al Residente via documento de lo coordinado dentro de los plazos de ley, con respecto al Asiento N° 11, el mismo no presenta ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Consultas · SOEC_RESI · 06/08/2026

... n 32069. se consulta: que cota de cimentacion definitiva dispondra la supervision para cada tramo y progresiva observada? se solicita pronunciamiento en el plazo de ley, dejandose constancia de que la demora podria afectar la ruta critica del programa de ejecucion vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Consultas · SOEC_RESI · 06/08/2026

...rtida de eliminacion de material excedente, pudiendo generar mayores costos de transporte no atribuibles al contratista. se solicita pronunciamiento en el plazo de ley, dejandose constancia de que la demora en su atencion podria afectar la ruta critica del programa de ejecucion vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 6 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN OBRA: Se procedió a verificar los trabajos de campo, se pudo constatar trabajos de topografía en replanteo de obra y limpieza y descolmatación de cauce con 01 máquina excavadora sobre orugas, a la fecha no se ha notificado de la ubicación de oficina de la Residencia de Obra, por lo que se solicita remitir la dirección de la oficina de coordinación de la Ejecutora, con la finalidad de verif...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
