


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Construcción de buzón, reparación de buzón, en el(la) emapa san martin distrito de tarapoto, provincia san martin, departamento san martin¿ ¿ CUI 2657393

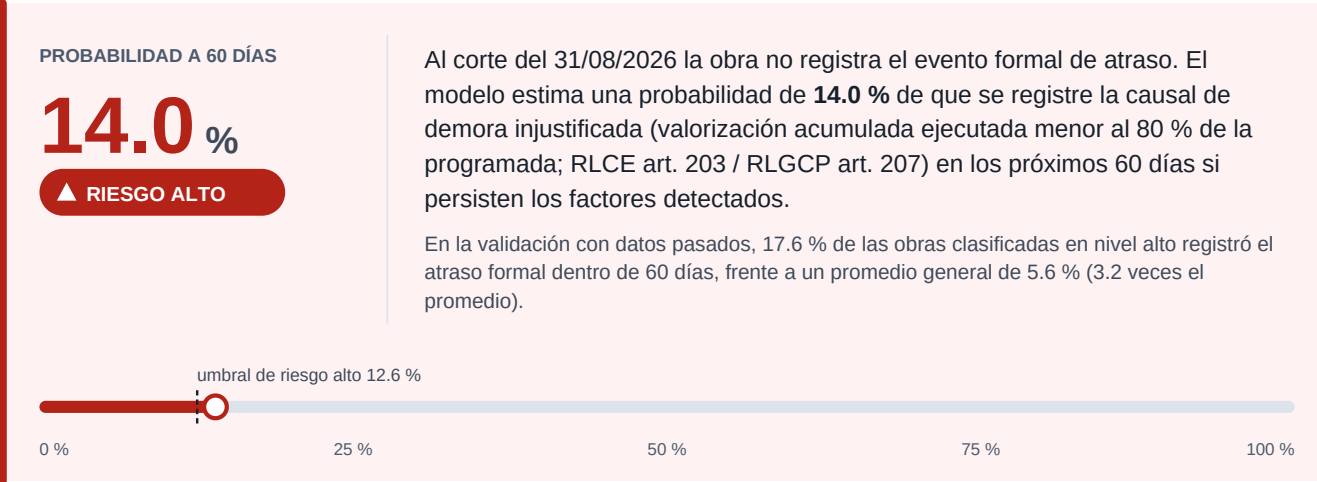


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	87 desde 17/06/2026	24/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BUZON, REPARACION DE BUZON, EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ ¿ CUI 2657393
Entidad contratante	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
Contratista	LM CECONSE E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TARAPOTO / SAN MARTIN / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2657393
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE BUZON REPARACION DE BUZON EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2401601
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 155,861.16
Cuaderno de obra digital	87 asientos entre 17/06/2026 y 24/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

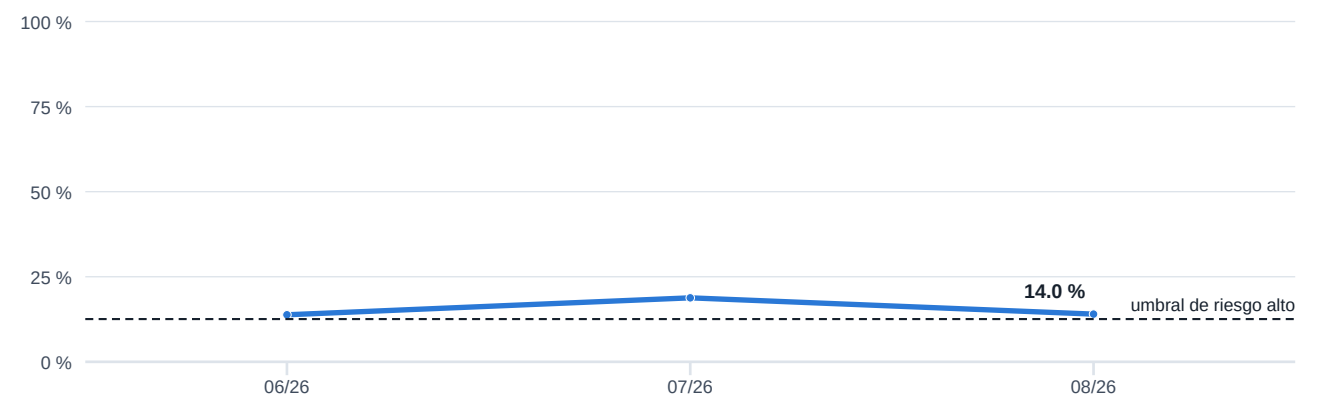

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.570
El último asiento se registró hace 7 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.263
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.219
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.162
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.152
Monto aprobado de la inversión: S/ 155,861	Características de la obra		-0.121
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.110

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	14.0 %	11.5 %	-2.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.0 %	14.0 %	-0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	14.0 %	14.2 %	+0.1 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	14.0 %	23.0 %	+9.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA N° 07.01 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN HIDROJET.: Se recuerda al Contratista ceñirse estrictamente al Programa de Ejecución de Obra vigente, en particular a la PARTIDA N° 07.01 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN HIDROJET, por formar parte de la ruta crítica, siendo su ejecución oportuna determinante para el cumplimiento del plazo contractual...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 77 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/08/2026

...orme a las condiciones reales de ejecución de la obra.en tal sentido, se solicita al contratista presentar un informe de sustento técnico y documentario que justifique las causas que han originado el atraso advertido, precisando su incidencia sobre el avance físico acumulado y, de corresponder, sobre las actividades que conforman la ruta crítica. asimismo, dicho sustento deberá permitir determinar la n...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 66 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/07/2026

REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA N° 07.01 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN HIDROJET.: Se recuerda al Contratista regirse estrictamente al Programa de Ejecución de Obra vigente, en particular respecto a la ejecución de la PARTIDA N° 07.01 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN HIDROJET, considerando que dicha actividad forma parte de la ruta crítica del cronograma vigente, por lo q...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 62 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 26/07/2026

PRESENTACIÓN DE DESCARGO Y JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: Se deja constancia que, mediante Carta N° 000306-2026-EMAPA-SM-SA-OESLO, de fecha 24/07/2026, la Entidad comunicó al Contratista LM CECONSE E.I.R.L. la necesidad de presentar la justificación debidamente sustentada y documentada respecto del retraso de catorce (14) días advertido en el cumplimiento del plazo establecid...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 62 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 26/07/2026

presentacion de descargo y justificacion del retraso en la revision del expediente tecnico de obra . se deja constancia que, mediante carta n 000306-2026-emapa-sm-sa-oeslo, de fecha 24/07/2026, la entidad comunico al contratista lm ceconse e.i.r.l. la...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 62 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 26/07/2026

... los argumentos y medios probatorios aportados y determinar, en el marco de sus competencias y conforme a las condiciones contractuales y la normativa vigente, si corresponde o no la aplicacion de la penalidad por el retraso advertido.asimismo, esta supervision deja constancia que, en cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento de la ejecucion contractual, advirtio y comunico oportunamente a la ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 55 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

...ciones contractuales, siendo de su responsabilidad implementar las medidas tecnicas y administrativas que correspondan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.finalmente, cualquier incumplimiento contractual que resulte debidamente acreditado sera puesto en conocimiento de la entidad para la evaluacion y adopcion de las medidas que correspondan, incluyendo, de ser aplicable, la determi...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 54 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

...ruidad de los materiales incorporados a la obra.asimismo, se deja constancia que la eventual utilizacion de elementos usados o de segundo uso en una partida que exige elementos nuevos constituiria un incumplimiento de las condiciones contractuales, correspondiendo al contratista garantizar que los materiales incorporados a la obra cumplan estrictamente con las especificaciones establecidas en el expedien...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 48 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026**

OTRAS ACTIVIDADES: Se deja constancia que esta Supervisión reitera y exhorta al Contratista a adoptar de manera inmediata todas las acciones técnicas, administrativas, logísticas y de coordinación que resulten necesarias para la ejecución de la PARTIDA N° 07.01 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN HIDROJET, considerando que dicha actividad forma parte de la ruta crítica del cronograma vigente y su ejecución incide di...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/07/2026**

...nte las consultas tecnicas, administrativas y de coordinacion que resulten necesarias para la adecuada ejecucion de la obra, evitando que estas sean formuladas de manera extemporanea y puedan generar retrasos en el desarrollo de los trabajos o afectar el cumplimiento del plazo contractual.asimismo, respecto de la partida n 07.01 mantenimiento preventivo de camion hidrojet, se insta al contratista a real...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 41 · Consultas · SOEC_SPV · 08/07/2026**

...pronunciamiento correspondiente, el contratista debera continuar con la ejecucion de las demas partidas que no se vean afectadas por la presente consulta, adoptando las medidas necesarias para evitar retrasos en el avance de la obra y afectaciones al plazo contractual.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/07/2026**

justificacion de ausencia del residente de obra . sirva el presente asiento para dar respuesta al asiento n21 de la supervision, dejando constancia que esta residencia de obra, con fecha 30/06/2026, mediante carta n020-2026-Imceconse-Ilm, ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
