


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Puesto de control chontachaca de la atffs cusco distrito de kosñipata

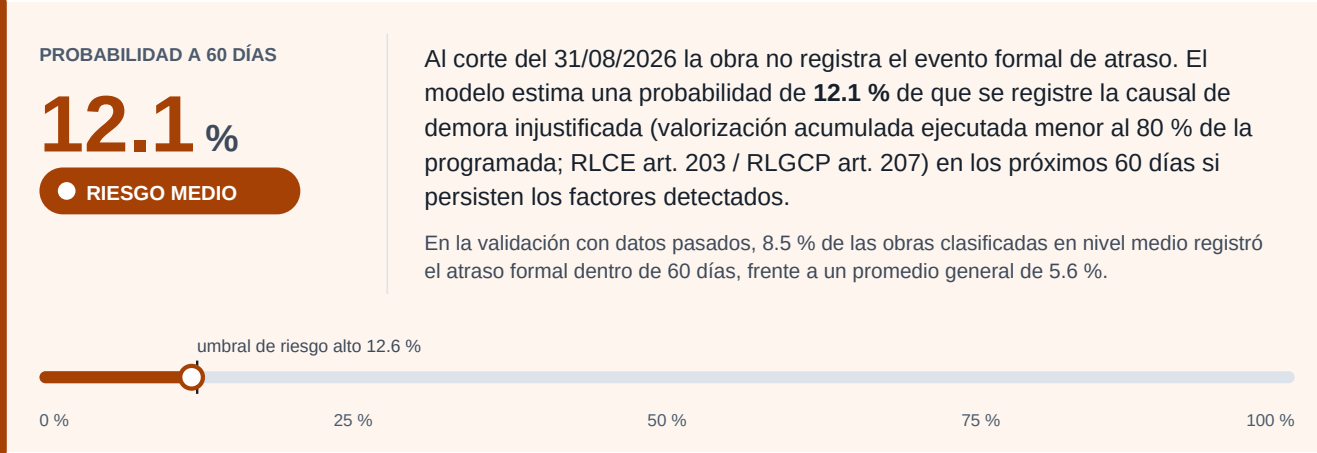


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	69 desde 19/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	PUESTO DE CONTROL CHONTACHACA DE LA ATFFS CUSCO DISTRITO DE KOSÑIPATA
Entidad contratante	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
Contratista	CONSORCIO SAN JUAN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	KOSÑIPATA / PAUCARTAMBO / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2362550
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	69 asientos entre 19/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

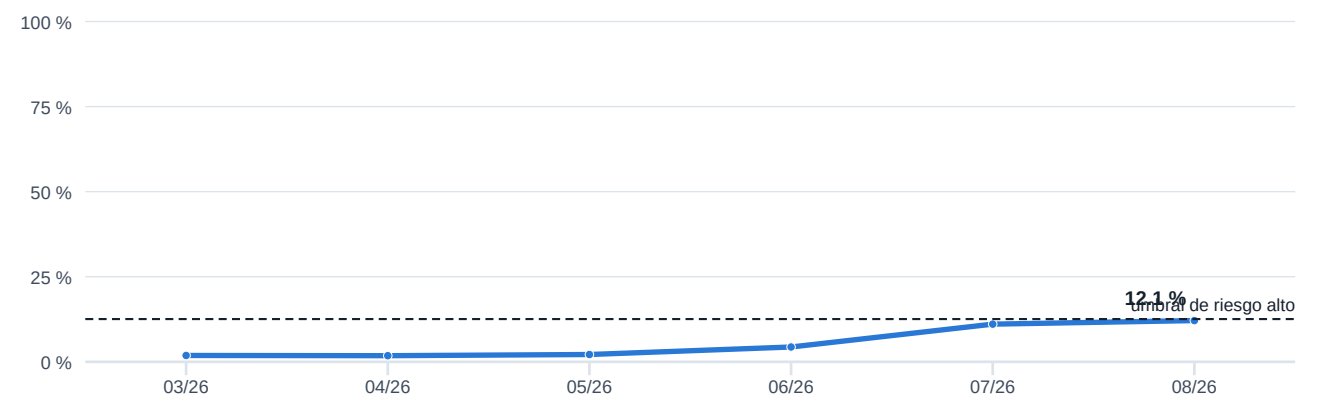

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.521
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.209
El 22 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.156
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.111
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.093
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.088
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.078
Departamento: Cusco	Características de la obra		-0.053

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.1 %	12.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 63 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 24/08/2026

aprobacion de cambio de especialista de costos y presupuesto de supervision . mediante carta n d000366-2026-midagri-serfor-gg-oga, de fecha 21/08/2026, la entidad aprobo el cambio del profesional designado como especialista en costos y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 60 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

atrasos por consecuencias de lluvias . se inicio la jornada con la charla obligatoria de sst para el personal obrero y tecnico. seguidamente, se verifico la inundacion de excavaciones por lluvias nocturnas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 57 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

...idades en la mañana del día 14/08/2026, por lluvias torrenciales en la zona, reiniciando actividades aproximadamente a las 11:30 am.se han presentado fuertes lluvias en la zona, lo que esta generando retraso en la ejecucion de las actividades de la obra

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 55 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 13/08/2026

...a formalmente a la supervision en campo. finalmente, se registra como incidencia climatica que hoy, desde las 7:16 pm, continuaron las lluvias en la zona de la obra, evento meteorologico que generara retrasos en las partidas pendientes de excavaciones y vaciados de concreto debido a las condiciones desfavorables del terreno.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 12/08/2026

cambio de especialista de ambiente de la supervision . mediante carta n d000335-2026-midagri-serfor-gg-oga, de fecha 04/08/2026, la entidad aprueba el cambio de profesional designado como especialista de estudios ambiental...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

... se viene realizando la evacuacion del agua acumulada mediante el uso de una motobomba, dejandose constancia de que estas condiciones climaticas adversas y sus consecuencias directas vienen generando retrasos en el avance programado de la obra. por otro lado, el día de hoy se ejecuto el vaciado de concreto en las zapatas del modulo c, procediendose en paralelo con la toma de muestras de concreto para lo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Adelantos · SOEC_SPV · 31/07/2026

SOLICITUD DE ADELANTO POR MATERIALES: Mediante carta n° 0048 - CONSORCIO SAN JUAN, de fecha 29/07/2026, la contratista presenta a la supervisión la solicitud de aprobación del calendario de adquisición de materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, para la solicitud del adelanto del 20% por materiales.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 23 · Consultas · SOEC_RESI · 27/07/2026

CONSULTA 01-REPLANTEO DE UBICACIÓN: CONSULTA 01: Consulta sobre reubicación del puesto de control a 3.00 metros del canal existente por seguridad estructural.Por medio de la presente, en mi calidad de Residente de Obra, me dirijo a usted con la finalidad de formular una consulta técnica de carácter urgente orientada a mitigar los riesgos estructurales identificados en la zona de emplazamiento del puesto de control.Co...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 25 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 27/07/2026

REVISION DE CRONOGRAMA DE OBRA DE LA CONTRATISTA: Mediante carta n° 001-2026/SO/JLPC/SAGITARIO, de fecha 27/07/2026, se le indica a la contratista que el cronograma de obra presentado debe ser corregido, por cuanto en el mismo no se observa la ruta critica

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
