

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la Ejecución de Obra: SALDO DE OBRA DEL ¿PROYECTO ACARÍ ¿ BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO¿ Fa-se 01

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

16.8 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **16.8 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 191,209,512.04	610 días	1,634 desde 23/05/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Contratación de la Ejecución de Obra: SALDO DE OBRA DEL ¿PROYECTO ACARÍ ¿ BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO¿ Fa-se 01
Entidad contratante	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Contratista	CONSORCIO HIDRAULICO LOROS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ACARI / CARAVELI / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2151332
Inversión asociada	PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO
Función	AGRARIA
Identificador del contrato (SEACE)	2319760
Monto del contrato	S/ 191,209,512.04
Monto aprobado de la inversión	S/ 72,228,624.00
Cuaderno de obra digital	1634 asientos entre 23/05/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

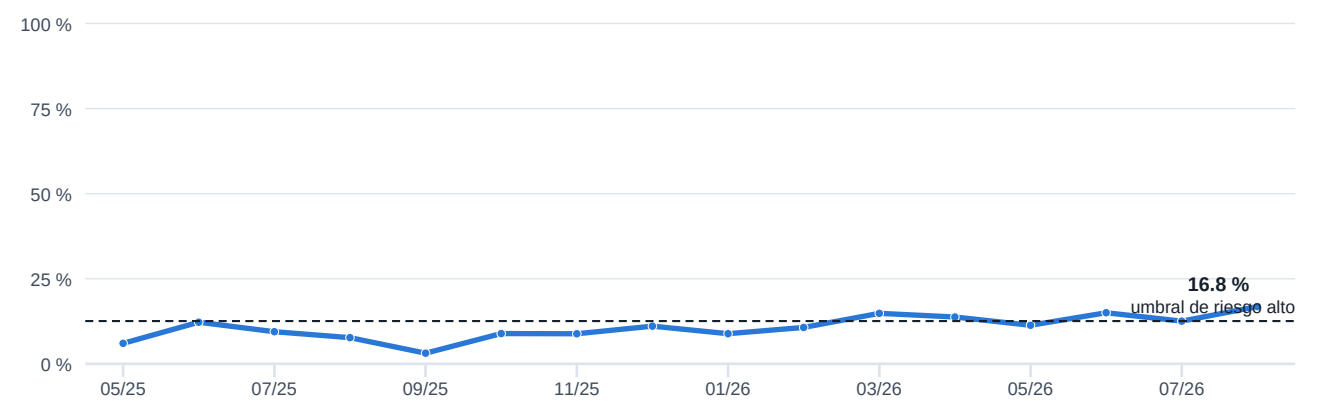

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (16 cortes, del 31/05/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.583
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.202
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.160
24 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.143
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.136
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
Monto aprobado de la inversión: S/ 72,228,624	Características de la obra		-0.103
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.093

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	16.8 %	16.4 %	-0.4 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	16.8 %	16.6 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1613 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

... totalidad de las partidas de instrumentacion habilitadas sin variacion de cantidad, incluidas las celdas de asentamiento con el sensor de cuerda vibrante aceptado por equivalencia tecnica, siendo la demora en su inicio de exclusiva responsabilidad del contratista.se comunica para conocimiento y fines pertinentes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1612 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...opio plazo contractual.6. subsisten las obligaciones del cei: mantener las partidas sin variacion de cantidad (asiento n1293), absolver los seis elementos y no tratar ambas materias como una sola. la demora es de exclusiva responsabilidad del contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1598 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...evaluadas y compensadas (109 d.c. - asiento n1282).se deja constancia que, entregada la totalidad de planos el 17.07.26 (carta n244 / asiento n1421) y reconocido ello por el cei (asiento n1425), todo atraso en el inicio de la bocatoma posterior al 17/18.07.26 no es atribuible a la entidad, supervision ni expediente tecnico. la cantera pampahuasi no condiciona el inicio de trazo, replanteo y excavacion....

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1565 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

reiteracion de incumplimiento del cei por ausencia de vigia en el acceso ce-12 y falta de medico ocupacional en obra - aplicacion de sancion de comprobarse el incumplimiento . se deja constancia de la recepcion de la carta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1564 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...ntal del segundo semestre 2026 (calidad de aire, ruido ambiental y componente biologico), ni ha presentado el plan detallado exigido con 15 días de anticipacion conforme al d.s. n010-2019-minam.dicho incumplimiento contraviene los compromisos ambientales del instrumento de gestion ambiental (its/eia) aprobado y la normativa vigente (d.s. n003-2017-minam y d.s. n085-2003-pcm), pudiendo generar responsabil...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1545 · Consultas · SOEC_RESI · 12/08/2026

ESTADO SITUACIONAL DE LA CONSULTA 34 CONSULTA SOBRE EL SISTEMA DE DESCARGA DE LA PRESA IRURO: Al respecto, corresponde señalar que los numerales 193.7 y 193.8 del Reglamento de la Contrataciones del Estado establecen expresamente lo siguiente 193.7. La Entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector o supervisor, en un plazo máximo de dos (2) días, contados desde e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1539 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/08/2026

...on no autoriza intervenir el derecho de via ni habilita operar por el acceso ce-12, conforme el propio plan condiciona su aplicacion a las autorizaciones escritas del mtc y/o survial.no se levanta el apercibimiento del asiento n1520. el propio informe sara reconoce que los controles del 18.07.26 fueron observados por survial como invasion del derecho de via y retirados, por lo que el acceso ha operado si...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1527 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

... la supervision mantiene plena disposicion para revisar, dar conformidad y tramitar oportunamente ante la entidad el reconocimiento economico correspondiente, una vez recibido el sustento, y que toda demora en su presentacion es de exclusiva responsabilidad del contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1520 · Órdenes · SOEC_SPV · 05/08/2026 APERCIBIMIENTO AL CEI POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL DISPUESTAS EN EL ASIENTO N°1500 DE FECHA 02/08/2026, EN EL INGRESO AL CAMINO DE ACCESO CE-12, POR CONFIGURARSE CONDICIÓN DE ALTO RIESGO DE ACCIDENTES FATALES.: LA SUPERVISIÓN, EN RESGUARDO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE TERCEROS, DEJA CONSTANCIA QUE, PESE A LO ORDENADO EN EL ASIENTO N° 1500 DE FECHA 02/08/2026, EL CONTRATISTA (CEI) ... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1520 · Órdenes · SOEC_SPV · 05/08/2026 apercibimiento al cei por incumplimiento de las medidas de seguridad vial dispuestas en el asiento n1500 de fecha 02/08/2026, en el ingreso al camino de acceso ce-12, por configurarse condicion de alto riesg... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1500 · Órdenes · SOEC_SPV · 02/08/2026 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL INGRESO AL CAMINO DE ACCESO CE-12 SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA (TRAMO LUCANAS – PUQUIO) POR CONFIGURARSE EN CURVA CIEGA DE ALTO RIESGO DE ACCIDENTES.: LA SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DE SUS FACULTADES Y EN RESGUARDO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD DE TERCEROS, DEJA CONSTANCIA QUE EL INGRESO AL CAMINO DE ACCESO CE-12 SE EFECTÚA DESDE LA CARRETERA... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1489 · Órdenes · SOEC_SPV · 31/07/2026 REMITE LA CARTA N°261-BBH-JS-CSI-2026 - REQUERIMIENTO DE INICIO EFECTIVO DEL FRENTE BOCATOMA IRURO Y CONSTANCIA DE CIERRE DEFINITIVO DE LA CONSULTA N°23: EN ATENCIÓN AL ESTADO DEL FRENTE BOCATOMA IRURO, ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA Y REQUIERE AL CEI LO SIGUIENTE:1° POR CARTA N°244-BBH-JS-CSI-2026 (ASIENTO N°1421, 17.07.26) SE REMITIÓ AL CEI LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA BOCATOMA IRURO (PLANOS BS-01, BT-01 AL BT-... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
