


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra: Mejoramiento del servicio de atencion de salud basicos en pfaco distrito de coyllurqui de la provincia de cotabambas del departamento de apurimac- CUI 2660129

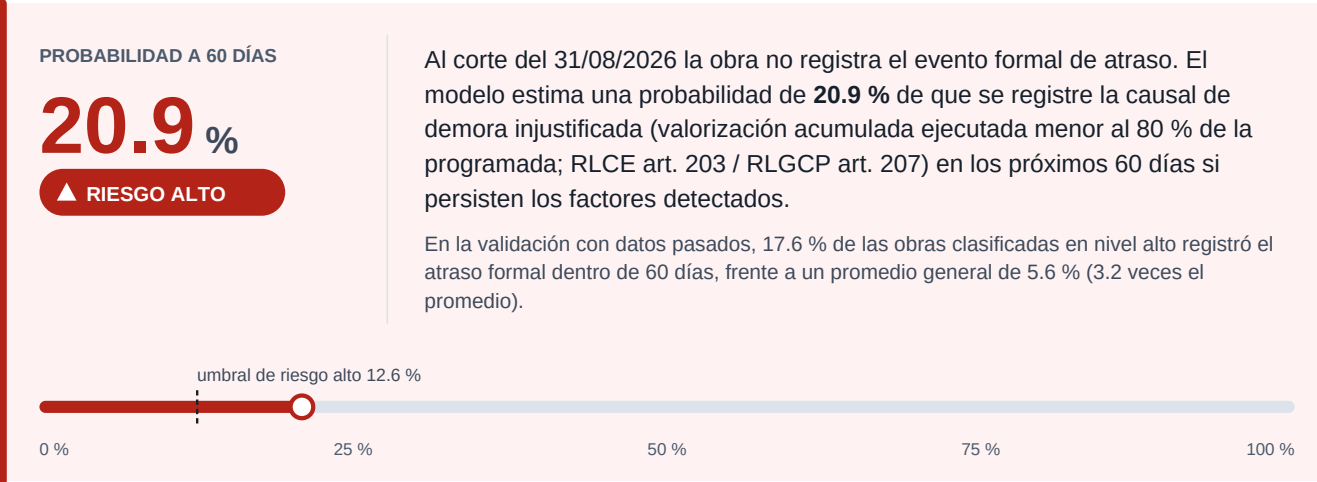


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	150 desde 01/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	contratacion de ejecucion de obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PFACO DISTRITO DE COYLLURQUI DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC- CUI 2660129
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI
Contratista	CONSORCIO SALUD HSRP II
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	COYLLURQUI / COTABAMBAS / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	2660129
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PFACO DISTRITO DE COYLLURQUI DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2385659
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,755,350.57
Cuaderno de obra digital	150 asientos entre 01/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

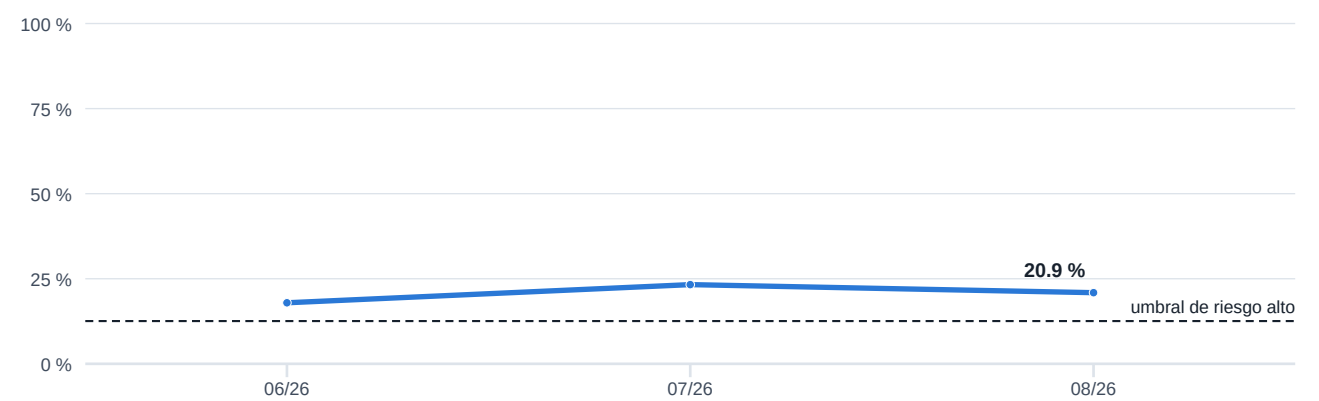

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.730
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.183
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.179
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.141
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
8 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 1,886,840	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.099
Departamento: Apurímac	Características de la obra		-0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	20.9 %	20.7 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	20.9 %	20.9 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	20.9 %	20.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 149 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...nica" del proyecto, sugerimos respetuosamente que sea el propio especialista en estructuras de la supervision quien formalice y sustente tecnicamente sus preocupaciones respecto a la vulnerabilidad o incumplimiento de la norma e.030 del diseno original. de considerarlo necesario para la seguridad de la obra, dicho profesional debe emitir el informe tecnico debidamente firmado que sustente la necesidad de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 141 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 26/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA ASIENTO 138 DEL RESIDENTE: CON RESPECTO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL RESIDENTE ASIENTO 138 "CONSULTA TÉCNICA FORMAL PARA CORROBORACIÓN O RECTIFICACIÓN DE INGENIERÍA POR EL PROYECTISTA (BLOQUE 05 - TANQUE CISTERNA Y ELEVADO) Y ADVERTENCIA DE IMPACTO EN LA RUTA CRÍTICA POR TRABAJOS DE CAMPO EN ESPERA" SE LE INDICA QUE PARA ABSOLVER ESTA CONSULTA, DEBE PRESENTAR EL INFORME TECNICO DEL CONTRATISTA ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 126 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 07/08/2026

RESPUESTA A ASIENTO NRO. 125: DEL RESIDENTE: Visto el asiento Nro. 125: DEL RESIDENTE, referido a la consulta sobre resistencias de concreto en columnas y vigas del sistema Cisterna – Tanque Elevado, y el informe técnico Nro. 005-2026-ARQUEDAV-RO, se indica al residente de obra, que el informe presentado debe contar con opinión técnica del especialista en estructuras del contratista, según lo establecido en los roles...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 125 · Consultas · SOEC_RESI · 04/08/2026

...e acero, conforman un unico bloque monolitico que integran envolventes humedas. esta situacion vulnera el art. 5.10.2 de la norma e.060 del me, que exige vaciado continuo para evitar juntas frias, e incumple los requisitos de durabilidad del capitulo 4 y el codigo aci 350 para estructuras en contacto con liquidos, que exigen una resistencia minima de 280 kg/cm2. asimismo, la transmision de cargas desde ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 115 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 24/07/2026

IDENTIFICACION DE RIESGO R-5: MEDIANTE EL PRESENTE SE ADVIERTE EL RIESGO R-5.- EN CONSIDERACION QUE DENTRO DEL AREA DE TRABAJO SE EJECUTA TRASLADO DE MATERIALES AGREGADOS CON MAQUINARIA, LIBERACION DE AREA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y ÁREA DE HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL. SE LE INDICA QUE ESTOS TRABAJOS SIMULTANEOS SE PRESENTAN COMO RIESGO POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO. POR LO QUE DEBE DELIMITARSE LAS...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 97 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/07/2026

... pladicop. de esta forma el adicional recien surte todos sus efectos siendo uno de ellos el poder ejecutar la partida en mencion. por ello, se da por iniciada la causal de ampliacion de plazo n02 por atrasos no atribuibles al contratista.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
