


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento del servicio de la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima" - Primera Etapa - CUI N° 2355382

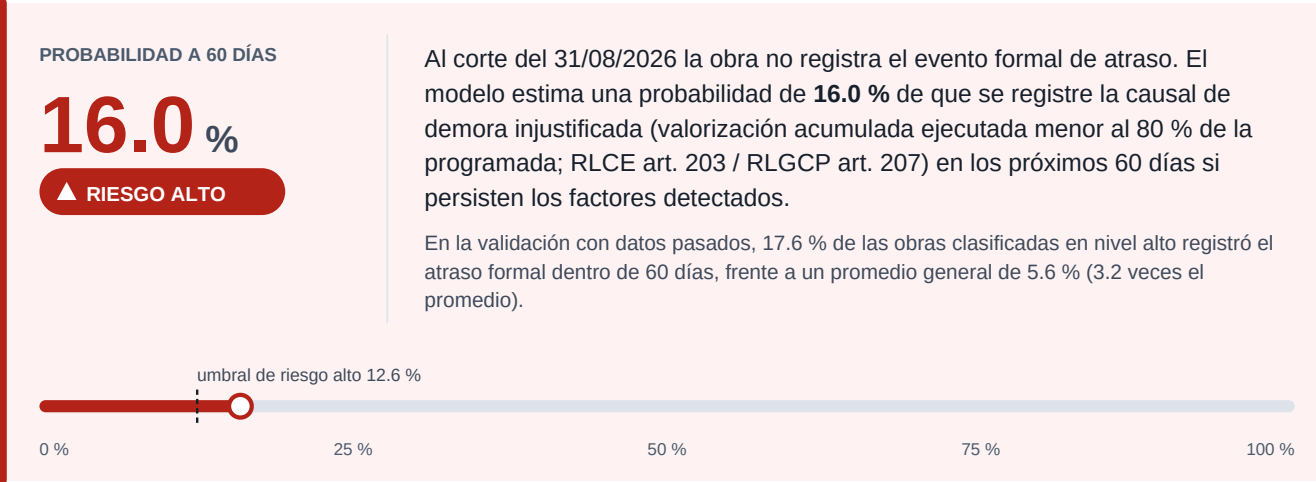


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 16,105,898.61	240 días	524 desde 06/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento del servicio de la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima" - Primera Etapa - CUI N° 2355382
Entidad contratante	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contratista	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LIMA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2355382
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2338330
Monto del contrato	S/ 16,105,898.61
Monto aprobado de la inversión	S/ 172,460,144.00
Cuaderno de obra digital	524 asientos entre 06/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

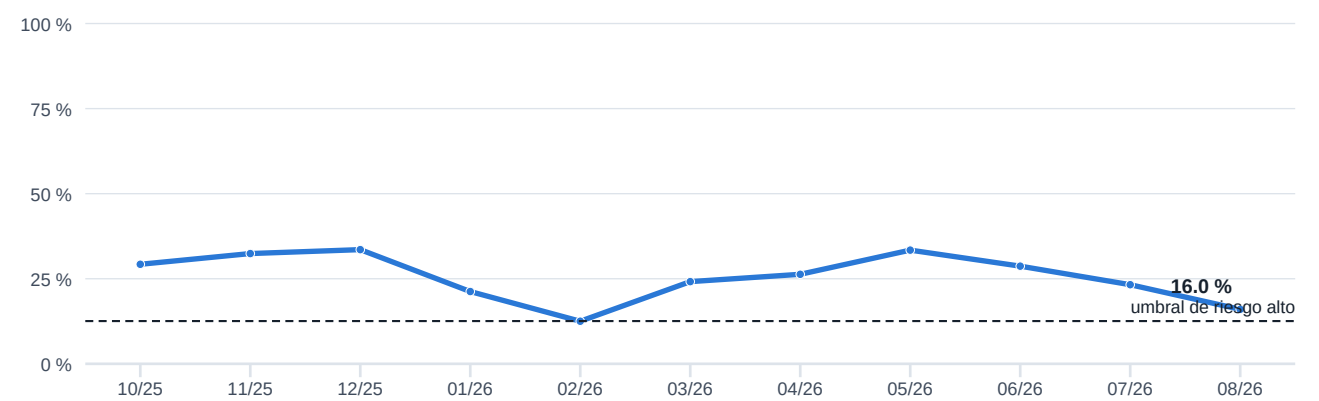

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.705
El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.258
El 57 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.132
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 4,373,603	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.123
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.109
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.107
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.094

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	16.0 %	16.0 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	16.0 %	16.3 %	+0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	16.0 %	16.6 %	+0.6 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 508 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 26/08/2026

...rendimiento del personal operativo para cumplir con la ejecución de las partidas programadas . - se ha realizado el estado situacional de cada especialidad y en arquitectura, que es la que lleva mayor retraso, tenemos que el avance ejecutado se puede determinar al mes de julio 2026, que se ha ejecutado el 47.821% del total de actividades de arquitectura en la obra- se determina que existe un atraso en la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 503 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/08/2026

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 141 - COM- 17082026 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA (COMUNICACIONES): - Se notifica la ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 141 - COM- 17082026 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA (COMUNICACIONES), al contratista indicando que la Entidad ha notificado la Carta (OIN) N° 0-4-A/4464, señalandoEn atención a la Consulta de Obra N.º 141, el Coordinador de Proyectos, Ing. Llianci Glenis Vela Coronado, ha info...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 504 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/08/2026

SE ABSUELVE LA CONSULTA 142-COM-17082026 SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO - COMUNICACIONES: - Se notifica la ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 142 - 142-COM-17082026 SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO - COMUNICACIONES, al contratista indicando que la Entidad ha notificado la Carta (OIN) N° 0-4-A/4465, señalandoEn atención a la Consulta de Obra N.º 142, el Coordinador de Proyectos, Ing. Llianci Glenis Vela Coronado, ha informado ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 496 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

...l seguro de responsabilidad civil frente a terceros, al tratarse de un monto menor no cubierto por las pólizas.por lo expuesto, se anota este hecho como evento que perjudica el avance de obra, genera retrasos en la programación y ocasiona sobrecostos económicos al contratista, a fin de que sea considerado por la supervisión y la entidad para las acciones correspondientes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 487 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 17/08/2026

...bra, y se ha analizado lo siguiente:- programa de ejecución de obra: se viene desarrollando de acuerdo a las actividades programadas y se debe incrementar los rendimientos del personal al encontrarse atrasada, la obra hasta hoy se encuentra dentro del plazo de ejecución de obra programado- aspectos técnicos: se viene respetando lo indicado en el expediente técnico, y las indicaciones del proyectista, s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 485 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 11/08/2026

...directo acumulado s/1 570,755.92 soles, quedando un saldo por valorizar de s/1 713,914.44 soles del costo directo. la ejecución de la especialidad arquitectura es 47.821%.- se determina que existe un atraso en la ejecución de la obra, debido a que existen partidas que no se han ejecutado, partidas que no pueden ser culminadas y partidas que no pueden ser iniciadas en su ejecución, debido a las descoord...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 481 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/07/2026

SE CONCILIA METRADOS DE VALORIZACIÓN DE OBRA - MES DE JULIO 2026: - Se realiza la verificación en campo de los metrados ejecutados por el contratista, juntamente con la supervisión, de las diferentes especialidades: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de comunicaciones, Instalaciones Mecánicas y Obras provisionales.- Se concilia los metrados en función de los m...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
