


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Construcción de cobertura de instalaciones deportivas, ambiente de recreación activa, losa deportiva y campo deportivo, además de otros activos en el(la) parque iii del pueblo joven alto libertad zona a MZ. 48, LT. 2 sector 77 distrito de cerro colorado, provincia arequipa, departamento arequipa, CUI: 2690508.

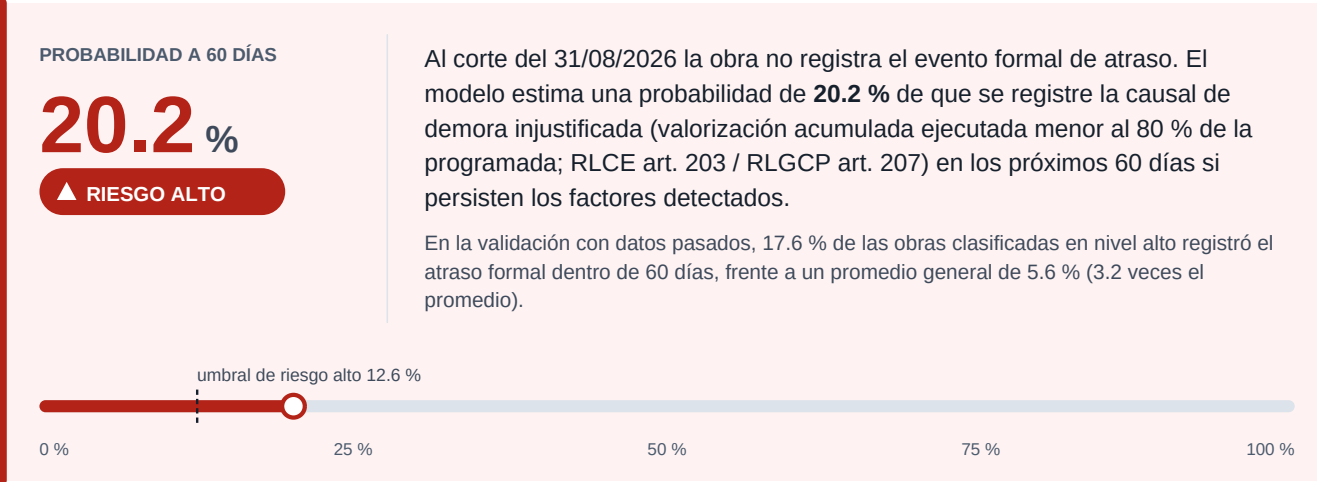

|                    |                |                        |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO  | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 77<br>desde 11/07/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA, LOSA DEPORTIVA Y CAMPO DEPORTIVO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE III DEL PUEBLO JOVEN ALTO LIBERTAD ZONA A MZ. 48, LT. 2 SECTOR 77 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CUI: 2690508. |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contratista                                     | CONSORCIO FYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2690508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inversión asociada                              | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, LOSA DEPORTIVA Y CAMPO DEPORTIVO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE III DEL PUEBLO JOVEN ALTO LIBERTAD ZONA A MZ. 48 LT. 2 SECTOR 77 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                  |
| Función                                         | CULTURA Y DEPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2402084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 1,387,255.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuaderno de obra digital                        | 77 asientos entre 11/07/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                 | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)      | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.571 |
| El 61 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección   | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.321 |
| El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.212 |
| Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.116 |
| Departamento: Arequipa                                                                          | Características de la obra     | <div></div>    | +0.116 |
| Extensión media de los asientos recientes: 515 caracteres                                       | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.091 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.090 |
| Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | -0.067 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes | 20.2 % | 20.0 %    | -0.2 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 74 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 28/08/2026

... riesgos de obra de acuerdo al avance de ejecución por parte del contratista- a la fecha, se tiene riesgo de avance de obra, la empresa contratista ha incrementado su ritmo de trabajo y no cuenta con retrasos en su ruta crítica. sin embargo, tiene deficiencias con el ritmo de avance de sus subcontratistas, se tienen frentes de trabajo que a la fecha no son ejecutados. dichas deficiencias pueden impedir ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 64 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 21/08/2026

...n diseno02.03.03.01.02 correas metalicas de tubo lac a500 50x50x2.0 mm.03.01.01 movimiento de tierras zona area recreativa y exteriores (todas las partidas)no ejecutar dichas partidas puede conllevar demoras en la culminacion de la ejecucion del proyecto.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 58 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 18/08/2026

...ural. de acuerdo al cronograma de obra presentado por la empresa contratista y aprobado por la entidad, a la fecha no se esta cumpliendo con la ejecución de las siguientes partidas las cuales generan atraso en ejecución- 02.03.03.01.01 estructura metalica para techo ligero de graderio tipo volado, segun diseno- 02.03.02.02 concreto f'c=175 kg/cm2 en losa piso, piso pulido de cemento- 03.01.01.05 extend...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 53 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 14/08/2026

...uerdo al avance de ejecución por parte del contratista. - avance al 13 de agosto: 1.89% mensual de agosto, comparado con el avance programado a corte del día 13 de agosto: 12.35%. se tiene riesgo de atraso en la ejecución de la obra.- retraso en ejecución acumulado total al 13 de agosto de 2026. acumulado ejecutado: avance del 10.60%, avance acumulado programado del 22.81%. se tiene un retraso total d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 10/08/2026

ACTIVIDADES DIARIAS: Se verifican trabajos de excavación de zanjas para sardineles, campo deportivo. Se verifican inicios de trabajo de encofrado de columnas. Se indica a la residencia verificar las especificaciones técnicas y revisar el acabado de columnas. Se indica a la empresa contratista que existen otros frentes de trabajo, como cerco exterior y áreas de juegos que a la fecha no se intervienen. Acelerar los tr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 20/07/2026

AVANCE DE OBRA: Se tiene actividad en obra en la ejecución de los siguientes trabajos:Demolicion de columnas y dados de concretoInstalacion de ambientes prefabricadosSe recibio la visita del coordinador de obra el dia viernes 17 de julio a las 15:00 horas, en la cual se verifico los trabajos a la fecha y se coordino la documentacion pendiente.El dia viernes 17 de julio se hace la entrega del cronograma de obra actual...

Fuente: cod-asientos202607.csv

### Asiento N.º 4 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 14/07/2026

ACTIVIDADES DIARIAS: Se continúa con trabajos de movilización de equipos, limpieza de obra, desmontaje y traslado de estructuras metálicas. Se solicita a la residencia la presentación de los siguientes documentos- Póliza CAR- Cronograma de obra actualizado, calendario de avance valorizado, calendario de adquisición de materiales- Plan de Trabajo- Plan de Calidad- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- Plan de Medio A...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
