


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios comerciales del mercado modelo de la ciudad de calca, distrito y, provincia de calca cusco CUI N° 2300260.

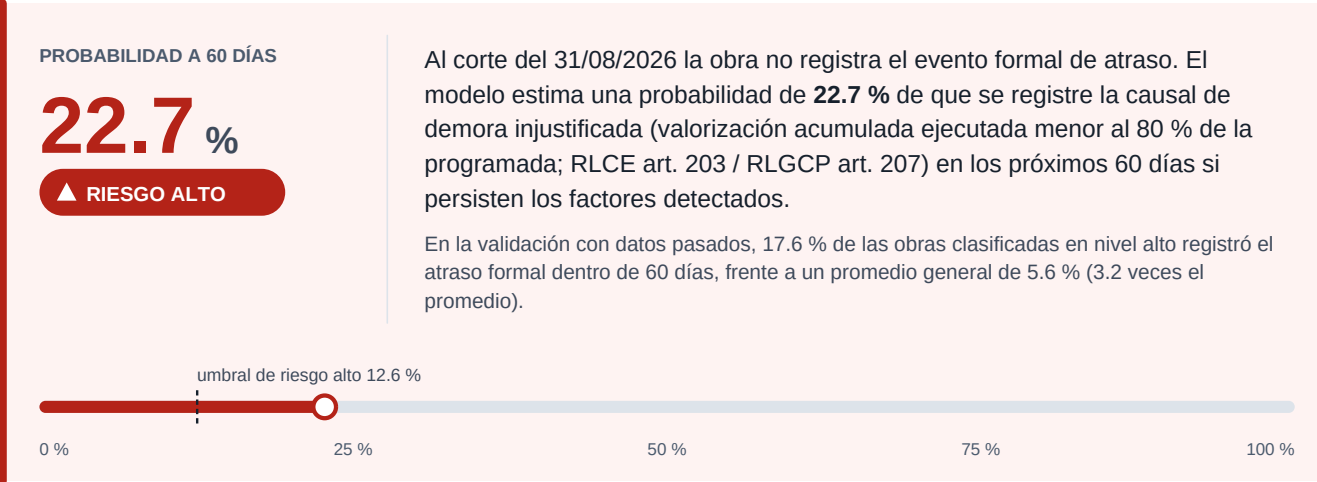


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	21 desde 07/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CALCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE CALCA CUSCO CUI N° 2300260.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Contratista	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CALCA / CALCA / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2300260
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CALCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
Función	COMERCIO
Identificador del contrato (SEACE)	2407070
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 27,454,895.00
Cuaderno de obra digital	21 asientos entre 07/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

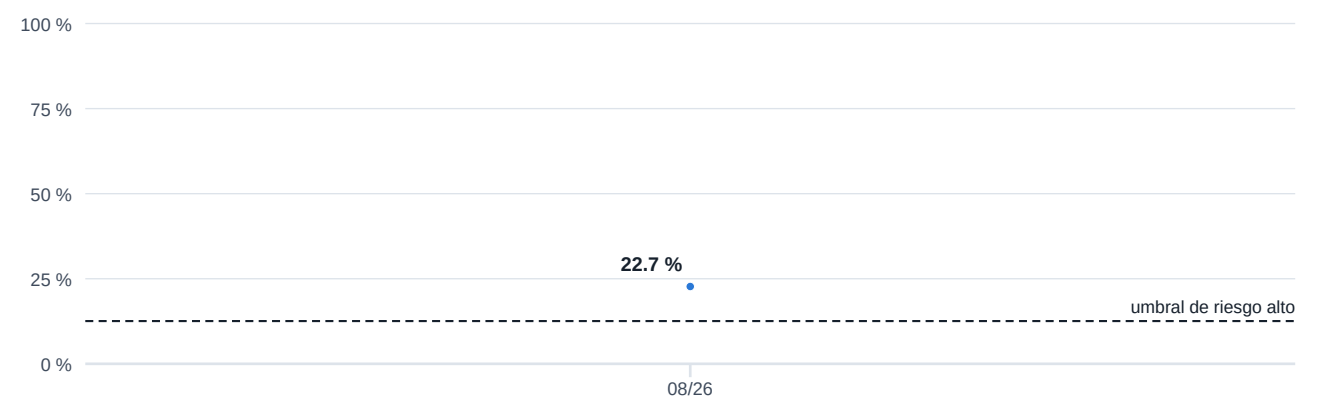

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.676
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.206
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.145
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.117
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
4 asientos de calendario de avance valorizado en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.090
El 52 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.085

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	22.7 %	20.4 %	-2.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	22.7 %	22.7 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	22.7 %	22.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 21 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 31/08/2026

OBSERVACIÓN AL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: De la revisión del Calendario de Adquisición de Materiales presentado, se advierte que el mismo se encuentra OBSERVADO, por las siguientes causales técnicas y normativas: 1. NO CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE APROBADO Conforme al Reglamento de la Ley N° 32069 y al Numeral 67 de las Bases Integr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 31/08/2026

...e: cuadro de precedencias de adquisicion, montos parciales valorizados, ni fecha de ingreso a almacen de obra, lo cual impide el control de abastecimiento oportuno y puede generar desabastecimiento y atraso injustificado pasible de penalidad por lo expuesto, conforme al numeral 52 literal a) de las bases integradas, se observa el calendario de adquisicion de materiales y se otorga plazo de 72 horas cale...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...aclarando que estas requieren de la disposicion de recursos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas), alterando lo indicado en la programacion de obra aprobado, esto podria generar posibles retrasos durante la ejecucion de los trabajos en obra.- asi mismo se toma conocimiento de lo indicado por el inspector de obra, para lo cual se hara llegar la documentacion solicitada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 31/08/2026

...uision, montos parciales valorizados, ni fecha de ingreso a almacen de obra, lo cual impide el control de abastecimiento oportuno y puede generar desabastecimiento y atraso injustificado pasible de penalidad por lo expuesto, conforme al numeral 52 literal a) de las bases integradas, se observa el calendario de adquisicion de materiales y se otorga plazo de 72 horas calendario para su subsanacion, debiendo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 19/08/2026

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES: En relación con el Asiento N° 09 del cuaderno de obra (14/08/2026), mediante el cual se otorgó un plazo de 48 horas para la subsanación de observaciones al Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV), al Asiento N° 11 (14/08/2026), el cual contenía archivos digitales dañados e inaccesibles, vulnerando lo estipulado en el Numeral 67 de las...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 19/08/2026

...teriores al inicio de obra. sancion: 1.50 uit por ocurrencia. o penalidad n 06: por extemporaneidad en la subsanacion de observaciones dentro del plazo otorgado. sancion: multa diaria por cada día de retraso a partir del vencimiento del plazo. o penalidad n 17: por entrega de informacion incompleta, con errores o fuera de plazo, aplicable a los archivos corruptos presentados en el asiento n 11 que impid...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 19/08/2026

notificacion de incumplimiento y procedimiento de aplicacion de penalidades . en relacion con el asiento n 09 del cuaderno de obra (14/08/2026), mediante el cual se otorgo un plazo de 48 horas para la subsanacion de observa...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Órdenes · SOEC_INSP · 14/08/2026

REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALIZADO: En relación con lo dispuesto en el Asiento N° 07 del Cuaderno de Obra, de fecha 12 de agosto de 2026, mediante el cual esta Inspección General requirió al Consorcio Unión la formulación y remisión del Cronograma de Desembolsos Mensualizado, en estricta concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) y el Calendario de Adquisici...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Órdenes · SOEC_INSP · 14/08/2026

...cordancia con el calendario de avance de obra valorizado (caov) y el calendario de adquisicion de materiales, equipos y mobiliario, se advierte que, a la fecha, la empresa contratista ha incurrido en incumplimiento al no haber presentado el referido instrumento tecnico-financiero.al respecto, se senala que la elaboracion y entrega de dicho documento constituye una obligacion contractual plenamente exigib...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 14/08/2026

OBSERVACIONES AL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO: En atención a la CARTA N°013-2026-CU/RC de fecha 12/08/2026, mediante la cual el Consorcio Unión remite el Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra 07/08/2026, se indica:Se toma conocimiento de la documentación presentada en PDFDe la revisión preliminar conforme al numeral 67 de las Bases Integradas y all Reg...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
