


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra: Mejoramiento de camino vecinal, el eslabon - dos de mayo, distrito de el eslabon - huallaga - san martin CUI N° 2210214

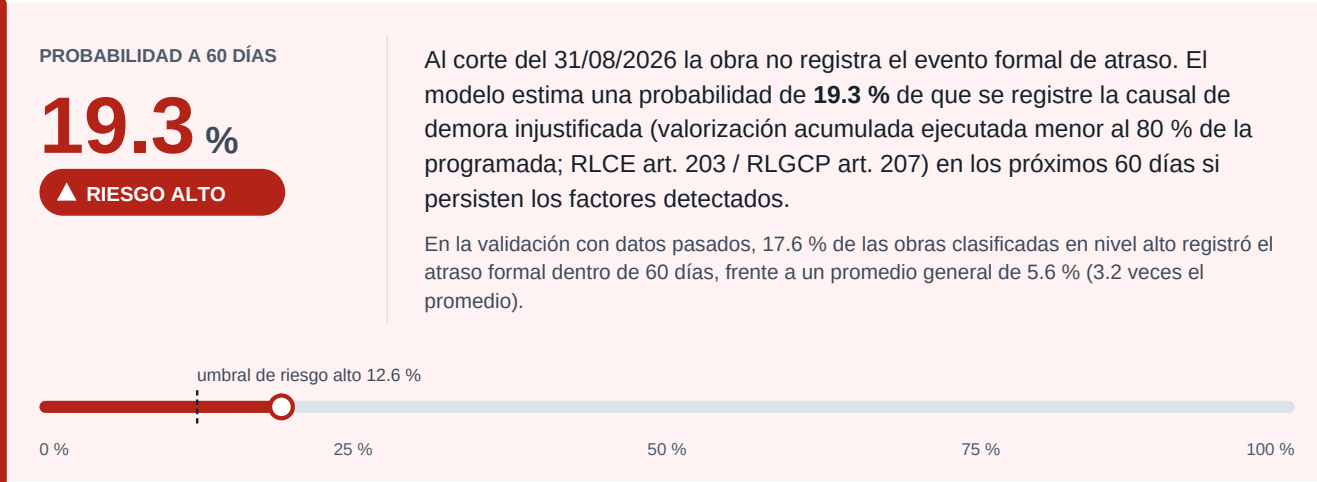


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	232 desde 11/11/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL, EL ESLABON - DOS DE MAYO, DISTRITO DE EL ESLABON - HUALLAGA - SAN MARTIN CUI N° 2210214
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON
Contratista	CONSORCIO LAS PIÑAS JAEN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	EL ESLABON / HUALLAGA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2210214
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL , EL ESLABON - DOS DE MAYO, DISTRITO DE EL ESLABON - HUALLAGA - SAN MARTIN
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2354446
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,598,818.00
Cuaderno de obra digital	232 asientos entre 11/11/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

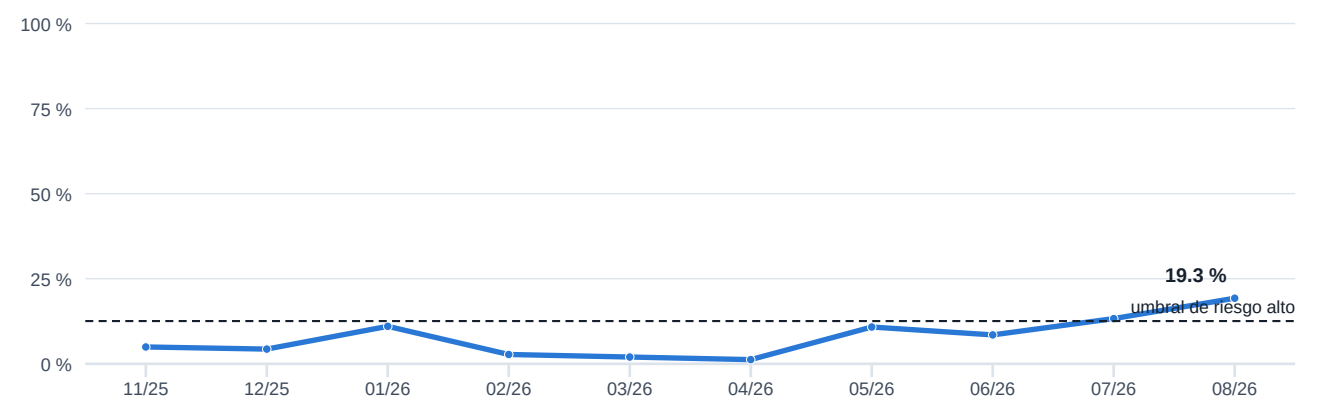

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.524
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.232
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.222
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.121
10 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.107
Extensión media de los asientos recientes: 1,146 caracteres	Contenido de los asientos		-0.078

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	19.3 %	19.0 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	19.3 %	19.0 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 231 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

incumplimiento de pago de valorizaciones . a la fecha, la entidad adeuda al contratista las valorizaciones de los meses de mayo, junio y julio, esta situacion viene afectando directamente la disponibilidad d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 222 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 21/08/2026

incumplimiento de pago de valorizaciones . por medio del presente asiento, el suscrito residente de obra, en representacion del consorcio vial huallaga ejecutor de la obra, deja expresa constancia del incump...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 220 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

precisiones respecto al supuesto incumplimiento de la programacion de obra y falta de implementacion de recursos . en atencion a los asientos n. 218 y 219, registrados por la supervision con fecha 14 de agosto de 2026, mediante los cuales s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 218 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS.: La Supervisión, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento de la ejecución contractual, DEJA EXPRESA Y FEHACIENTE CONSTANCIA que, a la fecha, el Contratista NO VIENE ACREDITANDO LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA VIGENTE, verificándose una evidente insuficiencia...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 219 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

incumplimiento de la programacion de obra y falta de implementacion de recursos. . en consecuencia, cualquier atraso, menor avance, desviacion de metas o afectacion de los plazos contractuales que se derive ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 219 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

incumplimiento de la programacion de obra y falta de implementacion de recursos. . en consecuencia, cualquier atraso, menor avance, desviacion de metas o afectacion de los plazos contractuales que se derive de la falta o insuficiencia de frentes de trabajo, maquinaria, equipos, personal, materiales u otros recurso...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 209 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

requerimiento por falta de ejecucion de partidas programadas atraso en la ejecucion de partidas correspondientes a la valorizacion n06 del contrato principal. . la supervision, en ejercicio de sus funciones de control, seguimiento y vigilancia de la correcta ejecuci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 211 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

requerimiento por falta de ejecucion de partidas programadas atraso en la ejecucion de partidas correspondientes a la valorizacion n06 del contrato principal. . -----continua del asiento anterior-----en caso de verificarse que el atraso resulta injustificado e imput...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 210 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

requerimiento por falta de ejecucion de partidas programadas atraso en la ejecucion de partidas correspondientes a la valorizacion n06 del contrato principal. . continua del asiento anterior-----por lo expuesto, se requiere al contratista que sustente de manera d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 210 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

REQUERIMIENTO POR FALTA DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS – ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACIÓN N°06 DEL CONTRATO PRINCIPAL.: CONTINUA DEL ASIENTO ANTERIOR-----Por lo expuesto, se REQUIERE AL CONTRATISTA que sustente de manera documentada las causas que han originado la falta de ejecución de las partidas programadas durante julio de 2026, indicando expresamente si dichas causas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
