


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contrato de ejecucion de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vias locales del centro poblado de andagua, distrito de andagua de la provincia de castilla del departamento de arequipa, CUI 2670322

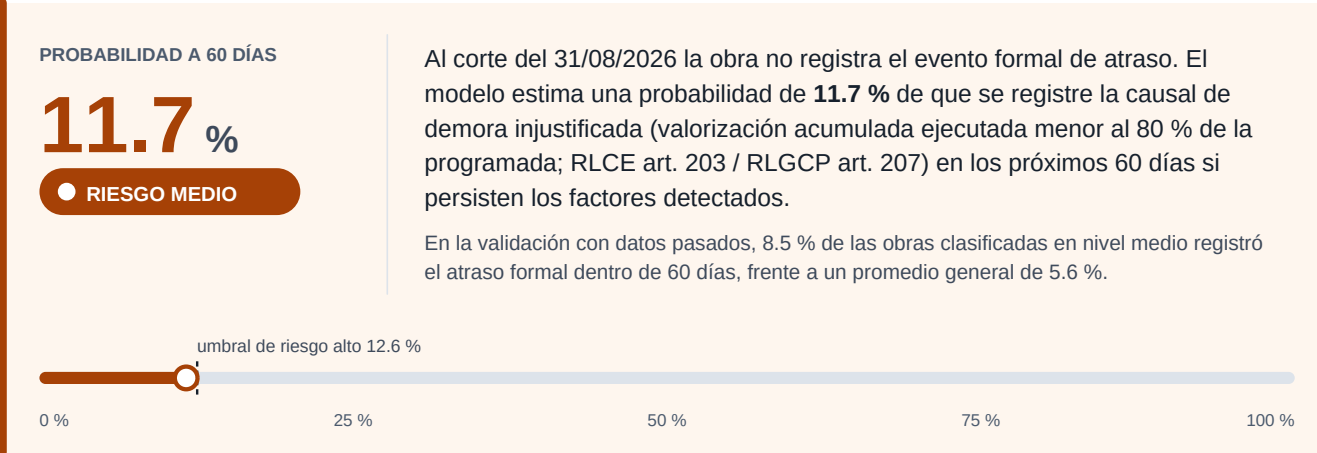


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	75 desde 04/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO DE ANDAGUA, DISTRITO DE ANDAGUA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2670322
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA
Contratista	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ANDAGUA / CASTILLA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2670322
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO DE ANDAGUA DISTRITO DE ANDAGUA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2397144
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,196,772.22
Cuaderno de obra digital	75 asientos entre 04/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

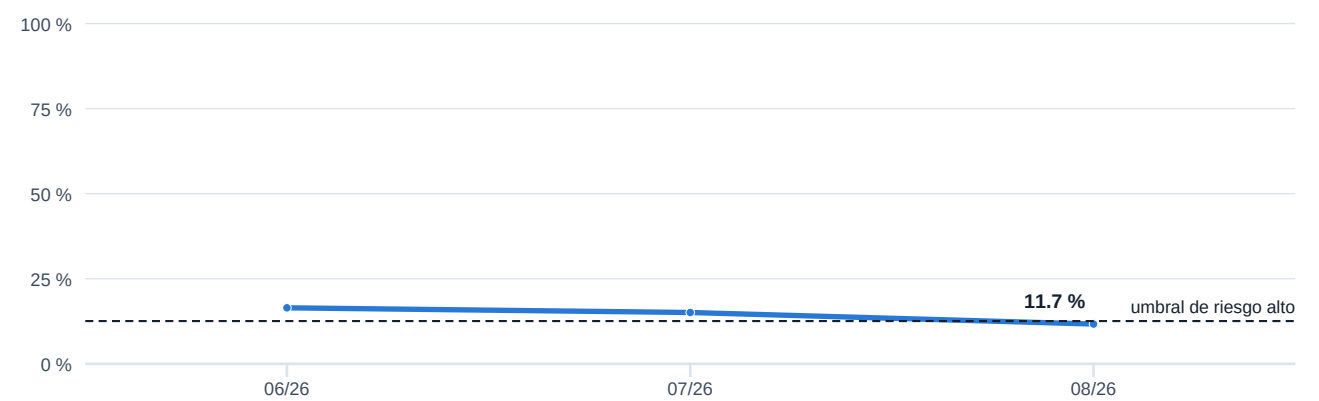

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.246
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.44 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.117
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.106
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.097
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.095
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.086
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.063
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.061

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.7 %	11.4 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 74 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

asiento n59 de residente de obra . 1.1 se deja constancia que mediante carta n. 031-2026-gg-wae, el contratista presento ante la supervision de obra la subsanacion de observaciones al expediente tecnico de la prestacion adicional de obra n. 02 con presupuesto deductivo vinculante n. 02, incorporando la documentacion tecnica complementaria y las precisiones correspondientes pa...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 70 · Consultas · SOEC_RESI · 28/08/2026

ASIENTO N°55 DE RESIDENTE DE OBRA: CONDICIÓN ENCONTRADA DURANTE LOS TRABAJOS DE CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE.1.1. Durante la ejecución de los trabajos de corte a nivel de subrasante en la Calle N.º 04, se ha identificado la presencia de roca dura dentro del área de intervención de la vía, ubicada en un sector aproximado de 30.00 m².1.2. De acuerdo con los niveles considerados en el expediente técnico, para alcanzar la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...n de los frentes de trabajo y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.2. en atencion al asiento n. 30 efectuado por la supervision de obra, se toma conocimiento de las observaciones formuladas respecto a la solicitud de autorizacion de mayores metrados. en tal sentido, la contratista procedera a elaborar y presentar el sustento tecnico desagregado por calles, indicando para ca...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 51 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_SPV · 04/08/2026

ASIENTO N°30: En atención al asiento N°40 de la Contratista, se toma conocimiento de la solicitud de ejecución de mayores metrados en las partidas señaladas. Sin embargo, se precisa que algunas partidas comprenden trabajos distribuidos en diversas calles, incluyendo sectores aún no ejecutados, por tanto, mientras exista saldo contractual disponible, no corresponde considerar que el metrado se encuentra agotado ni sol...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Adicionales · SOEC_SPV · 10/07/2026

ASIENTO N°28 DEL SUPERVISOR: En la fecha, esta Supervisión deja constancia que ha tomado conocimiento de la Carta N.º 22-2026/MDA/GDTYE/DHY, mediante la cual la Entidad comunica la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N.º 01, tramitada conforme al marco normativo establecido en la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 009-2025-EF.Al respe...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 34 · Órdenes · SOEC_SPV · 08/07/2026

ASIENTO N°27 DEL SUPERVISOR: SOBRE VACEADO DE MUROS DE CONTENCIÓN MC-03En la fecha, durante la verificación de los trabajos de vaciado parcial del muro de contención, esta Supervisión constató que el Contratista ejecutó dicha actividad empleando hormigón sin haber realizado previamente el tamizado y separación del material mediante malla N.º 4, conforme se encuentra previsto en el diseño de mezcla aprobado para la pr...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 15 · Órdenes · SOEC_SPV · 16/06/2026

DEL SUPERVISOR DE OBRA: 1. LOS TRABAJOS SE INICIARON LA CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO, PARA LUEGO CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS ORDENES SEGUN RESIDENCIA.2. SE AUTORIZA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE LA SUB RAZANTE LA CIMIENTOS.3. SE INFORMA QUE SEGUN LA NUEVA LEY DE CONTRATACONES DEL ESTADO TODA MODIFICACION AL CONTRATO Y PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO SE REALIZARA CONSULTA SIEMPRE QUE ESTE AMER...

Fuente: cod-asientos202606.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
