


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Ejecucion del saldo de obra del proyecto: ¿mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de campanilla, distrito de campanilla ¿ mariscal caceres ¿ san martin¿, CUI N° 2238574.

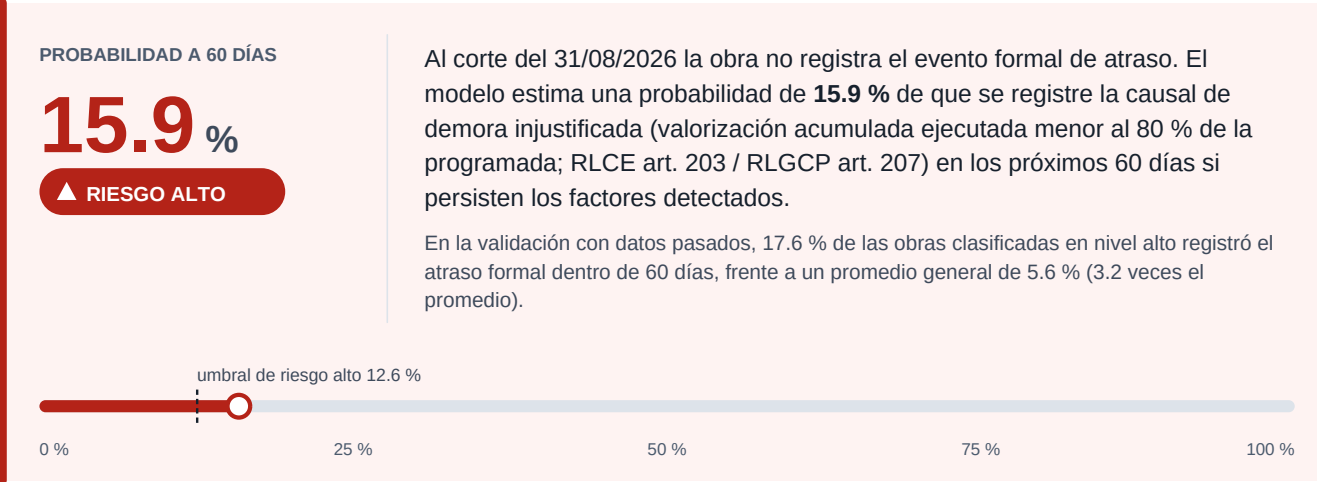


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 12,119,300.00	240 días	37 desde 25/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA ¿ MARISCAL CACERES ¿ SAN MARTIN¿, CUI N° 2238574.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
Contratista	CONSORCIO INTEGRAL CAMPANILLA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAMPANILLA / MARISCAL CACERES / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2238574
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2406739
Monto del contrato	S/ 12,119,300.00
Monto aprobado de la inversión	S/ 12,762,009.00
Cuaderno de obra digital	37 asientos entre 25/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

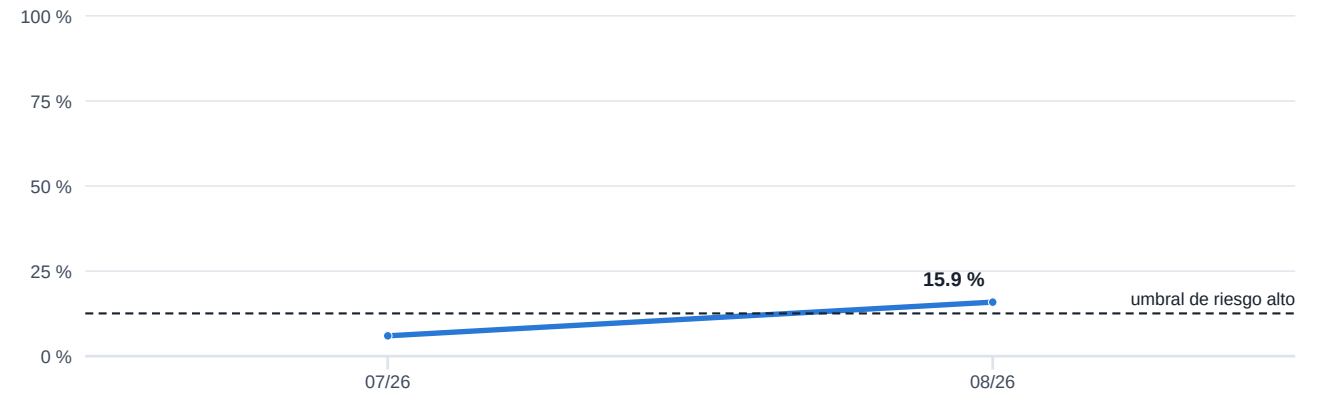

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.446
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.214
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Se ha gastado el 1 % del monto aprobado de la inversión	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.094
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.086
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.063
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.061
Monto del contrato: S/ 12,119,300	Datos del contrato		+0.052

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.9 %	15.4 %	-0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 35 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

...eal del terreno necesario para la ejecución de la partida de "excavación para zapata de torre de pase aéreo".por consiguiente, mediante el presente asiento, se da por concluido el hecho generador del retraso que fue advertido e iniciado mediante el asiento n 25 de fecha 21/08/2026. queda así cerrada la causal de inicio de ampliación de plazo n02.al contar con la libre disponibilidad del área mencionada,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 30/08/2026

OPINIÓN SOBRE CONSULTA N° 01, REMITIDO MEDIANTE LA CARTA N° 017_2026_CIC_RC/KBRT, ADJUNTO INFORME N° 009_2026_CIC_RO/PGP Q SE REFIERE A LA CONSULTA N° 01 OMISIÓN DE PARTIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL: LUEGO DE HACER REVISADO EL ACERVO DOCUMENTARIO, EL CONTRATISTA NO SUSTENTA TÉCNICAMENTE LAS CONSULTAS FORMULADAS MEDIANTE CARTA N°017-2026-CIC-RC/KMBG. PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE TRAZO DEBERÁ TENER UN...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 30/08/2026

...s consultas que se formulen, deben ser adjuntadas las memorias de calculo que sustente la incompatibilidad con el diseño de las obras proyectadas, así mismo deberá tener en consideración el tiempo de demora de las consultas de acuerdo al artículo 190 del rgcp, para evitar retrasos y afectaciones a la ruta crítica del proyecto, durante el pronunciamiento de la entidad y el proyectista, esta supervisión ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

.... de acuerdo de lo indicado por el contratista en el asiento n 025 del cuaderno de incidencias, se sugiere al contratista seguir los lineamientos indicados en el art. 198, inciso 198.1 literal a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, presentando la documentación de no disponibilidad, del terreno para ejecución de las partidas contratadas.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

registro de inicio de causal de ampliación de plazo n02 . 1. del retraso en el inicio de partida:en estricta concordancia con el cronograma de avance de obra vigente, con fecha 30 de julio de 2026 se debió dar inicio a los trabajos correspondientes a la partida de "excav...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

OTRAS OCURRENCIAS: EN RELACION A LO INDICADO POR EL CONTRATISTA SE LE SUGIERE PRESENTAR LA SUSTENTACION TECNICA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 198.1 INCISO a) , DEL RLGC

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 3 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/07/2026

SOLICITO DOCUMENTACION: Esta Supervisión requiere al Residente de Obra la presentación de la documentación técnica y de gestión correspondiente al inicio del plazo de ejecución de la obra, a fin de garantizar el adecuado control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tal sentido, deberá remitir, a la brevedad posible, la siguiente documentación:Cronograma de Ejecución de Obra actualizado a l...

Fuente: cod-asientos202607.csv

SIAF · 01/07/2026

Devengado 2026-07: S/ 78,998.00

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
