


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la AV. Nueva jerusalen, calle belen, calle macedonia, calle betel, AV. Canan, psje los alamos, psje evemecer, calle peniel, calle real 2, psje los sauces, mediante la construccion de pistas y veredas distrito de cieneguilla

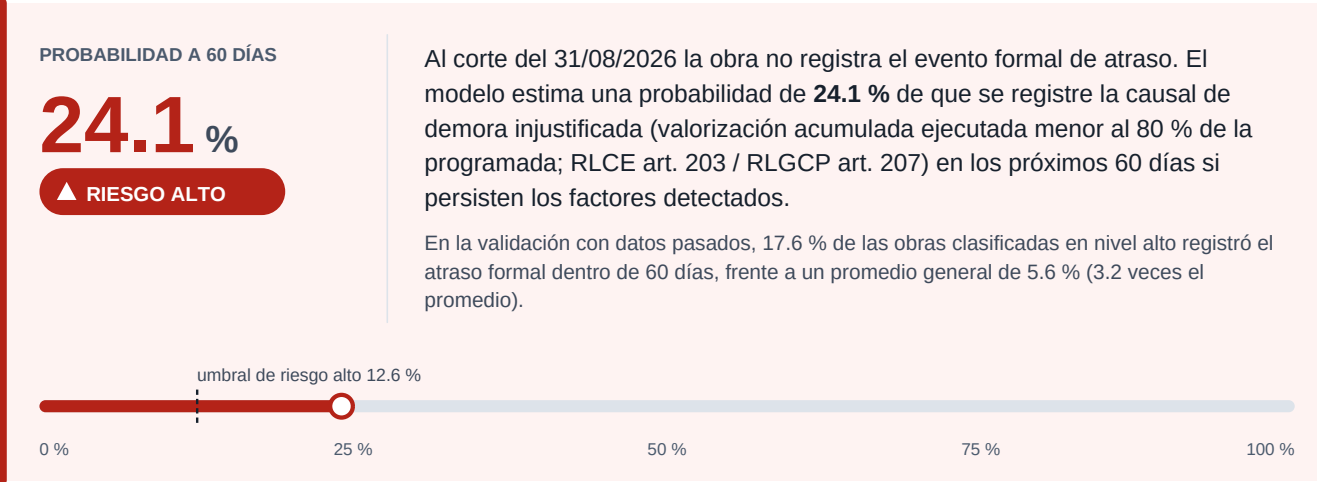


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	263 desde 06/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. NUEVA JERUSALEN, CALLE BELEN, CALLE MACEDONIA, CALLE BETEL, AV. CANAN, PSJE LOS ALAMOS, PSJE EVEMECER, CALLE PENIEL, CALLE REAL 2, PSJE LOS SAUCES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DISTRITO DE CIENEGUILLA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
Contratista	CONSTRUCCION & CONTRATISTA GENERALES H.R.J.J. E.I.R.L
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CIENEGUILLA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2666458
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA NUEVA JERUSALEN,CALLE BELEN, CALLE MACEDONIA, CALLE BETEL, AV. CANAN,PSJE. LOS ALAMOS,PSJE. EVEMECER,CALLE PENIEL,CALLE REAL 2, PSJE.LOS SAUCES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2387455
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,446,403.18
Cuaderno de obra digital	263 asientos entre 06/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

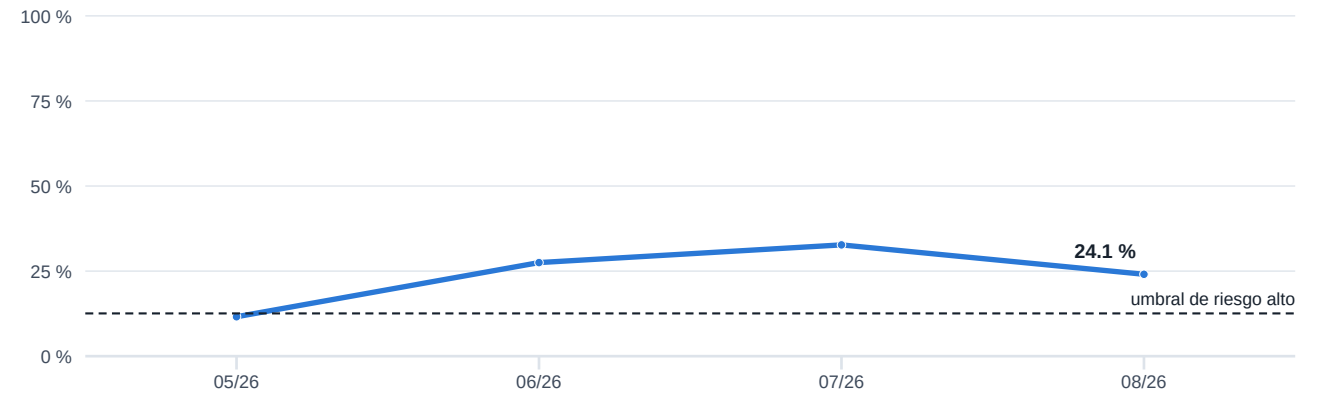

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.525
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.257
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.196
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.156
26 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.135
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.111
4 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.104

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	24.1 %	21.0 %	-3.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	24.1 %	24.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 261 · Órdenes · SOEC_SPV · 30/08/2026

ORDENES: DE LAS BASES INTEGRADAS SE TIENE TECTUALMENTE:....." a) TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOSEl contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra, objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse. Si la obra no se ejecutará estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 257 · Consultas · SOEC_RESI · 28/08/2026

...junta graficos del proyecto, interferencias encontradas y la alternativa propuesta)al respecto, sobre el planteamiento indicado en lineas arriba, estaremos a la pronta respuesta, con el fin de evitar atrasos en el avance de obra

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 255 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

...entro de las normas establecidas (se adjunta graficos de la alternativa propuesta) al respecto, sobre el planteamiento indicado en lineas arriba, estaremos a la pronta respuesta, con el fin de evitar atrasos en el avance de obra

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 248 · Órdenes · SOEC_SPV · 26/08/2026

ORDENES: Se deberá entregar a la supervisión con carta y fecha, la certificación correspondiente del fabricante del ASFALTO LIQUIDO MC, que comprueba la calidad del material asfáltico a usarse en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. NUEVA JERUSALEN, CALLE BELEN, CALLE MACEDONIA, CALLE REAL 2, PSJE LOS SAUCES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVI...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 247 · Órdenes · SOEC_SPV · 26/08/2026

ORDENES:CONTINUAOTRAS AREAS DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES O NO SUSTANCIALES NO PUEDEN SER VALORIZADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.SE SOLICITA LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LAS PARTIDAS DE IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA, LA FINALIDAD ES TENER LA CUANTIFICACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE CONSIDERAN SOLO EN EL EXPEDIENTE TECNICO (SEGÚN EL CUADRO ADJUNTO LINEAS ARRIBA), PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO COMPARATIVO. CASO CO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 249 · Órdenes · SOEC_SPV · 26/08/2026

ORDENES: Se solicita al contratista de obra por medio de su residente entregar el Diseño de Mezcla Asfáltica en Caliente, que cumple los estándares requeridos en las normas técnicas y expediente técnico a usarse en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. NUEVA JERUSALEN, CALLE BELEN, CALLE MACEDONIA, CALLE REAL 2, PSJE LOS SAUCES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DISTRITO DE CIEN...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 243 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

ORDENES: DE LAS BASES INTEGRADAS:....." h) DAÑOS A TERCEROSConstituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de penalidades y/o resolución del contrato..."Del supervisor:A altas horas de la noche del Dia de ayer colapso la red de agua potabl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 245 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

...ade la supervision:cumplir sus abliligaciones y informarle por este medio que la asistencia diaria es de manera obligatoria para el especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo, evitemos las penalidades.asimismo, existe postes, cajas domiciliarias de agua potable, cajas domiciliarias de desagüe, que deben ser reubicados, acorde con las normas tecnicas. realizar las medidas correctivas en un corto ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 243 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026 ... el asumir los costos de reparacion de los danos que ocasionen a las redes electricas, agua, desagüe, telefonos y demas terceros. la negativa del contratista en reparar el dano causado sera causal de penalidades y/o resolucion del contrato...del supervisor:a altas horas de la noche del día de ayer colapso la red de agua potable ubicado en la via los olivos, a una distancia aproximada de 50 metros de la pos... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 238 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026 ... le recuerda cumplir estrictamente la seguridad y salud en el trabajo.3.- obligarlos a usar todos usar los implement0s de seguridad, al personal de oficina, almacen y obra, son obligatorios. evitemos penalidades. 4.- los muros de la via los olivos, los acabados deberan ser tratados con los procedimientos quimicos establecidos en el reglamento.5.- existe el metrado de juntas en las obras de concreto en gene... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 231 · Consultas · SOEC_RESI · 17/08/2026 ...ontradas y la alternativa propuesta)-----al respecto, sobre el planteamiento indicado en lineas arriba, estaremos a la pronta respuesta, con el fin de evitar atrasos en el avance de obra Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 225 · Órdenes · SOEC_SPV · 13/08/2026 ...d de alcantarilladose le ordena proceder a la demolicion de la losa y colocar la caja domiciliaria de agua y la tapa de concreto del buzón con su respectivo marco y corona de fierro fundido. evitemos penalidades por el mal proceso constructivo. Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
