


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio educacion primaria en la I.E. 41062 DR. Mario vargas llosa del asentamiento D4, en el centro poblado juan velasco alvarado, distrito de majes, provincia de caylloma, departamento de arequipa

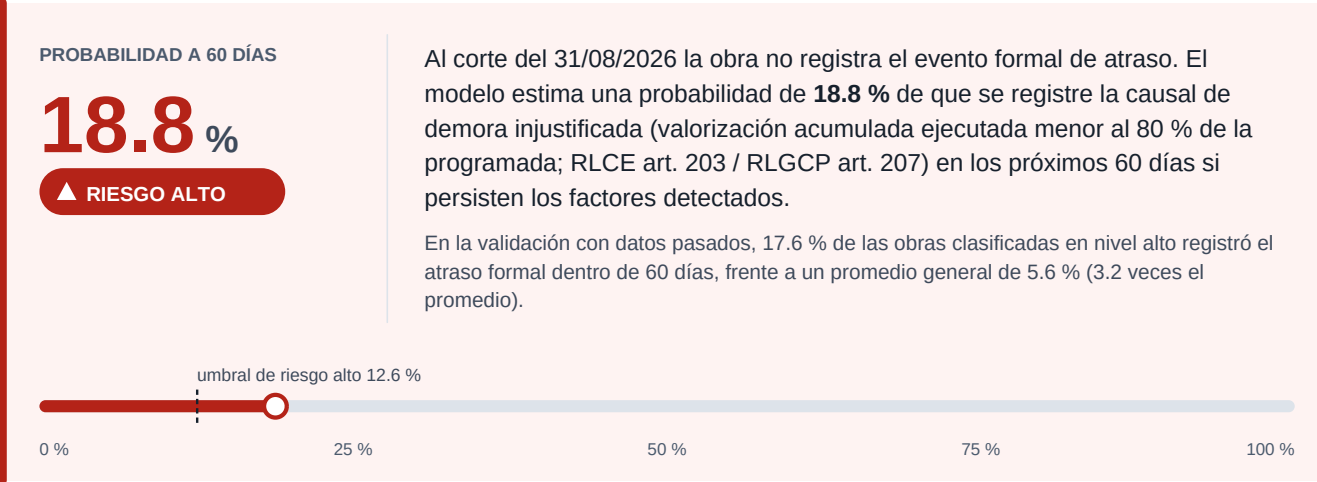


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 10,235,457.66	270 días	106 desde 12/11/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL
Contratista	CONSORCIO ALVAREZ
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MAJES / CAYLLOMA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2534926
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2353819
Monto del contrato	S/ 10,235,457.66
Monto aprobado de la inversión	S/ 6,715,983.69
Cuaderno de obra digital	106 asientos entre 12/11/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

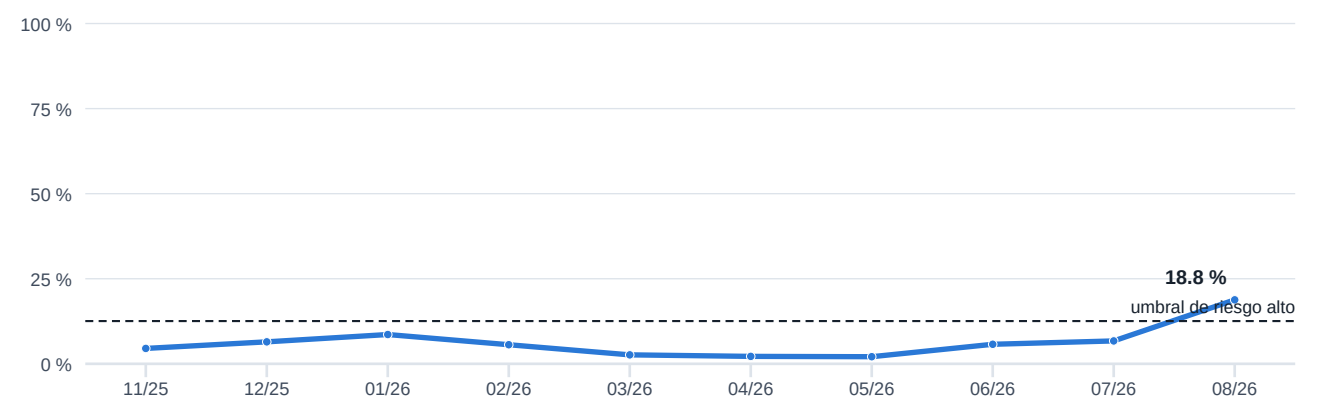

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.729
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.296
El 26 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.220
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.090
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 39,255	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.068
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.066
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.058

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 104 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

seguimiento de trabajos ejecutados y medidas para la recuperacion del atraso . en la presente fecha, se realizo la inspeccion y seguimiento de los trabajos ejecutados en los diferentes bloques de la obra, verificandose, entre otros, el encofrado y vaciado de columnetas para ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...ipos, materiales y frentes de trabajo, asi como optimizando la secuencia y simultaneidad de las actividades, de manera que los rendimientos obtenidos en campo sean compatibles con la recuperacion del atraso acumulado.la supervision continuara verificando diariamente la correspondencia entre los recursos efectivamente movilizados, los rendimientos alcanzados y las metas establecidas en el calendario ace...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 94 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

inspeccion tecnica de campo, verificacion de ritmo de trabajo y reiteracion de exigencia de recursos para revertir atraso de obra . en la fecha, la supervision realizo la inspeccion y control tecnico de los diferentes frentes de trabajo, verificandose las actividades que vienen siendo ejecutadas por el contratista, asi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 94 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, VERIFICACIÓN DE RITMO DE TRABAJO Y REITERACIÓN DE EXIGENCIA DE RECURSOS PARA REVERTIR ATRASO DE OBRA: En la fecha, la Supervisión realizó la inspección y control técnico de los diferentes frentes de trabajo, verificándose las actividades que vienen siendo ejecutadas por el Contratista, así como la cantidad de personal asignado a los mismos:1. ACTIVIDADES VERIFICADAS EN CAMPO: Bloque C: Enc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 93 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, VERIFICACIÓN DE RITMO DE TRABAJO Y REITERACIÓN DE EXIGENCIA DE RECURSOS PARA REVERTIR ATRASO DE OBRA: En la fecha se realizó la inspección y control técnico en los diferentes frentes de obra, verificándose el desarrollo de las siguientes actividades:1. ACTIVIDADES EN CAMPO:• Bloques C y D: Desencofrado de columnas del 2º nivel.• Bloque C: Encofrado y vaciado de columnetas del 1º nivel.• B...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 93 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

inspeccion tecnica de campo, verificacion de ritmo de trabajo y reiteracion de exigencia de recursos para revertir atraso de obra . en la fecha se realizo la inspeccion y control tecnico en los diferentes frentes de obra, verificandose el desarrollo de las siguientes actividades:1. actividades en campo: bloques c y d: ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 89 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ATRASO DE OBRA: 1. SE CONTINÚA CON LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.2. CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE, EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON REMITIR A ESTA SUPERVISIÓN EL CALENDARIO ACELERADO DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
