


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de obra creacion de la linea en 33 kv chilina centro historico y set centro historico de 33/10 kv 25 mva en el distrito de arequipa provincia de arequipa departamento de arequipa

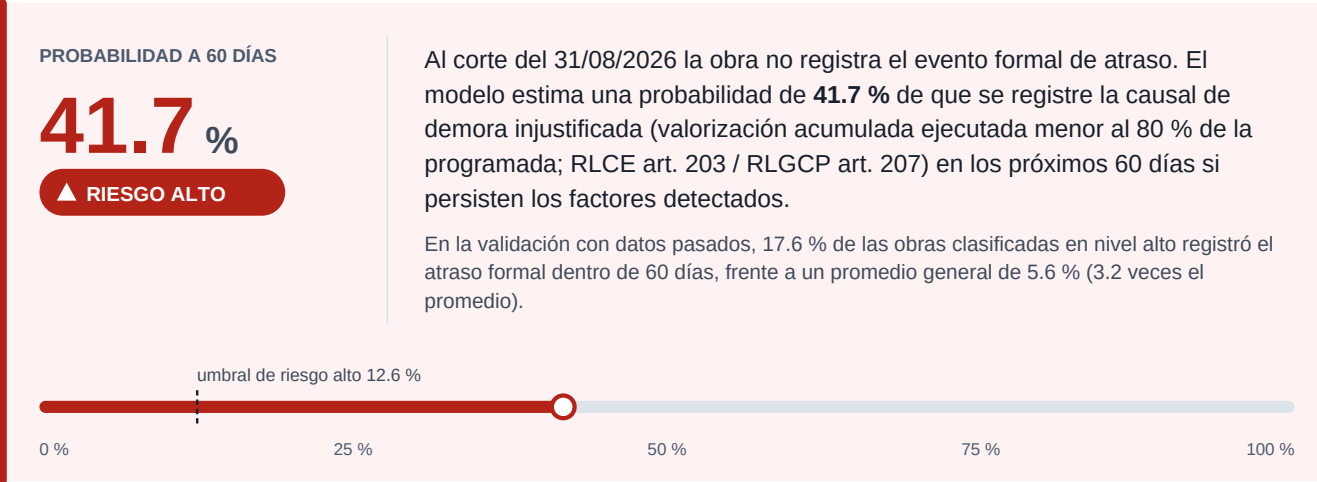


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	77 desde 01/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHILINA CENTRO HISTORICO Y SET CENTRO HISTORICO DE 33/10 KV 25 MVA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Entidad contratante	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
Contratista	CONSORCIO ELECTRICO SAN CHILINA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2558163
Inversión asociada	CREACION DE LA LÍNEA EN 33 KV CHILINA - CENTRO HISTÓRICO Y SET CENTRO HISTÓRICO DE 33/10 KV - 25 MVA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2392514
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 20,664,536.46
Cuaderno de obra digital	77 asientos entre 01/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

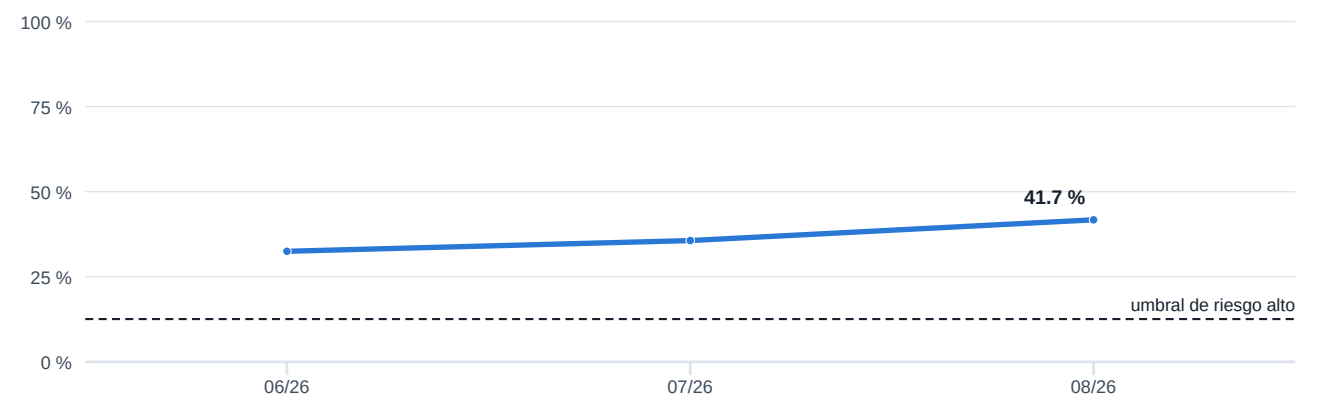

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.860
El 40 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.277
El 27 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.250
El 69 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.202
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.181
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.129
10 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona deficiencias del expediente técnico	Contenido de los asientos		-0.123

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	41.7 %	35.7 %	-6.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 74 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/08/2026

retraso en la entrega integral y aprobada de la ingeniería de detalle . con esta anotacion se deja constancia de que la entrega integral y aprobada de la ingeniería de detalle registra un retraso de cuarent...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 73 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/08/2026

...ctividades de campo, así como a las medidas de control ambiental establecidas en el plan de manejo ambiental (pma).se recuerda que la omision o ejecucion deficiente de estos procedimientos constituye incumplimiento normativo y puede derivar en sanciones administrativas por parte del oefa, ademas de comprometer la seguridad de los trabajadores y el entorno.la supervision exhorta a la contratista a impleme...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 72 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

...de calidad . en atencion al asiento n. 65, mediante el cual la supervision deja constancia de la supuesta continuidad de la ausencia del especialista en calidad y senala la procedencia de aplicar las penalidades contractuales correspondientes, el contratista cumple con precisar lo siguiente:se comunica a la supervision que, mediante carta n. seal-gg/tep-4443-2026, la entidad ha aceptado al ing. luis pastor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 26/08/2026

continua ausencia del especialista en calidad . con esta anotacion se deja constancia, que hasta la fecha continua la ausencia del especialista en calidad, enconsecuencia, corresponde aplicar las penalidades contractuales por cada día de ausencia, de acuerdo conel numeral 13 del cuadro de penalidades y clausulas establecidas en el contrato nad/lo.042-2026-seal.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 70 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...enor durante el periodo observado, circunstancia excepcional, imprevisible y ajena a su voluntad, por tanto, esta supervision considera objetivamente sustentada su ausencia y recomienda no aplicar la penalidad correspondiente. respecto al ing. jonathan bocanegra sanchez, su ausencia durante los días 08, 09, 10 y 11 de agosto de 2026, obedecio a emergencias familiares excepcionales, imprevistas y ajenas a l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 67 · Órdenes · SOEC_SPV · 15/08/2026

atraso en la ingeniería de detalle y riesgo en el suministro de equipos principales . con esta anotacion se deja constancia de que, conforme al cronograma de obra vigente, la actividad ingeniería de detall...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 63 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 13/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N°62 - DESCARGO NO ACREDITADO POR AUSENCIA DE PERSONAL ESPECIALISTA: Respecto al asiento N°62, esta Supervisión precisa que el descargo formulado no desvirtúa la ausencia constatada del Ing. Jhonny Araujo Terrones, especialista en Obras Civiles, y del Ing. Jonathan Bocanegra Sánchez, especialista en SSOMA, con participación contractual del 100 %. Las actas de asistencia de los días 10 y 11 de ago...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 62 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

...no ni incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales.3. se precisa que, conforme al artículo 120 del reglamento de la ley n 32069 (rlce), la penalidad por mora procede unicamente ante retrasos o incumplimientos injustificados atribuibles al contratista, en el presente caso, dos (2) de los cuatro (4) días observados corresponden a descanso semanal obligatorio no laborable, y los dos (2) d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 61 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 11/08/2026**

ESPECIALISTA EN CALIDAD CONTINUA AUSENTE: Se deja constancia que, conforme a la verificación de asistencia realizada en obra, el Especialista en Calidad (Deyvi Ethelwaldo Vásquez) continua ausente en obra desde el día 03/08/2026. Dicho profesional está considerado con una participación contractual del 100%. La ausencia constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales de permanencia y participación del per...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 61 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 11/08/2026**

...26-seal.se requiere al contratista regularizar inmediatamente la permanencia del especialista, sin perjuicio de las penalidades que correspondan por el periodo constatado. asimismo, se precisa que los atrasos en el avance de la ejecucion de obra, por la no presencia del mencionado profesional, sera responsabilidad exclusiva de la contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
