


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de veredas y construccion de calzada con pavimento rigido en la localidad de pallan, distrito de la libertad de pallan - celendin - cajamarca

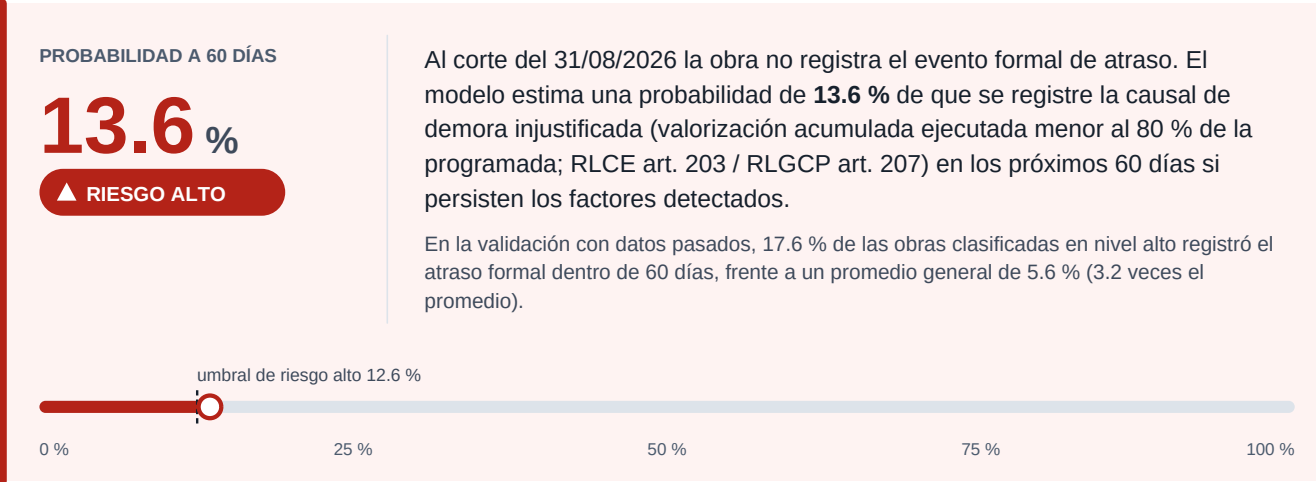


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 7,212,608.82	210 días	512 desde 14/05/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y CONSTRUCCION DE CALZADA CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA LOCALIDAD DE PALLAN, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN
Contratista	CONSORCIO VIAL PALLÁN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA LIBERTAD DE PALLAN / CELENDIN / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2329975
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y CONSTRUCCION DE CALZADA CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA LOCALIDAD DE PALLAN, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2299801
Monto del contrato	S/ 7,212,608.82
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,956,287.00
Cuaderno de obra digital	512 asientos entre 14/05/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

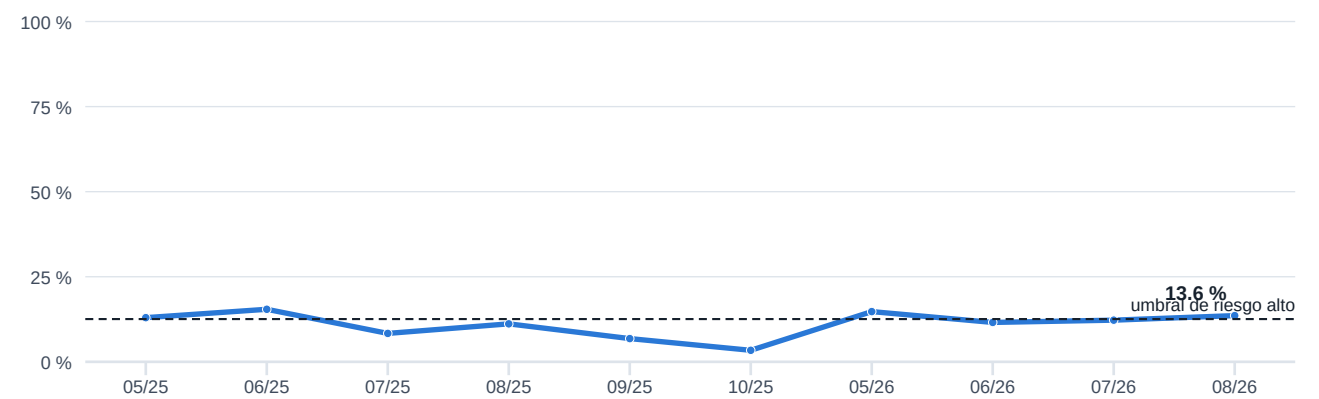

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 31/05/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.49 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.516
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.216
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.177
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.107
El plazo original venció hace 271 días	Datos del contrato		-0.102
Ha transcurrido el 229 % del plazo original	Datos del contrato		-0.081

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.6 %	13.6 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.6 %	13.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 495 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...icable.la finalidad ha sido poner en conocimiento de la residencia el cumplimiento de los plazos, considerando la importancia de realizar oportunamente las gestiones correspondientes, a fin de evitar demoras que puedan generar incidencias en la programacion y en el plazo previsto para la culminacion de los trabajos. en ese sentido, se recomienda adoptar las acciones necesarias para la atencion oportuna ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 492 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

retrasosvienemientras la supervision o la entidad no alcance los planos modificados, seguira el retraso en la ejecucion de la construccion de la graderia del jr. cer...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 491 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

retrasos . la residencia manifiesta respecto al asiento en cuaderno de obra n 474 de la supervision, fechado el 17/08/2026 donde escribe que lo propuesto de 14 mts. por 1 mt.....no creo que apunte a una ampl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 487 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...o puede usar esto como excusa absoluta para desatender una obra que requiere el adicional.3.1. si bien el contratista debe entregar el expediente tecnico del adicional dentro del plazo de 15 dias, el incumplimiento de dicho plazo, en determinado caso, podria no incidir en la necesidad de la prestacion adicional para alcanzar la meta de la obra. en tal supuesto, en la medida de que persista dicha necesida...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 486 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

retrasos . la residencia respecto a la anotacion en cuaderno de obra n 482, de la supervision, fechado el 19/08/2026, se le indica que los nuevos planos alcanzados por la entidad tienen el visto bueno de la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 489 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...el 19/08/2026, deja presente que segun el osce indica lo siguiente:opinion no 038-2022/dtn3.1. si bien el contratista debe entregar el expediente tecnico del adicional dentro del plazo de 15 dias, el incumplimiento de dicho plazo, en determinado caso, podria no incidir en la necesidad de la prestacion adicional para alcanzar la meta de la obra. en tal supuesto, en la medida de que persista dicha necesida...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 488 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

.....3.2. si bien el supervisor tiene el deber de cumplir con los plazos reglamentarios para la ratificacion del adicional y el otorgamiento de la conformidad del expediente tecnico, el incumplimiento de dichos plazos, en determinado caso, podria no revertir la necesidad que puede tener la entidad de la prestacion adicional para alcanzar la meta de la obra principal. en tal supuesto, en la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 480 · Adicionales · SOEC_SPV · 19/08/2026

... en el cuaderno de obra el 05/08/2026 con asiento n459, el plazo para la presentacion del expediente tecnico se inicio el 06/08/2026 y vencera el 20/08/2026.se recalca esta fecha con el fin de evitar incumplimiento de plazos en los procedimientos establecidos conforme a la ley de contrataciones del estado 30225.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 460 · Consultas · SOEC_SPV · 06/08/2026

SOBRE LAS CONSULTAS EN LA ALAMEDA DE ASIENTO 451-452: SOBRE LAS CONSULTAS SE LE PASO A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA N.º. 35-2026-R.C.-CONSORCIO SUPERVISION PALLAN PARA EL PROYECTISTA PARA SU ABSOLUCION

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 425 · Adicionales · SOEC_SPV · 20/07/2026

RESPUESTA AL ASIENTO 423-424: SOBRE EL ASIENTO ANTERIOR DONDE QUE EXPLICAN LO SIGUIENTE. "Con Asiento de cuaderno de obra N° 396, del residente, fechado el 05/07/206, se anota COMO INICIO delcausal que causa retraso en la ejecución de la obra, atraso no atribuible a la contratista teniendo en cuenta elR.L.C.E artículo 193, numerales 193.3, 193.8 y 193.9.En resumen, teniendo en cuenta el procedimiento para solicitar ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
