


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de obra del proyecto "creación de los servicios de pistas y veredas en la localidad de san pedro de cachi

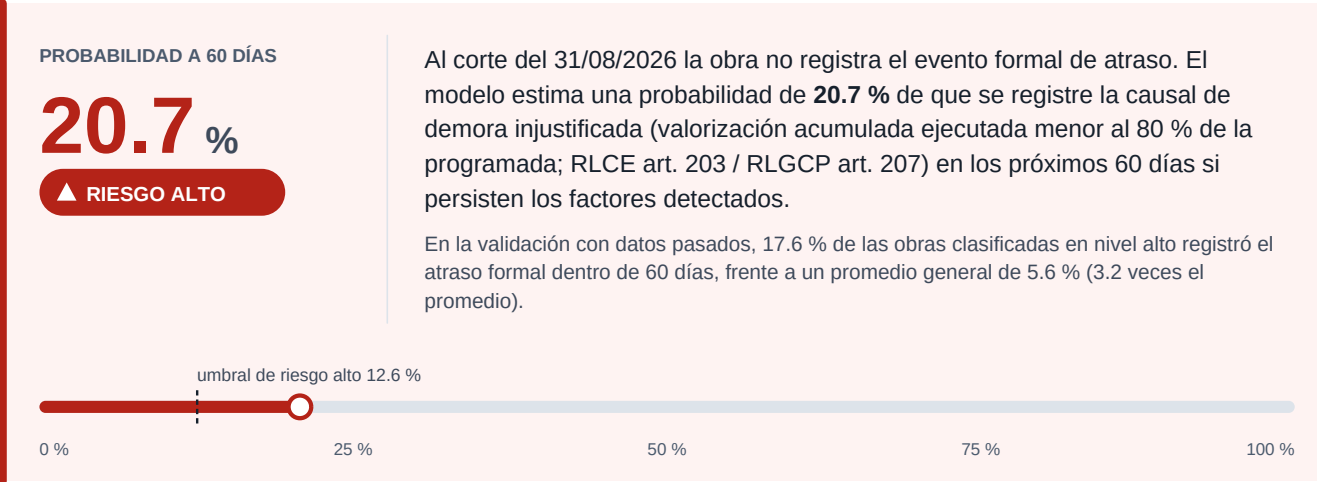


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 2,730,808.13	120 días	122 desde 20/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CACHI
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
Contratista	CONSORCIO OBRANSA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SANTIAGO DE PISCHA / HUAMANGA / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	2446205
Inversión asociada	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CACHI DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2354855
Monto del contrato	S/ 2,730,808.13
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,332,186.70
Cuaderno de obra digital	122 asientos entre 20/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

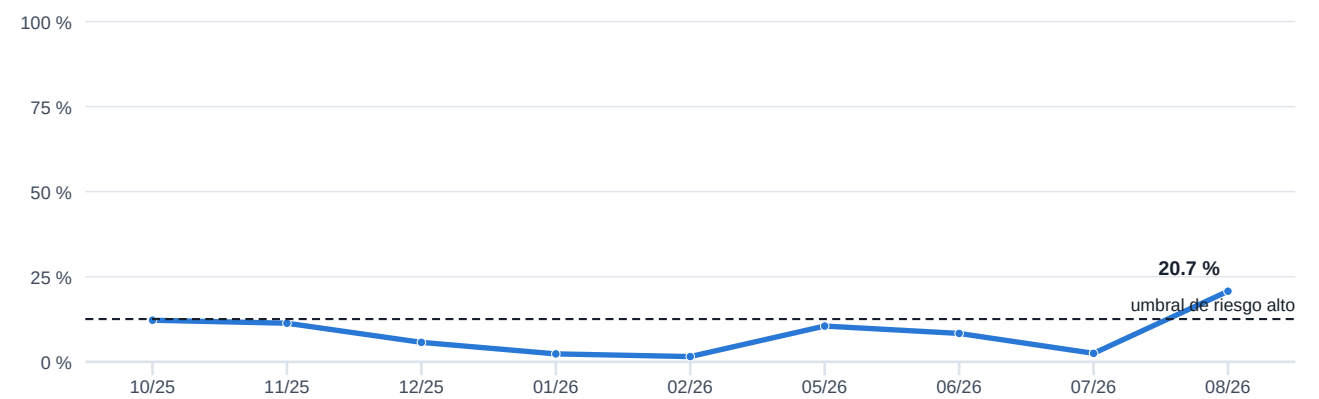

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.685
El 27 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.205
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.200
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.178
El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.119
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.104
Se ha gastado el 7 % del monto aprobado de la inversión	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.086
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.079

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	20.7 %	20.7 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	20.7 %	20.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 122 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: EL DÍA DE HOY SE HA VERIFICADO EN CAMPO SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA, AL RESPECTO DEBO PRECISAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA AUN NO INICIA CON LOS TRABAJOS, SE HA IDENTIFICADO QUE LA MOTONIVELADORA SE ENCUENTRA INOPERATIVO, NO EXISTE RODILLO LISO, NO EXISTE CISTERNA, POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL PERFILADO Y RECOMPACTADO DE SUB BASE PARA PAVIMENTO. SE EXHORTA A LA EM...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 122 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...e realizar el perfilado y recompactado de sub base para pavimento. se exhorta a la empresa contratista a fin de que tome las medidas correctivas, caso contrario el contratista viene incurriendo en los incumplimientos de obligaciones de ejecutar la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 119 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 27/08/2026

verificacion de los trabajos ejecutados . el dia de hoy continua sin ejecutar las partidas, en tal sentido, se deja constancia que viene generando atrasos en la ejecucion de la obra, por otra parte debo precisar que se ha evidenciado solo el traslado de agregados y cemento a la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 117 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

verificacion de los trabajos ejecutados . el dia de hoy continua sin ejecutar las partidas, en tal sentido, se deja constancia que viene generando atrasos en la ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 116 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...egados a obra . se deja constancia que, al inicio de la jornada, se tuvo un pequeno inconveniente relacionado con la llegada del cemento proveniente de la ciudad de huamanga, situacion que genero una demora inicial en el abastecimiento de dicho material. no obstante, durante la presente fecha se ha logrado contar con la llegada del agregado y los elementos de encofrado necesarios para la ejecucion de las...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 111 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...embargo, durante la inspeccion realizada en campo, se constato que no se vienen desarrollando actividades de ejecucion ni se ha evidenciado el inicio de partidas de obra, situacion que podria generar retrasos en el cumplimiento de la programacion establecida y afectar el avance fisico previsto. en tal sentido, se recomienda a la empresa contratista adoptar de manera inmediata las acciones necesarias par...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 106 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: SE HA VERIFICADO EN OBRA QUE A LA FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON ALGUNOS PERSONALES TÉCNICOS, ASIMISMO, SE VERIFICA QUE NO SE EJECUTO NINGUNA PARTIDA EN CAMPO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA. SE EXHORTA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES TODA VEZ QUE NO SE REINICIA HASTA LA FECHA

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 105 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/08/2026

.../08/2026 se constata en obra con el personal tecnico completo de supervision que la empresa contratista no cumple con el reinicio de ejecucion de obra n 02, se advierte que el retraso injustificado y falta de personal clave en obra, amerita sanciones y penalidades, de igual forma la empresa contratista no ha realizado el asiento en cuaderno de obra. de igual forma se exige a la empresa contratista la entrega de lo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 105 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/08/2026**

...completo de supervision que la empresa contratista no cumple con el reinicio de ejecucion de obra n 02, se advierte que el retraso injustificado y falta de personal clave en obra, amerita sanciones y penalidades, de igual forma la empresa contratista no ha realizado el asiento en cuaderno de obra. de igual forma se exige a la empresa contratista la entrega de los cronogramas actualizados al reinicio de pla...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 103 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026**

verificacion de trabajos ejecutados . con fecha 12/08/2026 se verifico que la empresa contratista no cumple con el reinicio de ejecucion de obra n 02, se advierte que el retraso injustificado y falta de personal clave, amerita sanciones y penalidades, de igual forma la empresa contratista no ha realizado el asiento en cuaderno de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
