


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de la traspasabilidad vehicular y peatonal en la asociacion de vivienda santa maria ii, pozo negro distrito de paucarpata arequipa - arequipa CUI 2243224

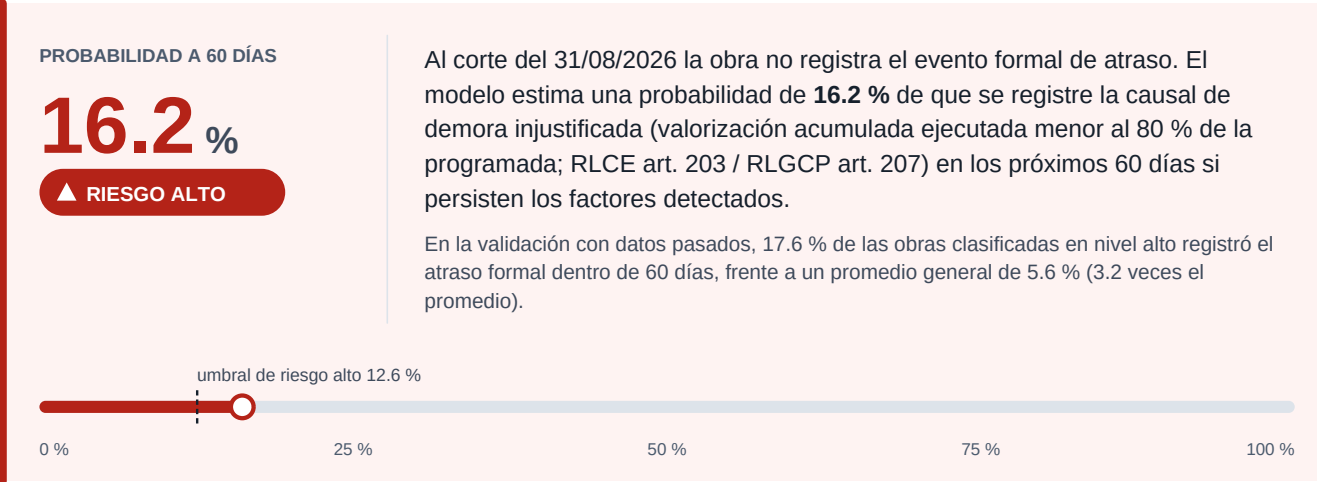


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 15,731,484.30	300 días	403 desde 24/12/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LA TRASPASABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, POZO NEGRO DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA - AREQUIPA CUI 2243224
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Contratista	KHUT SRL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PAUCARPATA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2243224
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA TRASPASABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, POZO NEGRO, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2366713
Monto del contrato	S/ 15,731,484.30
Monto aprobado de la inversión	S/ 11,090,057.61
Cuaderno de obra digital	403 asientos entre 24/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

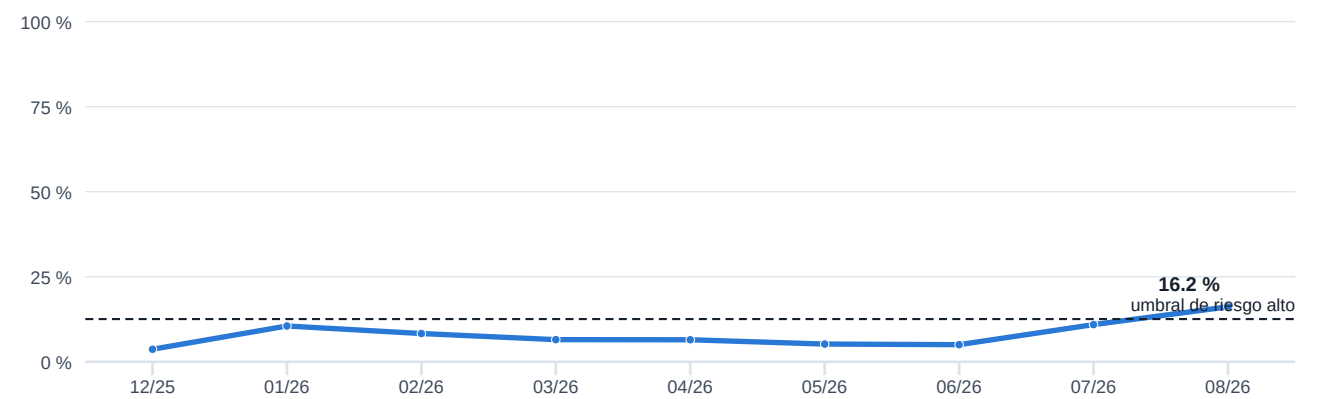

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.596
El 54 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.246
Faltan 50 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.174
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.139
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,683,308	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.094
7 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.092
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.082

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	16.2 %	15.5 %	-0.7 pp
Absolver todas las consultas pendientes	16.2 %	16.0 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 401 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...5.se solicita al supervisor de obra la verificacion y autorizar de todos los trabajos que se vienen realizando en la obra, para evitar futuras retrabajos y que genere costos y tiempo adicional y esto retrasos en el tiempo de ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 400 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

..., se solicita al supervisor de obra la verificacion y autorizar de todos los trabajos que se vienen realizando en la obra, para evitar futuras retrabajos y que genere costos y tiempo adicional y esto retrasos en el tiempo de ejecucion de la obra. por otro lado, se pone de conocimiento a la supervision, que el tipo de terreno que se esta excavando para la cimentacion de los muros armados es totalmente di...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 399 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...ento segun la secuencia logica del proceso constructivo, por esta razon no se puede iniciar las partidas de la sub rasante y base granular y el pavimento rigido o semi rigido, por lo tanto, cualquier retraso es justificado.se estan realizar los rellenos en los muros con material propio, compactando y con los controles de calidad correspondiente, y el material sobrante se esta eliminando, en lugar autori...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 402 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...5.se solicita al supervisor de obra la verificacion y autorizar de todos los trabajos que se vienen realizando en la obra, para evitar futuras retrabajos y que genere costos y tiempo adicional y esto retrasos en el tiempo de ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 377 · Consultas · SOEC_RESI · 20/08/2026

CONSULTA 12 – MUROS DANIEL ALCIDES CARRIÓN CLORINDA MATTO.: CONSULTA N° 12 CONSULTA TECNICA SOBRE LA SITUACION DE LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DEL CAMBIO DE LAS GRADERIAS A PISTA VEHICULAR. En campo se tiene que la calle Daniel Alcides Carrión en la progresiva 0+330 aproximadamente, existe un desnivel de 4.00 m con respecto de la calle santa maría, donde se necesita un sistema de contencion para garantizar la integridad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 321 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

AVANCE DE CONTRATO PRINCIPAL: Se requiere al residente que considere las obras de pavimentación como conformación de sub rasante de acuerdo a normas teniendo en cuenta el porcentaje de compactación de acuerdo a especificaciones técnicas.asimismo, se requiere al residente coordinar el requerimiento de mejora de la base granular para que la supervision vuelva a analizar la base mejorada para corroborar el cumplimiento ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 305 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/07/2026

SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO DE VIAS: Se solicita a la Residencia de Obra la presentación del plan de trabajo correspondiente a la ejecución de las vías, precisando las calles por las cuales se iniciarán las actividades, el tren de trabajo previsto, asimismo, deberá presentar el cronograma de ensayos de compactación de subrasante y base granular, a fin de garantizar la oportuna ejecución de los controles de calidad y...

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 50

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
