


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de ejecución de obra mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial interurbana en la ruta LM-120, tramo: EMP. PE-24 (tinco) vitis ¿ huancaya ¿ vilca, EMP. LM-124 (laguna paucarcocha), distritos dealis, miraflores, vitis, huancaya y tanta distritos de alis, huancaya de la provincia de yauyos del departamento de lima meta i - CUI N° 2627055

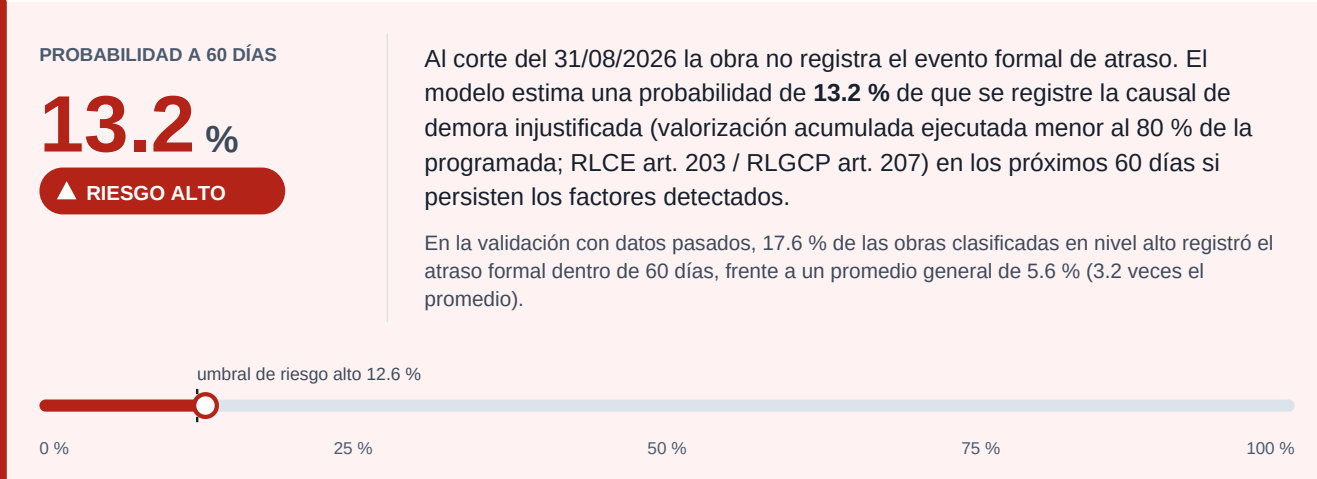

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	322 desde 17/12/2025	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA LM-120, TRAMO: EMP. PE-24 (TINCO) VITIS ¿ HUANCAYA ¿ VILCA, EMP. LM-124 (LAGUNA PAUCARCOCHA), DISTRITOS DEALIS, MIRAFLORES, VITIS, HUANCAYA Y TANTA DISTRITOS DE ALIS, HUANCAYA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA META I - CUI N° 2627055
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO VIAL MIRAFLORES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VITIS / YAUYOS / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2627055
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA LM-120, TRAMO: EMP. PE-24 (TINCO) VITIS - HUANCAYA - VILCA , EMP. LM-124 (LAGUNA PAUCARCOCHA), DISTRITOS DE ALIS, MIRAFLORES, VITIS, HUANCAYA Y TANTA DISTRITOS DE ALIS, HUANCAYA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2359949
Monto del contrato	-

Monto aprobado de la inversión	S/ 82,529,174.08
Cuaderno de obra digital	322 asientos entre 17/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

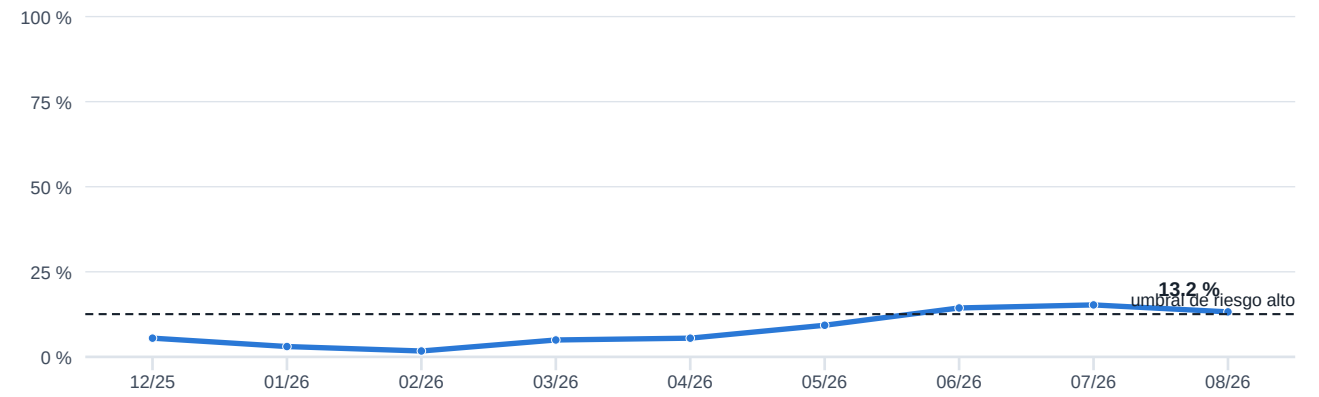

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.463
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.199
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.182
El 27 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.161
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 12,083,302	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.140
Extensión media de los asientos recientes: 1,684 caracteres	Contenido de los asientos		-0.093
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.090
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.089

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	13.2 %	12.8 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 319 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

...malmente la aprobacion de la prestacion adicional de obra n 01 y su deductivo vinculado n 01. en tal sentido, se da por concluida/cerrada la causal de ampliacion de plazo, la cual fue generada por el retraso y paralizacion parcial en la ruta critica a la espera de dicha aprobacion administrativa.con la emision del acto administrativo que aprueba el adicional n 01, la residencia de obra dispone la movili...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 292 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 14/08/2026

... a la ampliacion de plazo contractual conforme a los arts. 197 y 198 del d.s. n 009-2025-ef.se ratifica el trabajo diligente en los frentes disponibles y se reafirma la exoneracion de penalidades por atrasos ajenos al ejecutor, reservando el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 292 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 14/08/2026

...tiene el derecho a la ampliacion de plazo contractual conforme a los arts. 197 y 198 del d.s. n 009-2025-ef.se ratifica el trabajo diligente en los frentes disponibles y se reafirma la exoneracion de penalidades por atrasos ajenos al ejecutor, reservando el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 290 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 13/08/2026

...antienen el derecho a ampliacion de plazo contractual (arts. 197 y 198 del d.s. n 009-2025-ef).se demuestra el trabajo continuo en los frentes habilitados y se mantiene la exencion de penalidades por atrasos no imputables, reservando el derecho al reclamo de mayores gastos generales.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 290 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 13/08/2026

...ichas causales mantienen el derecho a ampliacion de plazo contractual (arts. 197 y 198 del d.s. n 009-2025-ef).se demuestra el trabajo continuo en los frentes habilitados y se mantiene la exencion de penalidades por atrasos no imputables, reservando el derecho al reclamo de mayores gastos generales.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 288 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 12/08/2026

...025-ef.se deja constancia de la maxima diligencia operativa del contratista en las areas habilitadas, reafirmando que los desfases globales obedecen a causas no imputables al ejecutor, eximiendolo de penalidades por mora y manteniendo la reserva de derechos para el tramite de ampliacion de plazo y el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. se solicita a la supervision tomar nota y rea...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 288 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 12/08/2026

...imputables que paralizan la ruta critica de la obra: falta de absolucion de consultas en puentes (06.05), falta de disponibilidad de terrenos en alis (km 0+000) y miraflores (botadero/paradero), y la demora en la emision de la resolucion de aprobacion del adicional n 01 y deductivo n 01 (muros, alcantarillas y servicios). dicha situacion configura el derecho a ampliacion de plazo contractual conforme a ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 286 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 11/08/2026

...operativa del contratista en los frentes habilitados, no obstante, se deja sentada la reserva de derechos respecto a la afectacion global de la ruta critica, los atrasos no imputables, la exencion de penalidades y la posterior cuantificacion de mayores gastos generales variables y costos directos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 264 · Consultas · SOEC_SPV · 23/07/2026**

SOBRE LA VÍA TRANSVERSAL AL DISTRITO DE MIRAFLORES: De la consulta realizada por el contratista en el asiento 363.De la revisión preliminar de la observación efectuada, se advierte que la ausencia de un tratamiento pavimentado en la zona de empalme entre la vía vecinal y la vía departamental en la progresiva 3+750, podría generar riesgos vinculados al arrastre de material granular hacia la plataforma principal, colmat...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 256 · Consultas · SOEC_RESI · 22/07/2026**

SOBRE LAS RESPUESTAS DEL PROYECTISTA: Se solicita a la Supervisión requerir al Proyectista que sea consistente con la ingeniería de sus memorias de cálculo originales y valide formalmente que el Puente N° 01 se ejecute como un puente recto (esviaje 0°), lo cual mantendrá la estabilidad de los metrados contractuales y evitará mayores costos a la Entidad.Asimismo, se solicita a la Supervisión que, de persistir las inco...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
