


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra mejoramiento del servicio de movilidad urbana en AV. Sepulveda de centro poblado mariano melgar distrito de mariano melgar de la provincia de arequipa del departamento de arequipa, con CUI nº 2620939

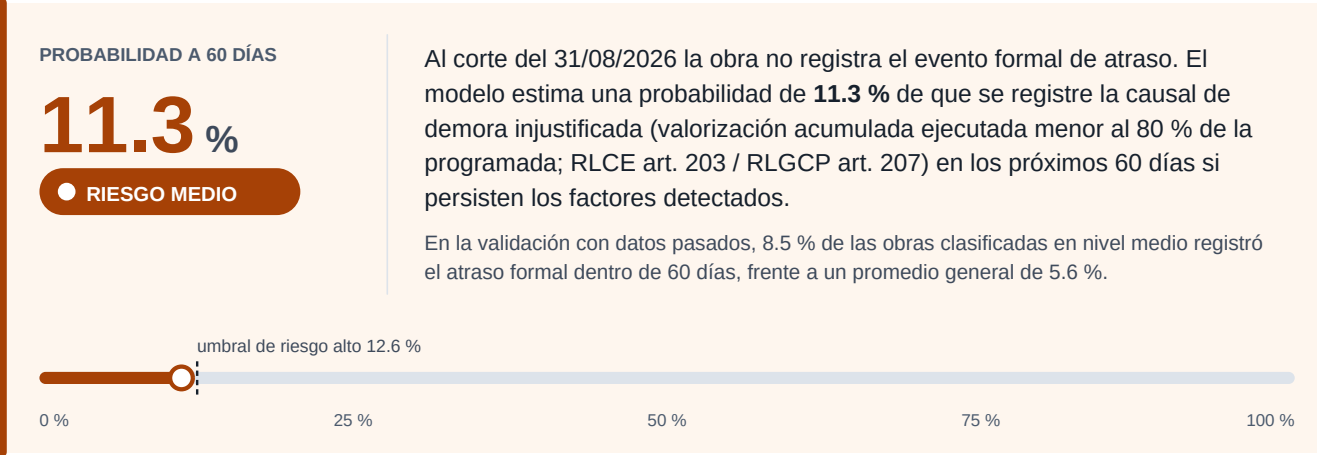


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	174 desde 03/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. SEPULVEDA DE CENTRO POBLADO MARIANO MELGAR DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI Nº 2620939
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
Contratista	CONSORCIO ARES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MARIANO MELGAR / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2620939
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. SEPULVEDA DE CENTRO POBLADO MARIANO MELGAR DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2402767
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,294,245.55
Cuaderno de obra digital	174 asientos entre 03/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

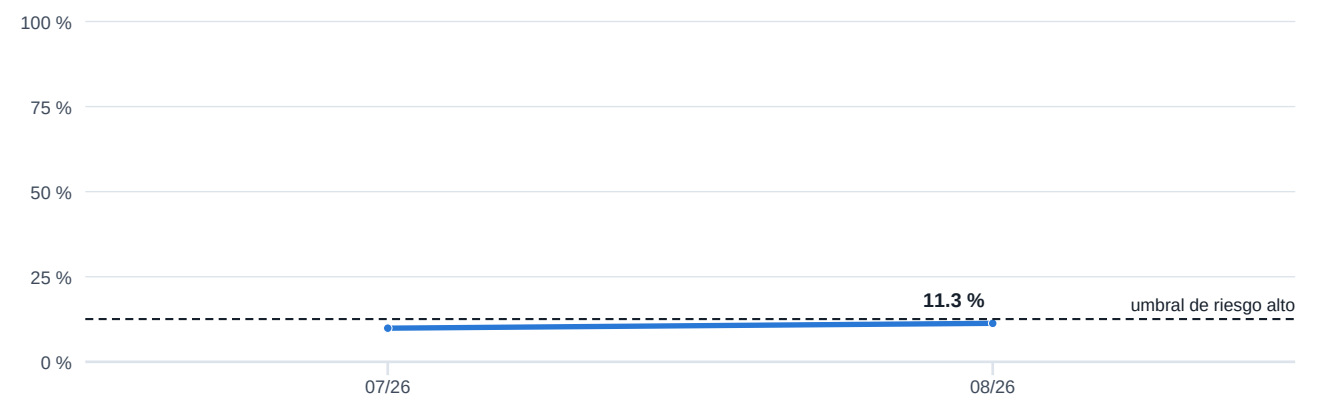

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.453
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.164
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.109
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.099
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.092
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.074
Extensión media de los asientos recientes: 628 caracteres	Contenido de los asientos		+0.068
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.067

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.3 %	11.2 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 142 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

...nsiderando que las partidas materia de consulta forman parte de la programacion vigente de la obra, la falta de respuesta y definicion tecnica podria afectar la continuidad de los trabajos, generando retrasos en la ejecucion y comprometiendo el cumplimiento de las metas y plazos contractuales.por lo expuesto, solicitamos se sirva disponer las acciones correspondientes a fin de que las consultas de obra ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 119 · Consultas · SOEC_RESI · 18/08/2026

SE REITERA CONSULTA N°12 – SOBRE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN MARTILLOS 1,2,3,6,7,8,9,10 Y 11.: SE REITERA CONSULTA N°12 , AQUÍ SE INFORMA QUE :a) Del replanteo efectuado en campo, se concluye que los martillos proyectados en el expediente técnico presentan diferencias respecto a la topografía existente, por lo que su ejecución conforme al diseño original afectaría la funcionalidad del tránsito peatonal.b) L...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 119 · Consultas · SOEC_RESI · 18/08/2026

...ia 26 de agosto del 2026 debemos iniciar con la construccion de martillos y culminar con los mismos el 8 de setiembre del 2026, de no obtener pronunciamiento alguno dentro de los plazo, se recaera en atraso, dicho causal de atraso no sera atribuible al contratista.mediante carta no 067-2026-mdmm.zeta

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 117 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_SPV · 17/08/2026

...or el material base colocado y la vereda previamente demolida, por lo cual el hallazgo de este buzón constituye un vicio oculto el cual se autoriza como ejecucion de mayor metrado a fin de no generar retrasos en la ejecucion de las partidas de concreto en veredas.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 118 · Consultas · SOEC_SPV · 17/08/2026

...cia remitir un informe reiterativo del grupo de consultas no11 a consultas no14, las cuales hasta la fecha no fueron absueltas, a fin de solicitar nuevamente pronunciamiento a la entidad y no generar retrasos en la ejecucion de trabajos de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 84 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 04/08/2026

SUPERVISION SE PRONUNCIA PARCIALMENTE ABSOLVIENDO LAS CONSULTAS: MEDIANTE CARTA N°023/2026-CONSORCIO AREQUIPA/RSECONSULTA N°09. ADOQUINES EN EL BLOQUE 04En relación a la ubicación de los adoquines grises y ocres, de acuerdo a la planilla de metrados de la partida 02.03.03.02. ADOQUINES DE CONCRETO DE 0.20X0.10X0.06 M, se indica "Ver Plano de Metrados (MET)". En dicho plano se detalla la ubicación de cada tipo de a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/07/2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS + PRESENTACION DE DOCUMENTACION: ACTIVIDADES EJECUTADAS:SE INFORMA QUE EL VIERNES 03 DE JULIO SE DIO INICIO LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE DEMOLICION DE VEREDAS Y BERMAS Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. EN EL SECTOR A,B Y C.EL SABADO 4 DE JULIO SE CONTINUO DEMOLICION DE VEREDAS Y BERMAS, Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. EN EL SECTOR D.GESTION ADMINISTRATIVA:EL SABADO 4 DE JULIO DEL...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
