


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la IOARR denominada: Reparación de Vías De Acceso, En El (La) Zonas Críticas de la Vía Departamental SM-113 entre las Progresivas KM 0+00: EMP. PE-5N (Nueva Cajamarca) Al Km 3+370: Ucrania Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia Rioja, Departamento San Martin con CUI 2652491

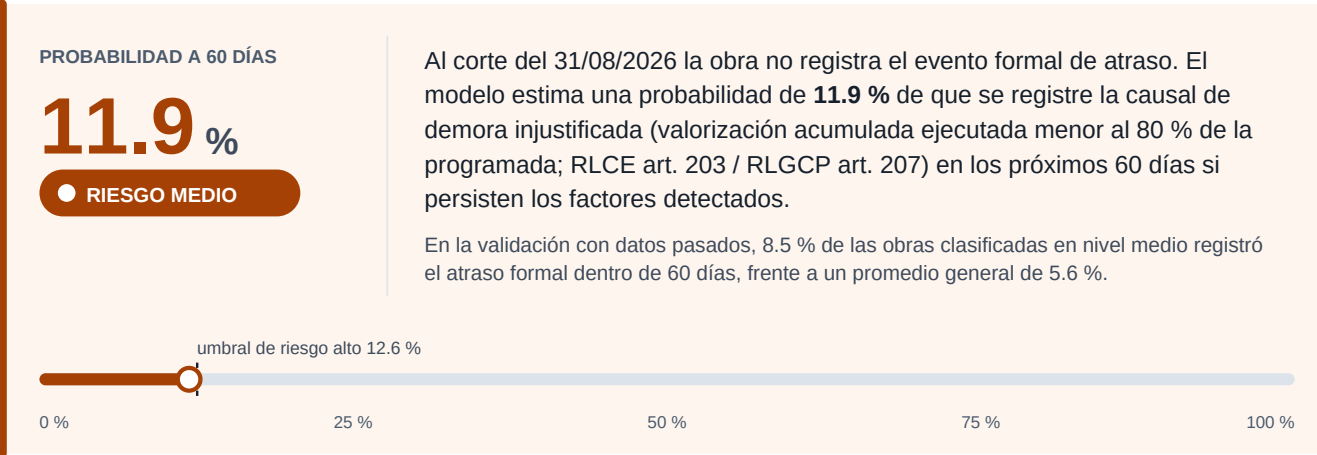


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	259 desde 13/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Contratación de la ejecución de la IOARR denominada: Reparación de Vías De Acceso, En El (La) Zonas Críticas de la Vía Departamental SM-113 entre las Progresivas KM 0+00: EMP. PE-5N (Nueva Cajamarca) Al Km 3+370: Ucrania Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia Rioja, Departamento San Martin con CUI 2652491
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR UCRANIA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	NUEVA CAJAMARCA / RIOJA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2652491
Inversión asociada	REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA DEPARTAMENTAL SM-113, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+00: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA) AL KM 3+370: UCRANIA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2374626
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,609,545.46
Cuaderno de obra digital	259 asientos entre 13/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

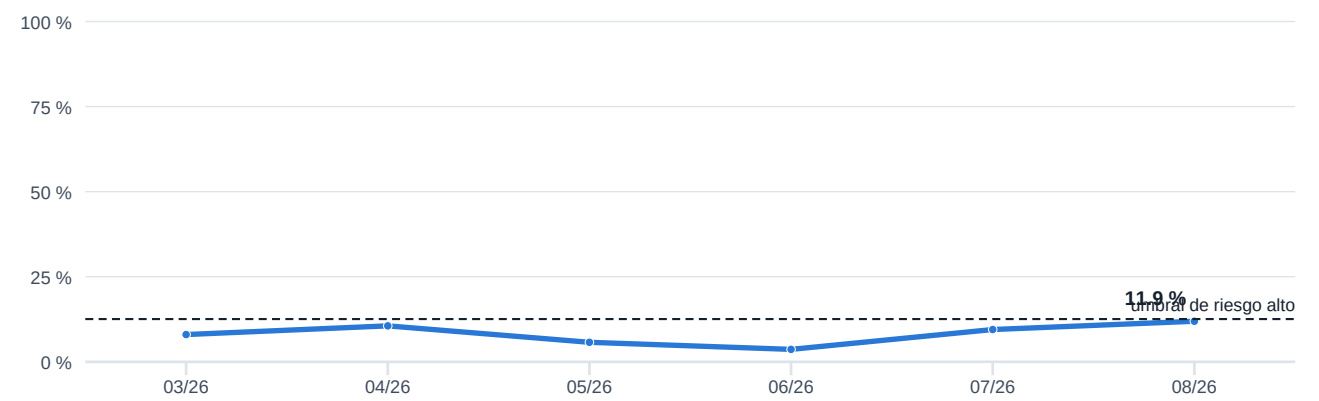

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.178
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.166
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.139
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.130
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.43 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.104
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.086
Extensión media de los asientos recientes: 1,187 caracteres	Contenido de los asientos		-0.066
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.055

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.9 %	10.5 %	-1.4 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.9 %	11.9 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.9 %	12.2 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 255 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 30/08/2026

...tangular con altura interna de 0.45 m. la solución planteada evita la interferencia con las conexiones domiciliarias, acorta significativamente los tiempos y costos de trámite y ejecución, y previene retrasos en el plazo contractual. se dispone que la supervisión de obra efectúe la evaluación técnica y contractual de las partidas involucradas, determinando los metrados incrementados, reducidos o nuevos,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 242 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_RESI · 26/08/2026

SOLICITA EJECUCIÓN DE MAYOR METRADO: PARTIDA 06.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PERTENECIENTE A LA PARTIDA 0.6.02 ALCANTARILLAS – COMPONENTE DE DRENAJE PLUVIAL (DEL CONTRATO PRINCIPAL): Mediante CARTA N° 100-2026-CEU/ETV/RC, el representante común del Consorcio Ucrania presentó el INFORME N° 040-2026-CEU/EWBB/RO (residente de obra) comunicando la Ejecución de mayor metrado PARTIDA 06.02.02.04 RELLENO CON MA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 241 · Consultas · SOEC_SPV · 26/08/2026

RESPUESTA AL CONTRATISTA, LA CONSULTA 16: Con fecha 22 de agosto de 2026, el contratista, mediante Carta N° 097-2026-CEU/ETV/RC, remite a esta supervisión la consulta N° 16 sobre “Necesidad de proyectar una cuneta de pase para la descarga pluvial de la cuneta lateral derecha en la progresiva Km 00+960.49, aliviando el caudal pluvial de la cuneta longitudinal, mediante la descarga con una cuneta de pase hacia el Jr. ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 239 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...1 medio día. el día de hoy también están suspendidas las actividades por efectos de las lluvias que se dieron durante la mañana, provocando saturación del suelo en diferentes puntos de trabajo. estos retrasos en obra vienen afectando partidas de la ruta crítica tales como: capa con mejoramiento de over 4 a 6”, partida conformante de la estructura del pavimento, así mismo no se pueden realizar partidas ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 237 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

retrasos en avance de obra por factores no atribuibles al contratista. a la fecha se deja constancia que solo se han realizado parcialmente las actividades descritas en el asiento anterior con rendimientos...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 233 · Consultas · SOEC_SPV · 21/08/2026

RESPUESTA AL CONTRATISTA, [CONSULTA 15: “NECESIDAD DE PROYECTAR UNA CUNETA DE PASE PARA LA DESCARGA PLUVIAL DE LA CUNETA LATERAL DERECHA EN LA PROGRESIVA KM 00+228.29”]: Con fecha 20 de agosto de 2026, el contratista, mediante Carta N° 095-2026-CEU/ETV/RC, remite a esta supervisión la consulta N° 15 sobre “Necesidad de proyectar una cuneta de pase para la descarga pluvial de la cuneta lateral derecha en la progresiva...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
