


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud la revolución (nivel I-4), distrito de san miguel - san román - puno.

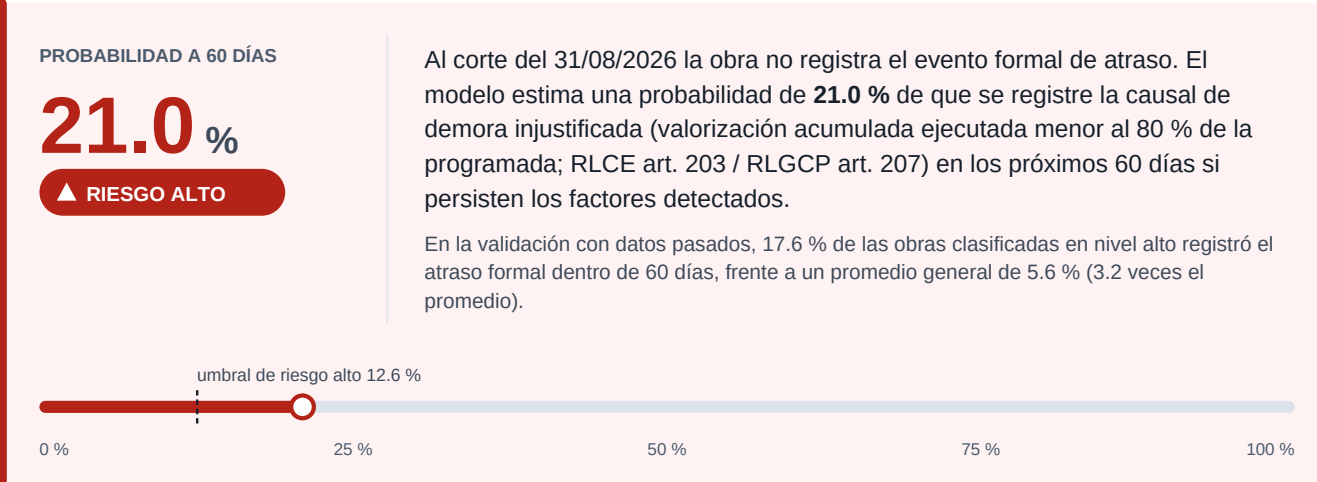


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	101 desde 22/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCIÓN (NIVEL I-4), DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN ROMÁN - PUNO.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SIMON BOLIVAR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JULIACA / SAN ROMAN / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2435272
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCIÓN (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2395466
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 30,858,420.92
Cuaderno de obra digital	101 asientos entre 22/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

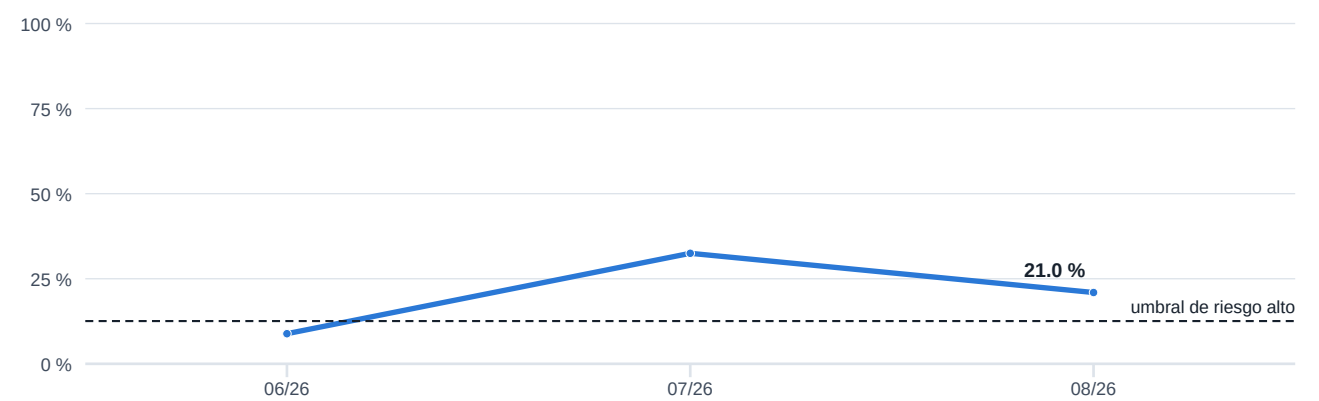

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.84 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.770
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.250
El 65 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.187
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 15,205,310	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.144
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.131
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.129
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.112
3 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.102

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	21.0 %	18.1 %	-2.9 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	21.0 %	20.7 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	21.0 %	21.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 101 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...2 ante el supervisor y ante la entidad (mesa de partes del gobierno regional puno) para verificar el cumplimiento de plazos segun el art. 210.2 del reglamento de la lgcp. evaluacion individualizada y penalidades: se requiere la revision detallada e individualizada del estado de subsanacion de observaciones, asi como el deslinde y control de permanencia del personal clave en obra para evaluar probables pena...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 98 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

... para que remita a la supervision el descargo correspondiente debidamente documentado (partes diarios, registros de asistencia o justificaciones aprobadas) sobre la ausencia del citado personal, bajo apercibimiento de aplicar las penalidades contractuales que correspondan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 92 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...ecialista bim (implementacion bim)por lo expuesto, se requiere al contratista la reincorporacion inmediata de la totalidad de dicho personal en un plazo maximo e improrrogable de 48 horas. en caso de incumplimiento, se procedera con la aplicacion de las penalidades contractuales correspondientes por ausencia del personal clave.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 90 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...ndiente. plazo: se concede un plazo perentorio de un (01) dia calendario contados a partir de la notificacion formal para remitir el expediente corregido con toda la documentacion sustentatoria, bajo apercibimiento de ley.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 87 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...y apruebe formalmente el diseno de mezclas solicitado. se requiere al contratista subsanar esta omision a la brevedad posible con la finalidad de garantizar la calidad estructural de la obra y evitar retrasos en la programacion fisica.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 69 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026

REITERACION DE LA PRESENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA: SE REITERA AL RESIDENTE QUE, DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE CALIDAD DE OBRA EN UN PLAZO DE UN DIA CALENDARIO CASO CONTRARIO NO SE AUTORIZARAN LOS TRABAJOS EN OBRA.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 66 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 27/07/2026

...umplio con advertir las incompatibilidades presentes entre los planos contractuales y advertir un desfase en las vías mediante el plano contractual del levantamiento topografico, en consecuencia, los atrasos que se puedan generar en obra son atribuibles a la entidad ya que hasta la fecha no esta absolviendo la consulta no01se adjunta al presente el informe tecnico n007-2026-csr/jom-ro, que sustenta el ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 53 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 16/07/2026

INICIO DE AFECTACION DE LA RUTA CRITICA - EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PARA CIMENTACIONES PROFUNDAS: (...VIENE)DETALLE DEL RIESGO NO PREVISTO: Falta de absolución de consulta N°01, debido a que en el Expediente Técnico los documentos que lo componen, considerados en su conjunto, no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra (Niveles Topográficos)EFECTO DEL RI...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 53 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 16/07/2026

...o asociado, sin embargo, al tratarse de una deficiencia del expediente técnico al no tener toda la documentación pertinente o posible inexistencia del mismo, no se le puede atribuir al contratista el atraso que se esta generando por falta de absolucion de la consulta no 01.adjunto al presente la carta no023-2026/csr/rl

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
