


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

construccion de infraestructura de salud para el proyecto mejoramiento y ampliacion del servicio de atencion de salud basicos en buena vista del distrito de cusco-cusco-cusco

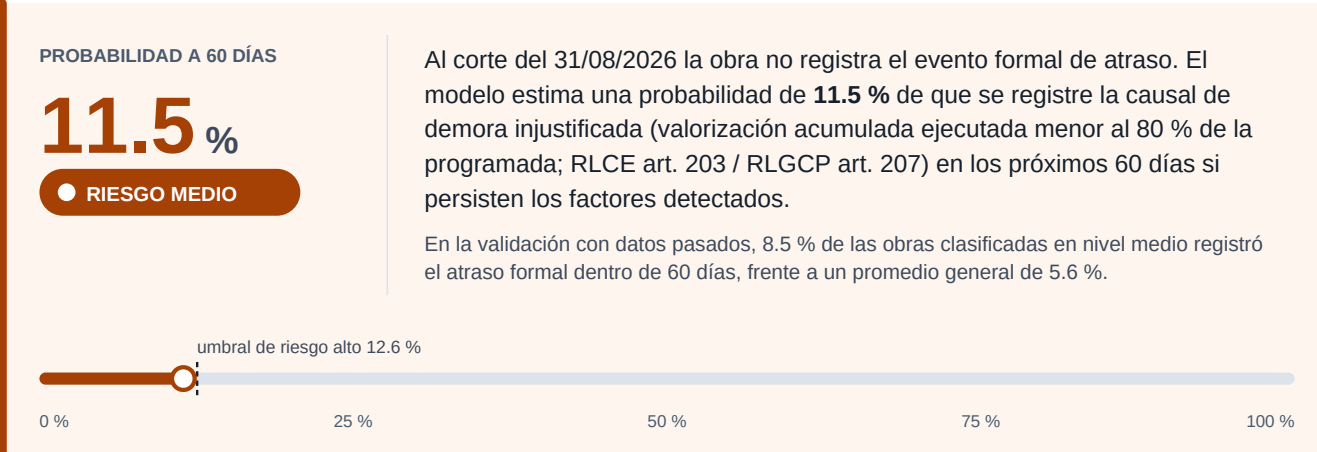


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 22,769,997.74	450 días	315 desde 24/12/2025	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-CUSCO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Contratista	AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CUSCO / CUSCO / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2643660
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN BUENA VISTA DISTRITO DE CUSCO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2359890
Monto del contrato	S/ 22,769,997.74
Monto aprobado de la inversión	S/ 14,770,362.45
Cuaderno de obra digital	315 asientos entre 24/12/2025 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

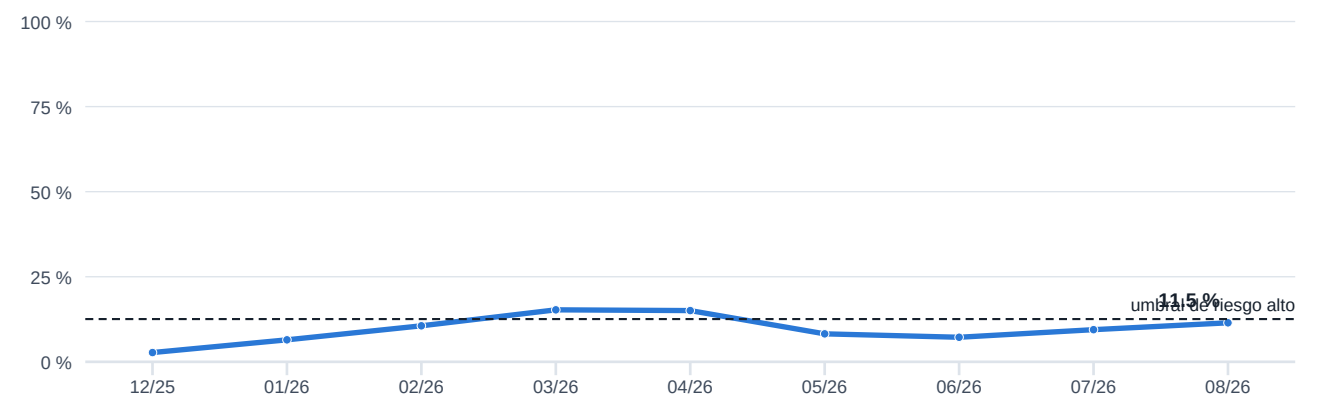

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.546
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.181
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.165
Faltan 203 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		-0.160
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.159
Departamento: Cusco	Características de la obra		-0.115
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.088

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.5 %	11.5 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	11.5 %	11.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 311 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...coordino los trabajos de la obra principal y de los trabajos de contingencia.se exhorta al ejecutor que con la presencia del personal clave o especialistas, hace que la obra no tenga interferencias o retraso en la ejecucion de la obra.con la presencia de personal clave en obra se esta cumpliendo el contrato del contractual, en estricto cumplimiento y concordancia con su cronograma de participacion de pe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 309 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...estructura del contratista ats. presentar propuesta o detalle tecnico correspondiente a los traslapes de acero longitudinal y vertical indicando las longitudes y demas consideraciones tecnicas para no retrasar la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 307 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...as y arquitecto, para el dia jueves 27/08/2026, para realizar trabajos urgentes solicitados en el avance de obra, del cual coordinadamente puedan dar soluciones en base al expediente contractual y no retrasar los trabajos a ejecutar en la obra principal y los trabajos de la infraestructura antigua de adobe de contingencia. nota: se tubo presencia en obra el ing. joel zamalloa gerente de infraestructura ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 302 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

del supervisor de obra . en obra en la presente fecha se vienen ejecutando los siguientes trabajos:se dejaron de trabajar en el fondeado de la losa llena de la parte baja de la obra. a falta de personal.se continuo con el colocado de concreto $f_c = 140 \text{ kg/cm}^2$ + 30 % de piedra en cimientos corridos.relleno y compactado con material propio en capas de 20cm de espesor, con material propio selecto, del ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 300 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

del supervisor de obra . en obra en la presente fecha de 18/08/2026, en relacion con la carta n. 062-2026-mpc-gi-sgo-cerg, mediante la cual la entidad mpc. comunica el cambio de residente de obra y designacion del ing. fidencio bruno cruz, con cip n. 84283, conforme a lo establecido en el articulo 182 del reglamento de la ley n. 32069, por lo que se deja constancia que a partir del 19...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 296 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...o los trabajos en contingencia.funcionarios de la entidad mpc. de la oficina de gerencia de supervision, presentes en obra para verificar las actividades en obra como tambien para coordinar sobre las penalidades del personal clave de los ejecutores contratistas ats.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 284 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

... contratista la presentacion del programa de ejecucion y los calendarios contractuales actualizados. a la fecha, dicha documentacion no ha sido alcanzada, con lo cual se estaria evidenciando un claro incumplimiento a las ordenes impartidas por la supervision de obra.al respecto, se recuerda al contratista lo dispuesto en el art. 206.1, el cual establece que: "el contratista presenta el programa de ejecuc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 269 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

.... donde gerencia general ats. realiza imprecisiones no reales sobre la participacion de sus especialistas segun su contrato. la falta de presencia de los especialistas o personal clave en obra, viene retrasando los trabajos en obra, por lo que esta supervision se ratifica que los especialistas, que tienen participacion al 100% deben permanecer en obra.para hoy dia se programo el replanteo de todo el sis...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 266 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026**

DEL SUPERVISOR DE OBRA: Al Ing. Residente se le indica que, para continuar con la ejecución de la partida OE.02.01.03.01 – Relleno y Compactado con Maquinaria, Material Propio, se deberá presentar el plano de replanteo correspondiente a la partida 03.01 – Sistema de Drenaje, del Adicional de Obra N.º 02.Dicho plano deberá contener las secciones y detalles constructivos, indicando la ubicación de las siguientes parti...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 260 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026**

OTRAS OCURRENCIAS: El día de hoy se continúa con los trabajos de la partida, OE.02.01.03.01 RELLENO Y COMPACTADO C/ MAQUINARIA MAT. PROPIO, asimismo, se indica que deberán continuar realizándose las pruebas de densidad de campo en cada capa ejecutada, a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.Se requiere la presentación de las fichas técnicas de los insu...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 261 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026**

OTRAS OCURRENCIAS: Se reitera al Ejecutor la obligación de presentar el plan de trabajo correspondiente a las partidas por ejecutar con una anticipación mínima de quince (15) días calendario respecto a la fecha prevista para el inicio de su ejecución, a fin de realizar la revisión y aprobación correspondiente.Asimismo, se precisa que dicho plan de trabajo deberá incluir la secuencia constructiva, cronograma de ejecuc...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
