


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

"mejoramiento de las salas de aislamiento respiratorio para pacientes bk positivos en el servicio de medicina interna N1 - infectología y vih del hospital nacional guillermo almenara irigoyen de la red asistencial almenara - essalud, distrito la victoria"

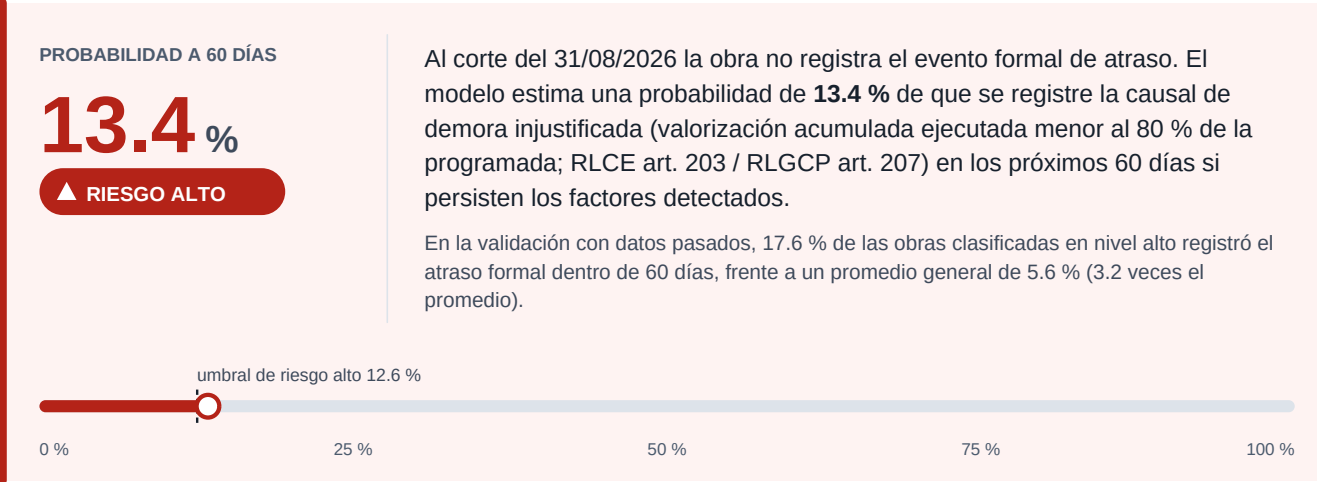

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	62 desde 03/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	"MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA N1 - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO LA VICTORIA"
Entidad contratante	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Contratista	CONSORCIO QUISPE ESSALUD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2405561
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA N1-INFECTOLOGIA Y VIH DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA-ESSALUD, DISTRITO LA VICTORIA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2404657
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,501,646.00
Cuaderno de obra digital	62 asientos entre 03/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.627
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.186
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.162
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.143
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.75 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.108
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.091
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.088
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.086

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.4 %	13.3 %	-0.1 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.4 %	13.9 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 45 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

... con la oficina de ingeniería del hospital para que procedan con la remoción y/o reubicación de la red eléctrica y el punto de oxígeno indicados con carácter de urgencia y evitar que dichos elementos retrasen la programación de los trabajos contratados. se adjunta archivo pdf con asiento y fotos

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

... n 25 de fecha 12.08.2026 se solicita al inspector coordinar con el especialista de instalaciones sanitarias proyectista de la entidad y proponer la solución con carácter de urgencia y evitar mayores atrasos en nuestra programación vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 20/08/2026

OTRAS OCURRENCIAS: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A RITMO REGULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS PRELIMINARES, EN LO QUE CORRESPONDE AL ASIENTO 41, EN LA QUE SE SEÑALA, QUE EN LOS PLANOS DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIGUETAS DE AMARRE EN LOS MUROS DE LADRILLO, ESTA INSPECCIÓN REALIZA LA CONSULTA AL PROYECTISTA A FIN DE ACLARAR DICHA INTERROG...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 16/08/2026

INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: Se deja constancia que el día de hoy 16.08.2026 se inicia la causal de ampliación de plazo N° 01 referida a la ejecución de la actividad ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, como consecuencia de imposibilidad de poder realizar la instalación de la armadura de acero en las zapatas Z6, Z7 y Z9, ya que la tubería de desagüe existente en su trazo de recorrido interfiere, intercepta y que...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 16/08/2026

...dancia con lo estipulado en los artículos n 198 y n 200 del reglamento de la ley n 32069-ley general de contrataciones públicas, se deja constancia del inicio de la causal como consecuencia de: a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. se adjunta archivo pdf de asiento con deta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 16/08/2026

...dancia con lo estipulado en los artículos n 198 y n 200 del reglamento de la ley n 32069-ley general de contrataciones públicas, se deja constancia del inicio de la causal como consecuencia de: a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. se adjunta archivo pdf de asiento contenie...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 19 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 11/08/2026

CALENDARIOS: Se deja constancia que el Contratista viene ejecutando la obra a un ritmo regular en lo que corresponde a los trabajos preliminares, asimismo señalar respecto a la inscripción en el asiento N° 16 del cuaderno del obra del 09 de agosto de 2026, el residente de obra manifiesta que SE ADJUNTA EN EL PRESENTE ASIENTO LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN PARA QUE EL INSPECTOR PROCEDA CON SU REVISIÓN Y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
