


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de la obra "creacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado juan velasco iii etapa del distrito de chancay - provincia de huaral - departamento de lima - ii etapa CUI N°2454881.

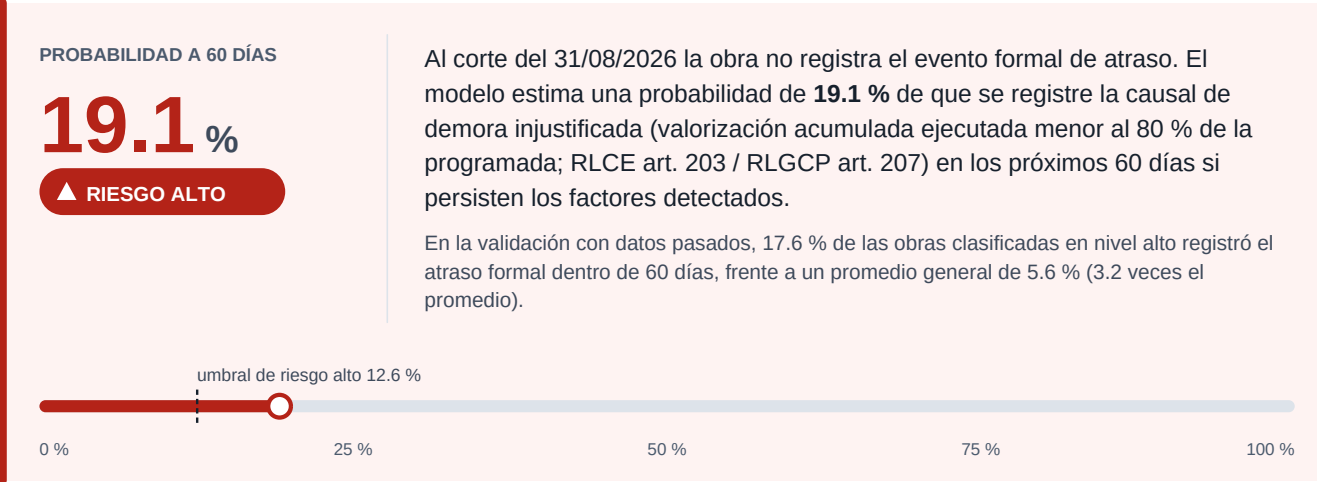


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	436 desde 10/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO III ETAPA DEL DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA - II ETAPA CUI N°2454881.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY - HUARAL
Contratista	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHANCAY / HUARAL / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2454881
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO III ETAPA DEL DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2348465
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,137,898.74
Cuaderno de obra digital	436 asientos entre 10/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

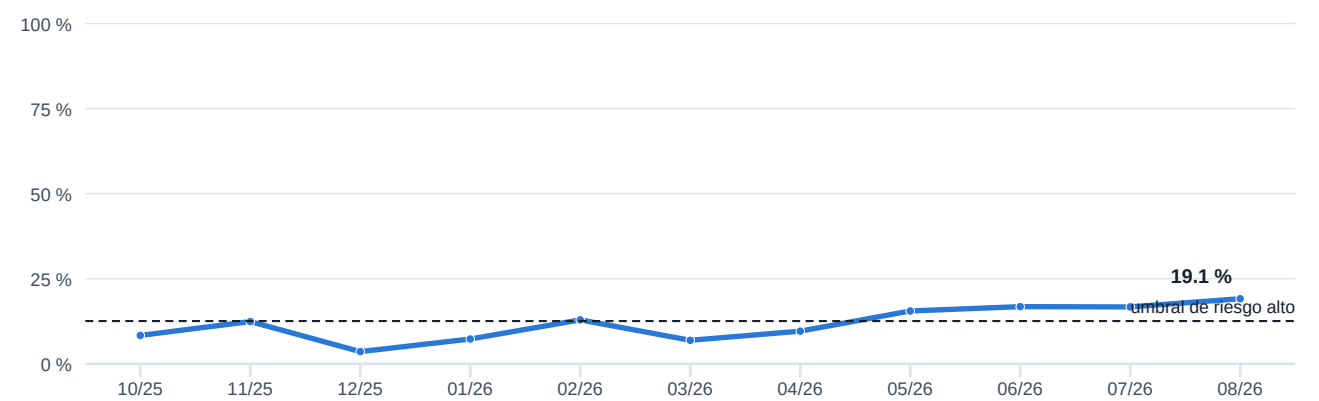

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.486
El 37 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.241
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.230
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.156
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.096

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	19.1 %	19.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 425 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

...por lo expuesto, esta residencia continuara registrando y cuantificando los días en que persista dicha afectación hasta la emisión del pronunciamiento correspondiente, para su posterior sustento como retraso justificado, al constituir una circunstancia no atribuible al contratista que incide directamente en la ruta crítica y en el normal desarrollo del cronograma de ejecución de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 421 · Órdenes · SOEC_INSP · 25/08/2026

REGISTRO DE CUADERNO DE OBRA: EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 188 DEL RLGP, EL RESIDENTE DE OBRA DEBE DE ANOTAR LOS PRINCIPALES HECHOS QUE OCURRAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, APROBACIONES O PARTIDAS A REALIZARSE, CONSULTAS, ENTRE OTROS, DE TAL MANERA QUE SE PERMITA LLEVAR UN ADECUADO CONTROL ADMINISTRATIVO SOBRE LA OBRA. EN ESE SENTIDO, SE EXHORTA AL RESIDENTE DE OBRA, MANTENER ACTUALIZADO EL CUADERNO DE INCIDENCI...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 427 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 25/08/2026

... el adicional de obra n 02 en sistema de agua y alcantarillado, por lo que mientras no se culmine dichas actividades, no podría culminar la ejecución de lo considerado en el adicional n03, y que toda demora de manera injustificada es atribuible al contratista.2. la obra se encuentra desarrollándose fuera del plazo otorgado, por lo que, no se tiene certeza sobre que afectación de la ruta crítica del prog...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 418 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

...ia de supervisión efectiva.por consiguiente, se procedera a cuantificar el periodo de afectación comprendido desde el 01 de agosto de 2026 hasta el 20 de agosto de 2026, para efectos del sustento del retraso justificado correspondiente, por tratarse de una situación ajena a la responsabilidad del contratista. a partir de la culminación de la presente causal, se continuara con la ejecución de las activid...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 417 · Órdenes · SOEC_INSP · 20/08/2026

CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA: CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2026, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY COMUNICO LA CARTA N°229-2016-SGOPIEY/MDCH, COMUNICANDO LA DESIGNACIÓN DEL ING DARYL JOEL ROCHA SEVILLANO COMO INSPECTOR DE LA OBRA, POR LO QUE, EL RESIDENTE DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DESDE EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2026, EN E...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 414 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...e obra continuara efectuando el registro y cuantificación de los días en los que persista la ausencia del supervisor, con la finalidad de sustentar oportunamente ante la entidad el reconocimiento del retraso justificado y/o la ampliación de plazo que pudiera corresponder, por tratarse de una situación no atribuible al contratista que afecta el normal desarrollo de la ejecución contractual.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 417 · Órdenes · SOEC_INSP · 20/08/2026

...rantizar la calidad técnica de obra, con buenas prácticas de procedimiento constructivo, calidad y mitigación ambiental, identificación de riesgos propios a la obra y a la población aledana, y que el incumplimiento de las estipulaciones contractuales por parte del residente y contratista que no permitan culminar con la obra, podrá ser considerado como causal para la intervención económica.cabe recordarle...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 373 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/07/2026

TRABAJOS EJECUTADOS: el día de hoy se realizaron la habilitación de acero y encofrado para muro pequeño mt2.

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 369 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026**

...cero para la armadura correspondiente a muro de contencion. observaciones: en la fecha, durante la inspeccion en los diferentes frentes de trabajo, la supervision ha constatado graves reiteraciones e incumplimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo (norma g.050 y ley n29783) por parte del contratista, detallandose lo siguiente:1. ausencia de delimitacion perimetral global:falta de delimit...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 366 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026**

observaciones por falta de medidas de seguridad . incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo (sst)observaciones:1. en la fecha, esta supervision observo que el personal asignado a los trabajos de excavacion profunda labora sin la implementacion de sí...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 354 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026**

...dad y la empresa contratista, mantener la identificacion de la obra que se encuentra en ejecucion.en tal sentido, la omision de reinstalacion de dicho cartel de obra puede generar la penalizacion por incumplimiento de dicha actividad.2. al cierre de este informe se evidencia con registro fotografico la ausencia de elementos de seguridad en la zona de trabajo de la obra. por lo cual se hace el llamado de ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 341 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/07/2026**

OBSERVACIONES DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN OBRA: OBSERVACIONES:Se ha verificado durante la inspección de campo, en los diferentes frentes de trabajo, el incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte del Contratista, vulnerando lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y la Norma Técnica G.050 "Seguridad durante la Construcción".Específicamente, se ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
