


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: "ampliacion del servicio de movilidad urbana en las vias locales de la localidad de san miguel de mayocc del distrito de san miguel de mayocc de la provincia de churcampa del departamento de huancavelica¿ CUI N° 2691760

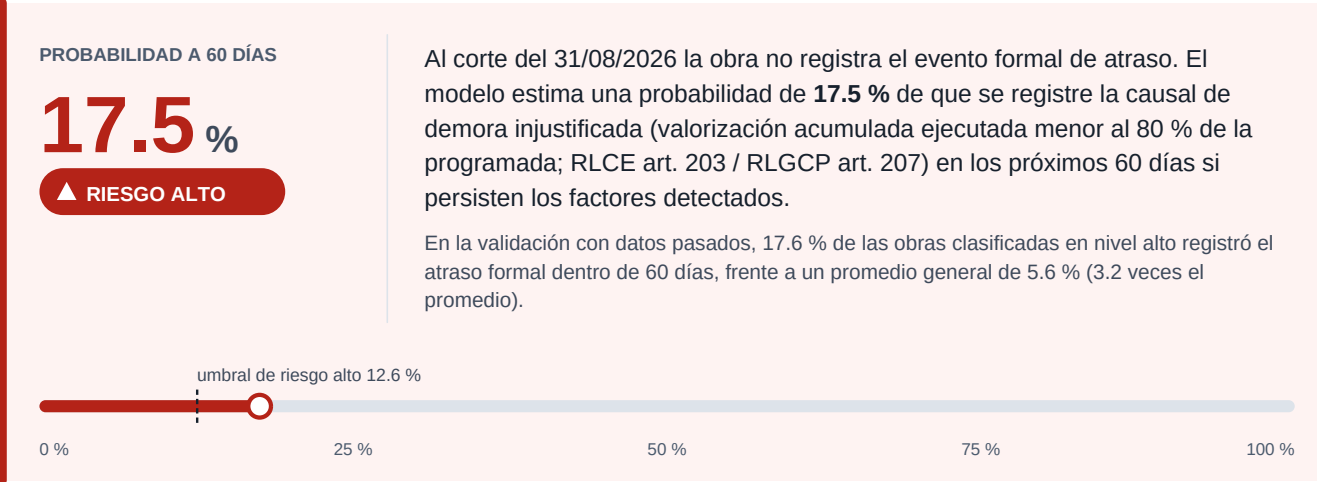

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	123 desde 05/01/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE MAYOCC DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA¿ CUI N° 2691760
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC
Contratista	CONSORCIO GRUPO G.P&J
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN MIGUEL DE MAYOCC / CHURCAMP / HUANCAMELICA
Código Único de Inversión (CUI)	2691760
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE MAYOCC DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2368822
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,693,901.71
Cuaderno de obra digital	123 asientos entre 05/01/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.496
El 73 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.245
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.214
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.189
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.128
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.123
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Extensión media de los asientos recientes: 1,537 caracteres	Contenido de los asientos		-0.074

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.5 %	17.0 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	17.5 %	17.5 %	-0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	17.5 %	17.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 122 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

control tecnico diario correspondiente al sabado 29 de agosto de 2026 y justificacion de retraso en registro por indisponibilidad del sistema. . esta jefatura de supervision deja constancia expresa que el sabado 29 de agosto de 2026 intento registrar de forma reiterada el control diario de obra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 116 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

EMISIÓN Y TRASLADO DEL INFORME TÉCNICO-LEGAL N.º 012-2026-CCGF/HECZ SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 01 Y CONTROL DE TRABAJOS DIARIOS.: En la fecha, el Jefe de Supervisión de Obra, Ing. Henry Eduard Cordero Zamora (CIP N.º 280379), en representación de la empresa Consultores & Contratistas Generales Forept S.A.C., realiza la siguiente anotación digital en el cuaderno del proyecto:Se comunica el cierr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 108 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 20/08/2026

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 01: PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.º 01En la fecha, el suscrito Residente de Obra deja constancia que, en mérito a los hechos registrados oportunamente en el Cuaderno de Obra, particularmente en los Asientos N.º 48 y N.º96, relacionados con las interferencias existentes en el Jr. Simón Bolívar, cuadra 02, y Calle Cuatro, cuadra 01, l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...en portales web externos no constituyen causal contractual valida para restringir o condicionar la continuidad de los frentes de trabajo, siendo de responsabilidad exclusiva del contratista cualquier retraso.para la conformidad, aprobacion y valorizacion de los metrados de concreto, encofrados y subbase ejecutados hoy, es requisito mandatorio que la residencia regularice el control diario de estos recur...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...e hoy, el residente de obra no ha registrado ningun asiento diario de actividades, rompiendo el tracto sucesivo obligatorio. conforme a la clausula decimoquinta del contrato principal, se constata el incumplimiento del ítem 14. asimismo, se recuerda que los terminos de la absolucion dictada por esta supervision en el asiento n 94 de fecha 10 de agosto de 2026 se mantienen firmes e inalterables, estando e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 89 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

PRECISIONES NORMATIVAS SOBRE CONTROL DIGITAL DIARIO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EN CAMPO.: se le recuerda a la Residencia que la obligatoriedad del registro diario y el tracto sucesivo se sustentan en el numeral 191.2 del Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF) y en el numeral 7.1.1 de la Directiva N.º 009-2020-OSCE/CD. Esta Supervisión se encuentra en total a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
