


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de obra: Recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado huaynacancha, distrito de la oroya, provincia de yauli, departamento de junín.

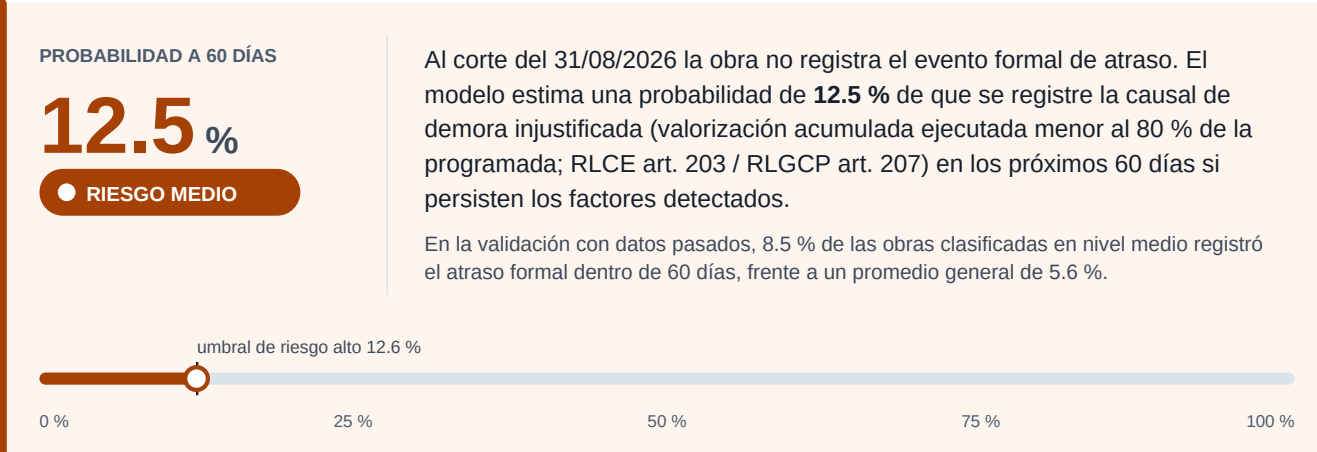


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 55,667,410.98	1110 días	252 desde 13/08/2025	27/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
Entidad contratante	EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC
Contratista	CONSORCIO SAN ANDRES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA OROYA / YAULI / JUNIN
Código Único de Inversión (CUI)	2403473
Inversión asociada	RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Función	AMBIENTE
Identificador del contrato (SEACE)	2340278
Monto del contrato	S/ 55,667,410.98
Monto aprobado de la inversión	S/ 10,157,844.00
Cuaderno de obra digital	252 asientos entre 13/08/2025 y 27/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

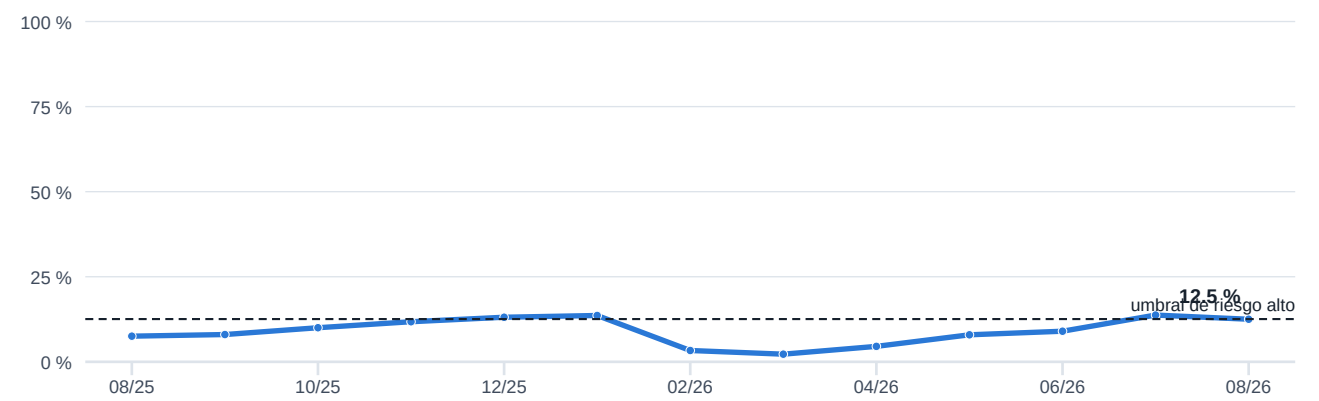

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.692
Faltan 727 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		-0.297
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.209
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.158
Departamento: Junín	Características de la obra		-0.125
3 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
El último asiento se registró hace 4 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.109
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.083

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.5 %	12.2 %	-0.3 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.5 %	12.3 %	-0.2 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	12.5 %	12.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 244 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/08/2026

...acion sustentatoria, sin que ello implique por si solo la aprobacion o reconocimiento de los mayores metrados que pretenden ser valorizados.respecto de la afirmacion del contratista referida a que la demora en la atencion de la documentacion podria afectar el equilibrio economico del contrato, se precisa que la supervision no viene desconociendo ni negando el derecho que pudiera corresponder al contrati...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 241 · Consultas · SOEC_RESI · 20/08/2026

...shvpor lo tanto, se hace la consulta si los planos mencionados cumplen con lo requerido por la supervision, toda vez que de esta respuesta depende el tramite de valorizacion de mayores metrados, cuya demora podria afectar el equilibrio economico y, ante cualquier negativa, vulnera el principio de equidad del articulo 2 de la ley de contrataciones del estado.por lo antes expuesto, solicitamos se tramite ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 239 · Elaboración de expediente técnico de obra · SOEC_SPV · 19/08/2026

...aciones formuladas al expediente tecnico del adicional de alcantarillas, las cuales fueron comunicadas mediante carta n037-2026-cps-0088, de fecha 30/03/2026.al respecto, se deja constancia de que el retraso de ciento cuarenta y un (141) dias es de exclusiva responsabilidad del contratista. en ese sentido, la supervision procedera a evaluar el expediente tecnico de conformidad con lo establecido en el n...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 237 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 11/08/2026

ABSOLUCIÓN CONSULTA N°08: SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE SEMILLAS, PARA LA META ESTABILIDAD BIOLÓGICA: En relación con la consulta reiterada formulada por el Contratista respecto a la sustitución de semillas para la meta– Estabilidad Biológica, registrada en el Asiento N.º 224 del Residente de Obra y sustentada mediante Informe Técnico N.º 09-2026-JBS, de fecha 24/07/2026, se deja constancia que dicha consulta fue comunicad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 235 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 10/08/2026

ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N° 07, SOBRE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA + UREA Y PLANTACIÓN DE ESQUEJES: Se deja constancia que, según los siguientes registros: Asiento N°215, Asiento N°216, Asiento N°217, del Residente de obra, fecha 18/07/2026 y el Informe Técnico N°008-2026 JBS, 18/07/2026, el Contratista formuló consulta respecto a la modificación del procedimiento establecido para la aplicación de l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 227 · Consultas · SOEC_SPV · 27/07/2026

EVALUACION DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS, DEBE SER RESUELTA POR EL PROYECTISTA: En atención a la consulta del asiento N°224 e Informe Técnico N°09-2026-JBS, sobre la sustitución y distribución de las ocho (8) semillas con fines de cumplir con la estabilidad biológica. La Supervisión evaluó la propuesta y emite opinión técnica FAVORABLE a la sustitución de Calamagrostis vicunarum, Bromus catharticus y Poa horridula ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 220 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 23/07/2026

... dia de hoy se realizo la entrega a la supervision de obra (con copia a la entidad), la carta n 31-2026/csa huaynacancha, mediante la cual se formaliza la solicitud de ampliacion de plazo n 01 por el atraso por la imposibilidad de ejecutar partidas contractuales por causas no atribuibles al contratista, especificamente la partida 02.01.01 limpieza de terreno y partidas sucesoras, debido a que no se pue...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 214 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026**

...jecucion de las partidas aprobadas, de conformidad con el calendario de ejecucion presentado. sin embargo, a la fecha no ha iniciado la ejecucion de dichas partidas, por lo que se deja constancia del incumplimiento y se le requiere el inicio inmediato de los trabajos, en observancia de sus obligaciones contractuales y del cronograma vigente.se realizo la inspeccion de las zanjas de infiltracion correspon...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 211 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026**

infraccion n02, tabla b, penalidades por incumplimiento de las normas de seguridad . de acuerdo con la inspeccion de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (ssoma) realizada en obra el dia 07 de julio de 2026, con la participac...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
