

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en el establecimiento de salud de lares del distrito de lares de la provincia de calca del departamento de cusco¿

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

13.2 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **13.2 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	137 desde 20/04/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LARES DEL DISTRITO DE LARES DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO¿
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES
Contratista	CONSORCIO SALUD LARES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LARES / CALCA / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2638771
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LARES DEL DISTRITO DE LARES DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2371781
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 12,332,701.91
Cuaderno de obra digital	137 asientos entre 20/04/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

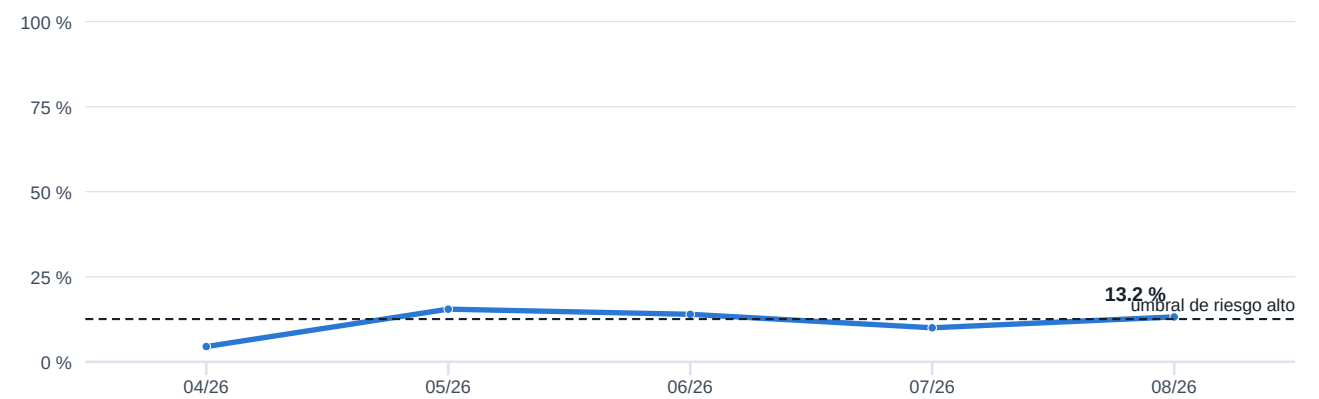

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.466
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.155
9 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.104
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.086
Extensión media de los asientos recientes: 1,166 caracteres	Contenido de los asientos		-0.056
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.050
9 asientos de respuestas a consultas en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.046

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.2 %	13.0 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.2 %	13.2 %	-0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 127 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

asiento 127 del residente de obra . en atencion al siento n 108 del inspector de obra, se emite el informe n. 49-2026-jjsl-ro sustentando la demora en la culminacion de las partidas correspondientes al local de contingencia. se precisa que dicha demora esta relacionada con las consultas efectuadas durante la ejecucion y con la necesidad de las p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 120 · Consultas · SOEC_RESI · 17/08/2026

ASIENTO 120 DEL RESIDENTE DE OBRA: EN RELACIÓN CON LA CONSULTA N.° 06 FORMULADA MEDIANTE ASIENTO N.° 23 Y REITERADA MEDIANTE ASIENTO N.° 83, REFERIDA A LA FALTA DE PLANO Y MEMORIA DE ACABADOS, ASÍ COMO DETALLES COMPLETOS DE VANOS, SE DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE CARTA N.° 96-2026-MDL/GM-C E INFORME N.° 1115-2026/MDL/GDT/GAQ LA ENTIDAD ESTABLECIÓ QUE SU ABSOLUCIÓN COMPRENDE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA, INCLU...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 115 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 14/08/2026

...onogramas correspondientes, conforme a lo establecido en el literal b) del articulo 206 del reglamento de la ley general de contrataciones publicas.en tal sentido, esta inspeccion deja constancia del incumplimiento de la obligacion de presentacion de la documentacion senalada, quedando su omision bajo responsabilidad del contratista, para los fines de control, seguimiento y demas acciones que corresponda...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 109 · Ampliaciones de plazo · SOEC_INSP · 13/08/2026

ASIENTO 109 - DEL INSPECTOR DE OBRA: EN RESPUESTA A LOS ASIENTOS N° 104 Y 105 DEL RESIDENTE DE OBRA, SE LE INDICA QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA FUE CORRECTAMENTE SOLICITADA POR EL RESIDENTE DE OBRA EL 01 DE JULIO DE 2026, DENTRO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 194 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASIMISMO, DICHA PRESTACIÓN ADICIONAL FUE DEBIDAMENTE APROBADO DENTRO DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 109 · Ampliaciones de plazo · SOEC_INSP · 13/08/2026

...mento, vencio el 12 de agosto, de acuerdo a lo dispuesto en los plazos establecidos en el articulo 192 del referido reglamento, los cuales a partir de hoy 13 de agosto es su entera responsabilidad el atraso que incurre el contratista por la falta de presentacion de la actualizacion del programa de ejecucion de obra y cronogramas. contabilizandose el atraso a partir de hoy 13 de agosto de 2026, imputabl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 105 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 08/08/2026

...mpliacion de plazo y el programa de ejecucion actualizado, conforme al procedimiento establecido en el articulo 200 del reglamento.se precisa que esta causal es distinta de aquella correspondiente al atraso no atribuible al contratista derivado de la demora en la solucion de la consulta n 03 y sera sustentada de manera independiente, sin considerar periodos superpuestos ni duplicar dias de ampliacion

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 104 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 08/08/2026

...a materia de la consulta n 03 y encontrarse habilitada contractualmente la ejecucion de la prestacion adicional de obra n 01, esta residencia deja constancia de la culminacion del hecho generador del atraso no atribuible al contratista, cuyo periodo de afectacion a la ruta critica se produjo desde el 16 de junio de 2026 hasta la fecha en que quedo efectivamente habilitada la ejecucion del referido adic...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 101 · Adicionales · SOEC_INSP · 05/08/2026 ASIENTO 101 - DEL INSPECTOR DE OBRA: SE DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 091-2026-MDL-C DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2026, LA ENTIDAD HA APROBADO LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE, CUYO PROCEDIMIENTO SE INICIÓ COMO CONSECUENCIA DE LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS Y REGISTRADAS EN EL ASIENTO N.º 66 DEL CUADERNO DE INCIDENCIAS, HABIÉNDOSE CUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO PREVIST... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 78 · Adicionales · SOEC_INSP · 17/07/2026 ASIENTO 78 - DEL INSPECTOR DE OBRA: EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 PRESENTADO A LA ENTIDAD MEDIANTE LA CARTA 46-2026/CSL/MDL EL DIA 17 DE JULIO DE 2026 ESTA INSPECCION ADJUNTA EL INFORME DE OBSERVACIONES DE DICHO EXPEDIENTE (INFORME N° 022-2026/MDL/GDTI/GAQ/IO-SCL) EN EL CUAL SE DESCRIBE 08 OBSERVACIONES DETECTADAS QUE DEBERAN SER SUBSANADAS EN UN PLAZO DE TRES (03) DIAS CA... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 77 · Adicionales · SOEC_INSP · 16/07/2026 ASIENTO 77 - DEL INSPECTOR DE OBRA: SE DEJA CONSTANCIA QUE, EN LA FECHA (16/07/2026), ESTA INSPECCIÓN HA RECIBIDO LA CARTA N.º 46-2026/CSL/MDL, MEDIANTE LA CUAL EL CONTRATISTA REMITE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE,.AL RESPECTO, ESTA INSPECCIÓN PROCEDERÁ A LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, A EFECTOS DE VERIFICAR... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
