


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra "mejoramiento y ampliacion de los servicios de agua potable y saneamiento en los anexos incuta, picutani y cuatro esquinas de la cc urinsaya picutani, yavina y chillihuani del distrito de santo tomas - provincia de chumbivilcas - departamento de cusco

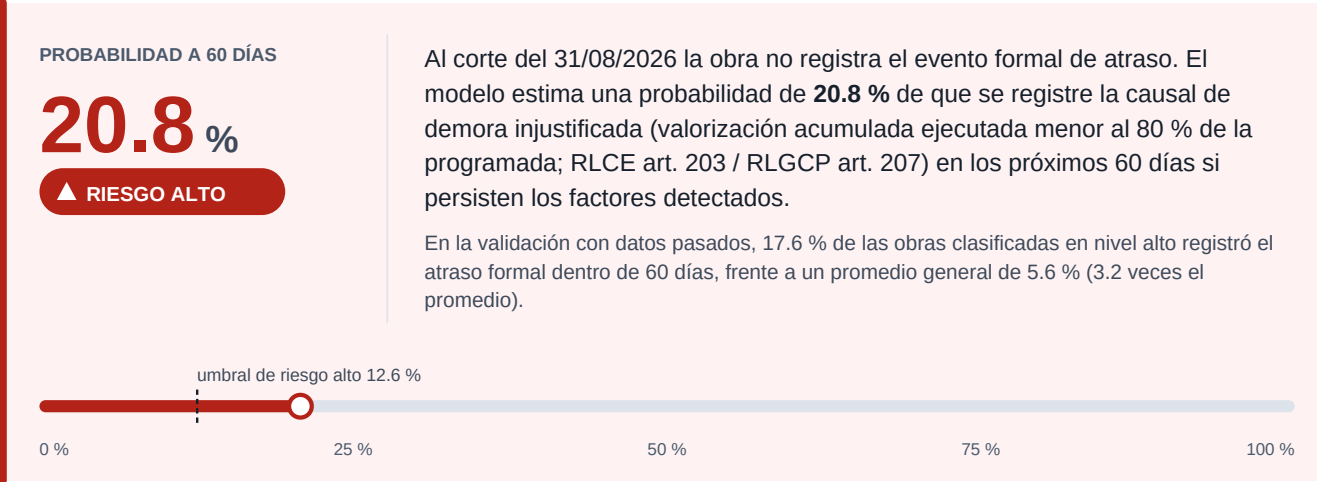


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	67 desde 11/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS INCUTA, PICUTANI Y CUATRO ESQUINAS DE LA CC URINSAYA PICUTANI, YAVINA Y CHILLIHUANI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS
Contratista	DJL GLOBAL CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DJL CONSTRUCTORES S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SANTO TOMAS / CHUMBIVILCAS / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2472604
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS INCUTA, PICUTANI Y CUATRO ESQUINAS DE LA CC URINSAYA PICUTANI, YAVINA Y CHILLIHUANI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2367346
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,594,440.18
Cuaderno de obra digital	67 asientos entre 11/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

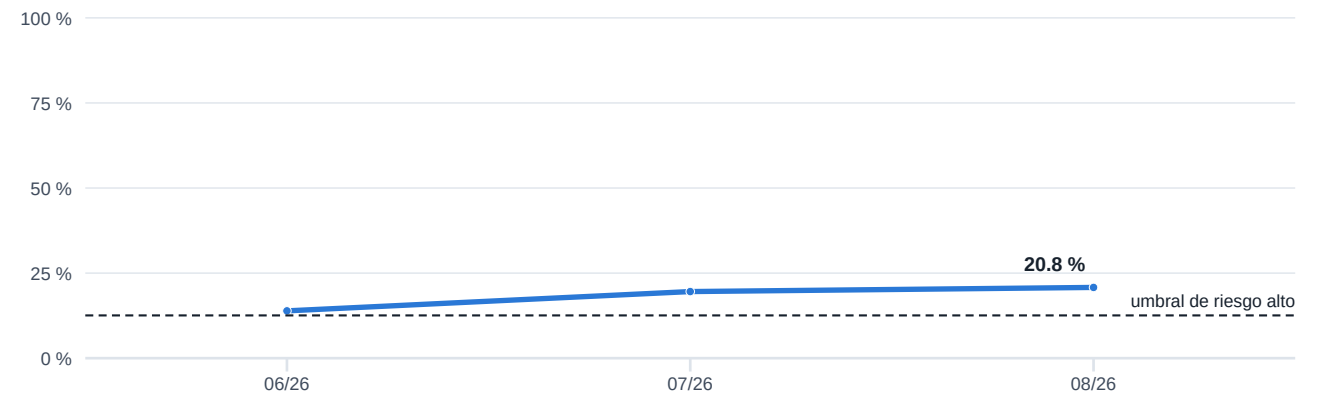

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.713
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.222
El 76 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.199
El 16 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.141
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
24 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.117
Departamento: Cusco	Características de la obra		-0.105
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.104

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	20.8 %	19.2 %	-1.6 pp
Absolver todas las consultas pendientes	20.8 %	20.8 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	20.8 %	20.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 66 · Órdenes · SOEC_SPV · 31/08/2026

...rsonal clave, evitando ausencias injustificadas que puedan afectar la adecuada ejecucion, control de calidad, cumplimiento de metas, plazo contractual y correcta aplicacion del expediente tecnico. el incumplimiento sera informado y registrado por esta supervision para las acciones que correspondan conforme al marco contractual vigente ante la entidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 61 · Órdenes · SOEC_SPV · 30/08/2026

...e el día 31/08/26 con la documentacion de sustento correspondiente (planillas de metrados, planos de replanteo, controles de calidad, partes diarios y demas documentacion pertinente), a fin de evitar retrasos en la formulacion, revision y tramite de la valorizacion mensual n 3 correspondiente al mes de agosto se deja constancia de que la conciliacion de metrados constituye un acto tecnico conjunto entre...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 60 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...ido con la presentacion y conformidad de la documentacion tecnica y de calidad exigible, segun corresponda.todo trabajo que sea ejecutado por el contratista sin autorizacion previa de la supervision, incumpliendo las disposiciones impartidas o sin haber presentado la documentacion tecnica requerida, sera de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutor, incluyendo las consecuencias tecnicas, economi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Órdenes · SOEC_SPV · 18/08/2026

PARA SU CUMPLIMIENTO: ...VIENE...Se precisa que, en caso la Entidad determine mediante pronunciamiento formal que las dimensiones correspondientes al ladrillo, zapatas y/o sobrecimientos son menores a las que actualmente viene ejecutando el Contratista, esta Supervisión no reconocerá ni aprobará mayores metrados, mayores costos o trabajos ejecutados que no se encuentren debidamente sustentados y autorizados, correspo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...bajos, especialmente para la preparacion de la cama de apoyo e instalacion de las tuberías.se recomienda adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar tiempos improductivos, paralizaciones y retrasos innecesarios, debiendo los recursos disponibles guardar correspondencia con el avance programado y los rendimientos previstos. la supervision continuara verificando el avance fisico y las condicion...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 45 · Órdenes · SOEC_SPV · 06/08/2026

...n asumira las consecuencias tecnicas, economicas, administrativas y legales que pudieran derivarse.se exhorta a la residencia de obra a adecuar su actuacion al procedimiento contractual vigente, bajo apercibimiento de comunicar estos hechos a la entidad para la adopcion de las acciones correspondientes conforme a la ley n. 32069, su reglamento y las disposiciones contractuales aplicables.se deja constanc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 40 · Órdenes · SOEC_SPV · 30/07/2026

...e el día 31/07/26 con la documentacion de sustento correspondiente (planillas de metrados, planos de replanteo, controles de calidad, partes diarios y demas documentacion pertinente), a fin de evitar retrasos en la formulacion, revision y tramite de la valorizacion mensual n 2 correspondiente al mes de junio se deja constancia de que la conciliacion de metrados constituye un acto tecnico conjunto entre ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 36 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/07/2026**

ACCION DE CUMPLIMIENTO: Mediante el presente asiento, la Supervisión reitera dar cumplimiento a lo requerido mediante asiento de cuaderno de incidencias N° 20 del supervisor de obra de fecha 07 de junio del 2026. en la cual solicitamos a la Residencia de Obra que todo material que ingrese al almacén de obra debe contar previamente con la autorización expresa de esta Supervisión, requisito sin el cual no se autorizar...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 36 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/07/2026**

...a asegurar que los materiales cumplan con las especificaciones tecnicas contractuales antes de su incorporacion a la obra.asimismo, se comunica formalmente el aviso de inicio del procedimiento de pre penalidad por la inasistencia del personal encargado del componente social, hecho que constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el expediente tecnico y en las bases del pro...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
