


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: ¿mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en seis instalaciones deportivas de los distritos de querecotillo, el distrito de el arenal, el distrito de miguel checa, el distrito de amotape de las provincias de paíta y sullana del departa

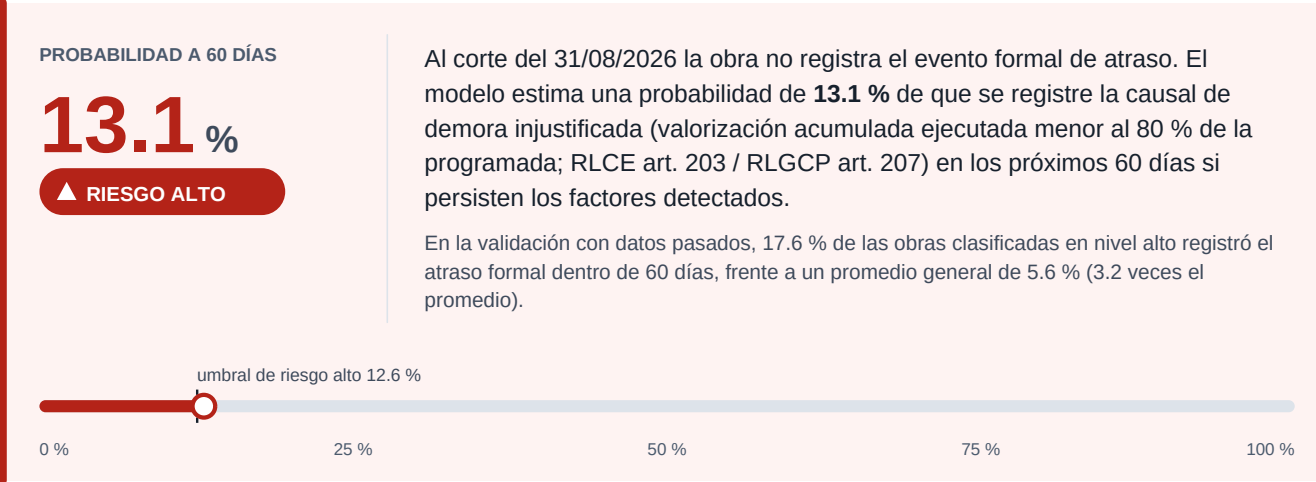

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	78 desde 15/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SEIS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS DISTRITOS DE QUERECOTILLO, EL DISTRITO DE EL ARENAL, EL DISTRITO DE MIGUEL CHECA, EL DISTRITO DE AMOTAPE DE LAS PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA DEL DEPARTA
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
Contratista	FRADIALE CONSTRUCTORES E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MIGUEL CHECA / SULLANA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2700450
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SEIS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS DISTRITOS DE QUERECOTILLO, EL DISTRITO DE EL ARENAL, EL DISTRITO DE MIGUEL CHECA, EL DISTRITO DE AMOTAPE DE LAS PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2377357
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 16,259,999.51

Cuaderno de obra digital

78 asientos entre 15/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

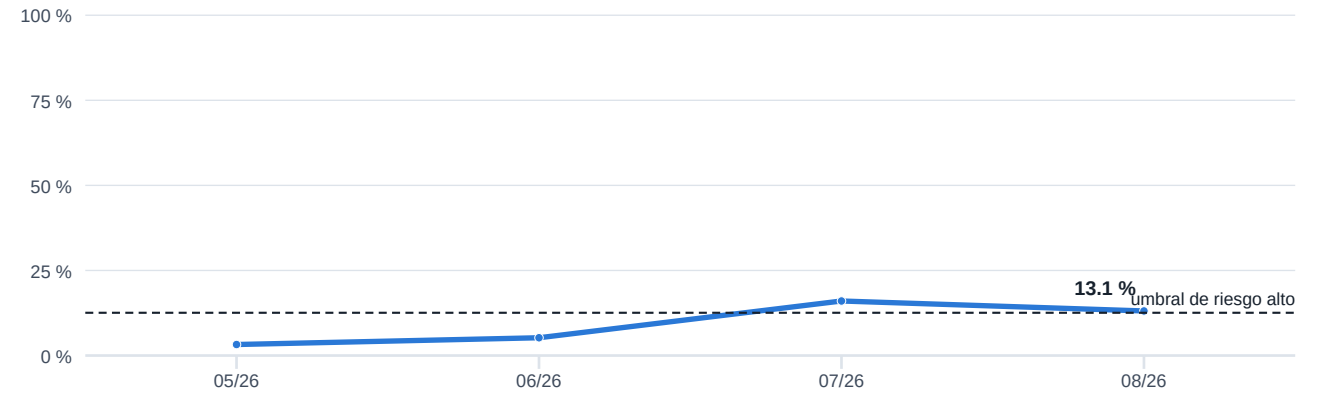

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.616
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.237
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.222
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 11,411,043	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.131
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.104
Extensión media de los asientos recientes: 1,177 caracteres	Contenido de los asientos		-0.064
Departamento: Piura	Características de la obra		-0.050

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.1 %	12.9 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.1 %	13.1 %	-0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	13.1 %	13.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 64 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

...06) instalaciones deportivas de los distritos de querecotillo, el arenal, miguel checa y amotape, a fin de garantizar la culminacion satisfactoria de la obra en el plazo otorgado y evitar incurrir en retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

...za el traslado a la entidad de la solicitud de ampliacion de plazo n 01, sustentada en la presunta modificacion y afectacion de la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente a causa de la demora en la absolucion de la consulta de obra n 01. al respecto, esta supervision precisa y dispone lo siguiente:recepcion documentaria: se ratifica la recepcion del expediente de la solicitud de ampliacion...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 55 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...blicas. el dia de hoy se cumple con alcanzar la solicitud de ampliacion de plazo n01 a la entidad, como consecuencia de modificacion de la ruta critica del programa de ejecucion vigente a causa de la demora en absolucion de consulta de obra n01, la misma que fue alcanza el dia de ayer al supervisor para revision y emision de opinion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 25/07/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 49 - NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: En atención al Asiento N° 49 de fecha 25/07/2026, registrado por el Residente de Obra, mediante el cual deja constancia del cierre de la causal generadora del atraso referente a la Ampliación de Plazo N° 01 —tras la recepción de la Carta Múltiple N° 284-2026/GRP-401000 que absuelve la Consulta de Obra N° 01—, esta Supervisión ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 50 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 25/07/2026

...e de causal de ampliacion de plazo n 01 . en atencion al asiento n 49 de fecha 25/07/2026, registrado por el residente de obra, mediante el cual deja constancia del cierre de la causal generadora del atraso referente a la ampliacion de plazo n 01 tras la recepcion de la carta multiple n 284-2026/grp-401000 que absuelve la consulta de obra n 01, esta supervision toma conocimiento y manifiesta lo siguen...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 38 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/07/2026

...ave. al respecto, esta supervision expresa sus condolencias a los familiares y al equipo tecnico, y emite el siguiente pronunciamiento en estricto cumplimiento de la normativa vigente:1. exclusion de penalidad por causal no imputablese toma conocimiento del fallecimiento del profesional , configurandose un hecho fortuito / fuerza mayor plenamente justificado y no imputable al contratista. por lo tanto, de ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/07/2026

RESPUESTA A ASIENTO N° 36 - COMUNICACIÓN DE FALLECIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE PROFESIONAL CLAVE: 2. Plazo y Requisitos para presentar la Propuesta de SustituciónA fin de no afectar la continuidad de la obra y asegurar la legalidad del procedimiento, se instruye al Contratista a formalizar la solicitud de sustitución cumpliendo rigurosamente con lo siguiente:Plazo de presentación: El Contratista deberá p...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 40 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/07/2026

...y fisica la continuacion de la ejecucion de las actividades en la obra.impacto real en la ruta critica: si bien el deceso del ing. miguel jesus chavez vilchez constituye un caso fortuito que exime de penalidades al contratista por su ausencia, sus funciones como especialista en metrados, costos y valorizaciones son de naturaleza netamente tecnica, administrativa y de gabinete. su lamentable perdida no gene...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
