


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra "creacion del sistema de agua potable y alcantarillado en la asociacion de vivienda la union santa rosa de lima del C.P. La merced del distrito de sayan - provincia de huaura - departamento de lima" c.u.i. N° 2486493 meta ii sistema de alcantarillado

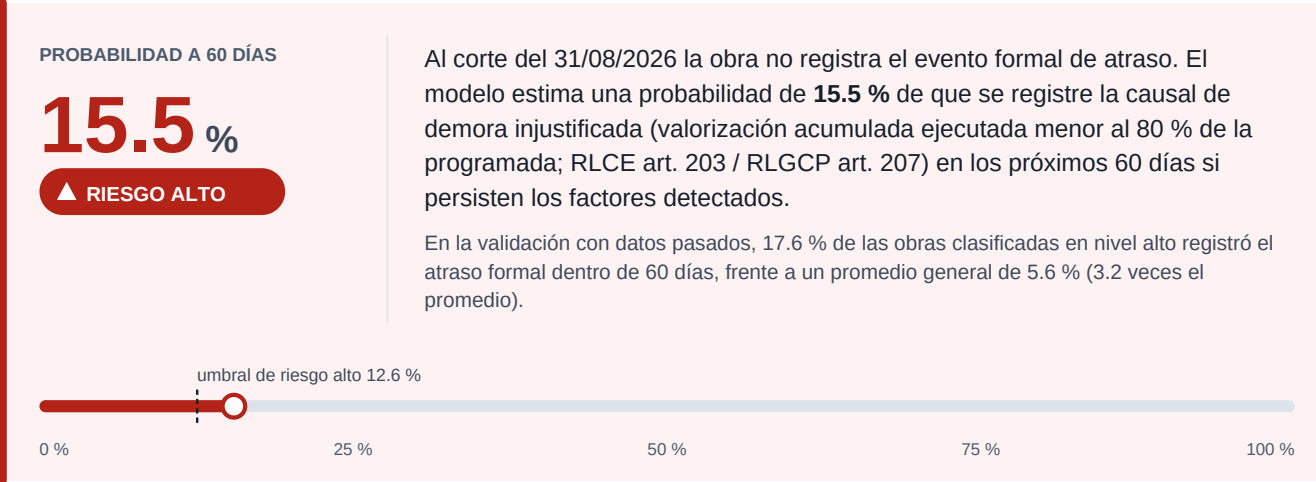


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	60 días	59 desde 04/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA UNION SANTA ROSA DE LIMA DEL C.P. LA MERCED DEL DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA" C.U.I. N° 2486493 META II SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
Contratista	CONSORCIO VARA INVERSIONES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAYAN / HUAURA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2486493
Inversión asociada	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA UNION SANTA ROSA DE LIMA DEL C.P. LA MERCED DEL DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2407187
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 648,391.29
Cuaderno de obra digital	59 asientos entre 04/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

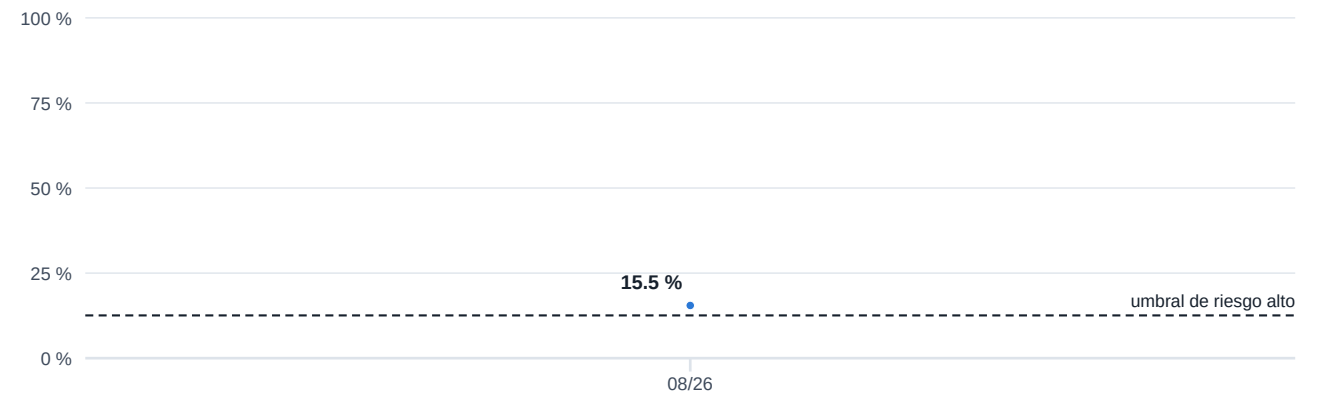

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.578
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.220
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.190
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.157
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.106
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.095
El plazo original venció hace 2,093 días	Datos del contrato		-0.075

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.5 %	15.5 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.5 %	15.5 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	15.5 %	15.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 50 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

DISEÑOS DE MEZCLA, ENSAYOS PROCTOR Y PROGRAMACIÓN DE DENSIDADES DE CAMPO: Esta Supervisión SOLICITA al Contratista la presentación obligatoria de los siguientes entregables: 1. DISEÑO DE MEZCLA (Partida 02.05.03): El Contratista deberá presentar a la brevedad, para revisión y aprobación de la Supervisión, los estudios de diseño de mezcla de concreto para los buzones de inspección (Partidas 02.04.02.02 y 02.04.02.03). ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 45 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 26/08/2026

...on de las partidas posteriores por lo expuesto, se deja expresa constancia de la situación descrita para los fines correspondientes, solicitando que se adopten las acciones necesarias para no caer en retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...dos en el expediente técnico se presentaron disueltos (inexistentes/borrados por el tiempo) al momento de iniciar la ejecución, esto con la finalidad de validar la nueva red de apoyo topográfico y no retrasar los trabajos. finalmente, se deja constancia de que nos encontramos a la espera del pronunciamiento formal por parte de la entidad respecto a la solicitud de cambio de tipo de cemento conforme a lo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 23 · Consultas · SOEC_RESI · 14/08/2026

... proyecto requerimos únicamente 1,097.38 bolsas, es posible que no se nos atienda a tiempo, con dicha condición se imposibilita la adquisición del cemento, y al esperar stock es posible que se genere retrasos y/o paralizaciones por eventos no atribuibles al contratista. además, según cotizaciones hechas no hay variación de precios respecto al presupuesto de obra. por lo tanto, solicitamos la autorizacio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...mal) con el fin de garantizar la seguridad del personal y evitar desprendimientos, debiendo anticiparse con el suministro oportuno de los materiales y estructuras del entibado en obra para no generar retrasos, finalmente, con respecto al trazo y replanteo, se reitera lo dispuesto en el asiento n 014, debiendo el contratista presentar el informe técnico analítico y la simulación hidráulica sustentada tra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 08/08/2026

...l contratista y no justifica modificar las especificaciones de alcantarillado. se exhorta al contratista a abastecer la obra inmediatamente con cemento portland tipo v para cumplir el cronograma, bajo apercibimiento de aplicarse las penalidades contractuales correspondientes por retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 08/08/2026

DENEGACIÓN DE CAMBIO DE CEMENTO EN BUZONES: En respuesta al Asiento N° 011 del Residente de Obra, mediante el cual solicita la sustitución del Cemento Portland Tipo V por Cemento Hidráulico Tipo HS en las partidas de "OBRAS DE CONCRETO EN BUZONES", esta Supervisión resuelve DENEGAR de forma inapelable lo solicitado, en estricta salvaguarda de la ruta crítica y calidad del proyecto: 1. FALTA DE SUSTENTO: El Contratista...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

CONTROL DE TRABAJOS PRELIMINARES,: Esta supervisión se constituyó en campo a fin de realizar el control técnico, seguimiento y verificación de los procesos constructivos ejecutados por el contratista en la Asociación de Vivienda La Unión Santa Rosa de Lima del C.P. La Merced. Al respecto, se hace constar que se continúan las labores correspondientes al Trazo y Replanteo Iniciales del Proyecto, pertenecientes al rubro ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...era al residente de obra que, en estricto cumplimiento de las bases y el artículo 206 del reglamento, se encuentra proximo a vencer el plazo perentorio de siete (7) días calendario segun el cuadro de penalidades del contrato n007-2026-gm/mds para la entrega formal de calendarios actualizados, contabilizados desde el inicio de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
