


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

¿creacion del servicio de agua potable urbano y creacion del servicio de alcantarillado en la asociacion provivienda virgen de fatima, distrito de lambayeque, provincia de lambayeque¿, con código único de inversión N° 2653025

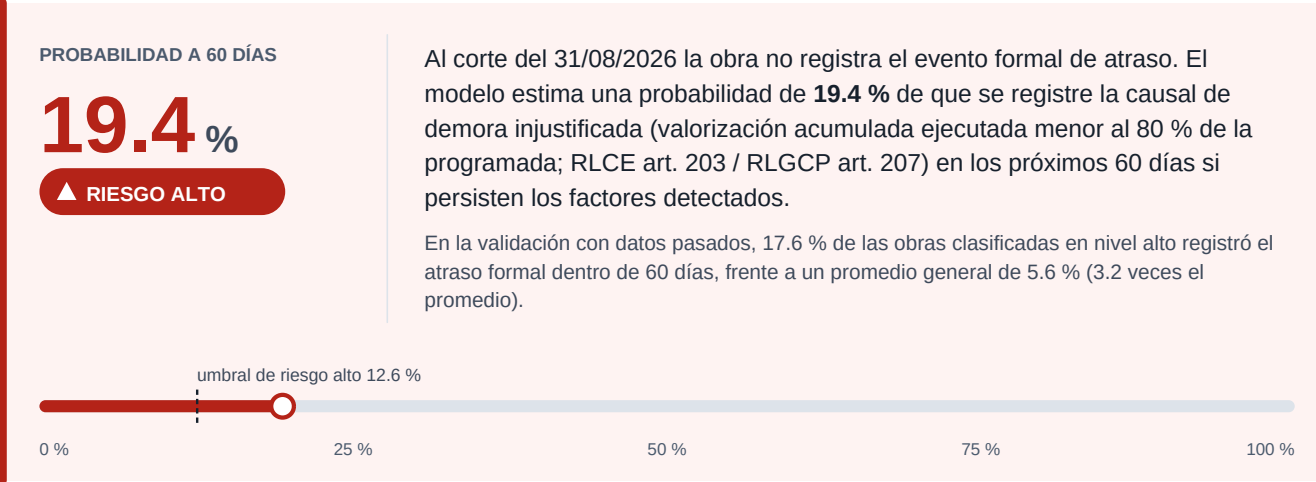


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	62 desde 17/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE¿, con Código Único de Inversión N° 2653025
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SANTA MARIA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2653025
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2405174
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,931,702.04
Cuaderno de obra digital	62 asientos entre 17/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

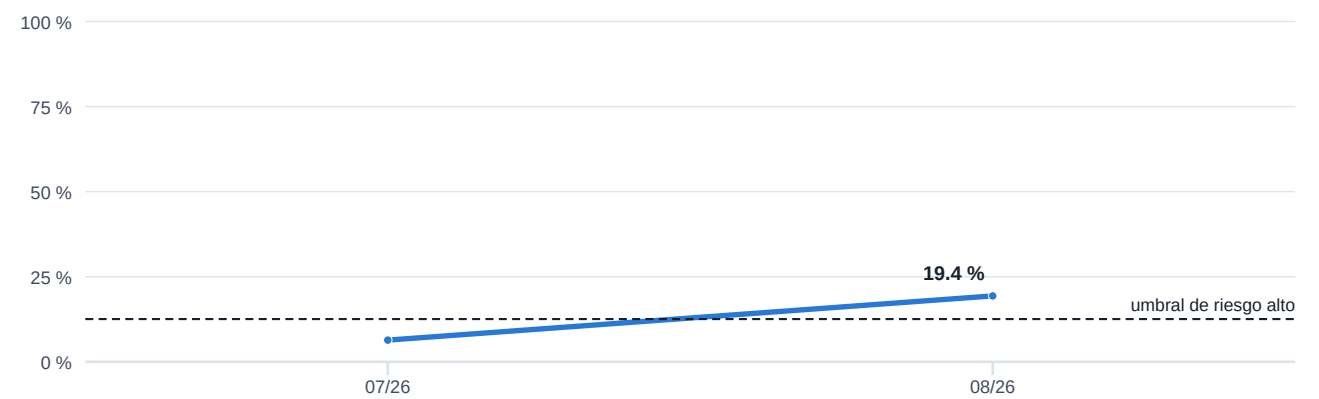

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.636
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.203
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.202
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.201
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.110
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.099
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.097
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.090

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	19.4 %	19.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 26 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 10/08/2026

AVANCE DE TRABAJOS: CONTINUARON LAS CHARLAS DIARIAS A CARGO DEL ING. DE SEGURIDAD Y CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL, RESIDENTE Y DEMAS ESPECIALISTAS ASI COMO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA SABADO NO SE LABORÓ LO CUAL NO FUE COMUNICADO A ESTA SUPERVISIÓN LAS RAZONES DE ESTA DECISIÓN LO CUAL VIENE AFECTANDO LOS AVANCES DE LA OBRA, ESTO FUE COMUNICADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA. EL DIA DE H...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

... la supervision. se constato la ausencia de la maquinaria (retroexcavadora) sin ninguna justificacion por lo que el dia de hoy no se ejecutaron trabajos de excavacion de zanjas lo cual viene generando atrasos en los trabajos segun lo programado en el cronograma actualizado de obra. se exige al contratista cumplir con la programacion de obra para lo cual debera implementar a la brevedad posible la maquin...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

AVANCE DE TRABAJOS: SE VERIFICA LA CHARLA DIARIA A CARGO DEL INGENIERO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA. CONTINUA LA EXCAVACIÓN DE TERRENO MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES. SE RECOMIENDA AL RESIDENTE QUE DEBERÁ IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS TALES COMO CINTAS O MALLAS ALREDEDOR DE LOS PUNTOS DE EXCAVACIÓN DE BUZONES A FIN DE EVITAR ACCIDENTES. SE REITERA AL CONTRATISTA QUE AL HABERSE APROBADO EL PLANO ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

...as para la instalacion de la tuberia pvc uf dn 200mm, teniendo en cuenta que de acuerdo a la programacion estos trabajos deberian iniciarse a partir del 01/08/2026, por lo que se viene incurriendo en atraso lo cual no esta justificado, por lo que debera movilizar a obra la maquinaria necesaria para ejecutar estos trabajos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 19 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

AVANCE DE TRABAJOS: SE VERIFICA LA CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA A CARGO DEL INGENIERO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA. SE LE INDICA AL RESIDENTE COLOCAR LAS SEÑALIZACIONES NECESARIAS EN OBRA Y COLOCAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE ESTA EXCAVANDO EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BUZONES. AL HABERSE APROBADO EL PLANO DE REPLANTEO PARCIAL SE LE INDICA AL R...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 01/08/2026

...n y alineamiento de tuberías de alcantarillado. construccion de buzones. riesgos asociados las interferencias identificadas constituyen riesgos que afectan el normal desarrollo de la obra, entre ellos: demora en el inicio y continuidad de las excavaciones. paralización o reprogramación de la construccion de buzones. retraso en la instalacion de tuberías de alcantarillado. incremento de tiempos por la nece...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 4 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026

inicio de obra . con fecha 24.07.26 se autoriza el cambio de residente a mi persona. con fecha 24.07.26 se inicia el plazo contractual y se firma el acta de inicio de obra. el dia de hoy (30.07.26) se habilita el cuaderno de obra digital a mi persona como residente de o...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
