


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de obra: Mejoramiento de la prestacion del servicio de gestion educativa en la direccion regional sectorial de educacion tacna, distrito coronel gregorio albarracin lanchipa, tacna tacna CUI n 2302998.

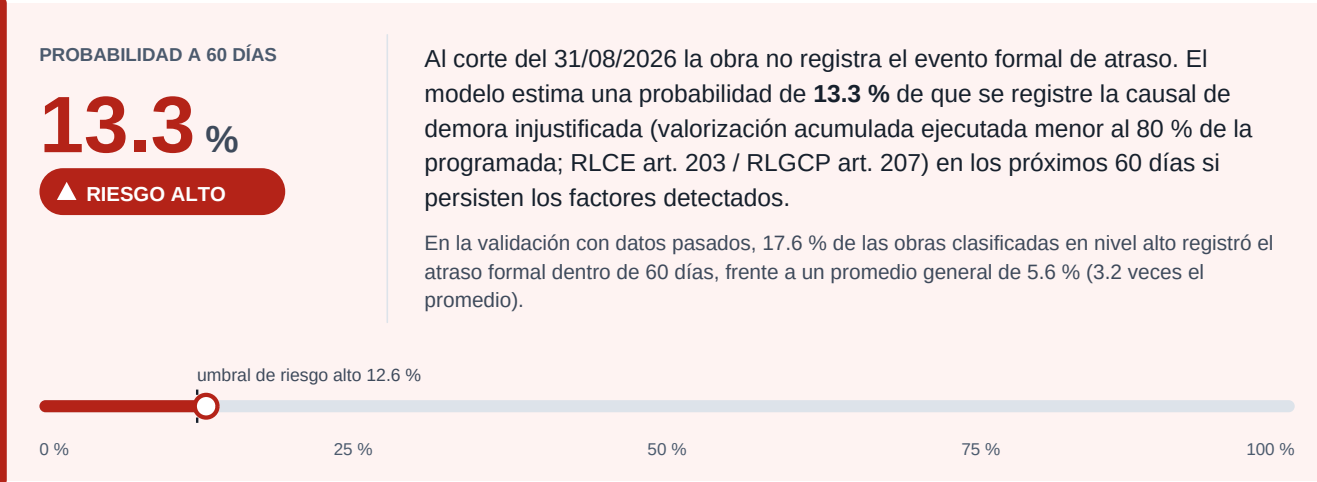


|                    |                |                           |                |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO     | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 56,371,067.36   | 660 días       | 1,230<br>desde 08/08/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION EDUCATIVA EN LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION TACNA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA TACNA CUI N 2302998. |
| Entidad contratante                             | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Sede Central                                                                                                                                                                                                |
| Contratista                                     | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SUR                                                                                                                                                                                                          |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA                                                                                                                                                                                   |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2302998                                                                                                                                                                                                                                |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACIÓN TACNA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA - TACNA.                                                   |
| Función                                         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                        |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2339080                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto del contrato                              | S/ 56,371,067.36                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 17,227,220.00                                                                                                                                                                                                                       |
| Cuaderno de obra digital                        | 1230 asientos entre 08/08/2025 y 31/08/2026                                                                                                                                                                                            |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

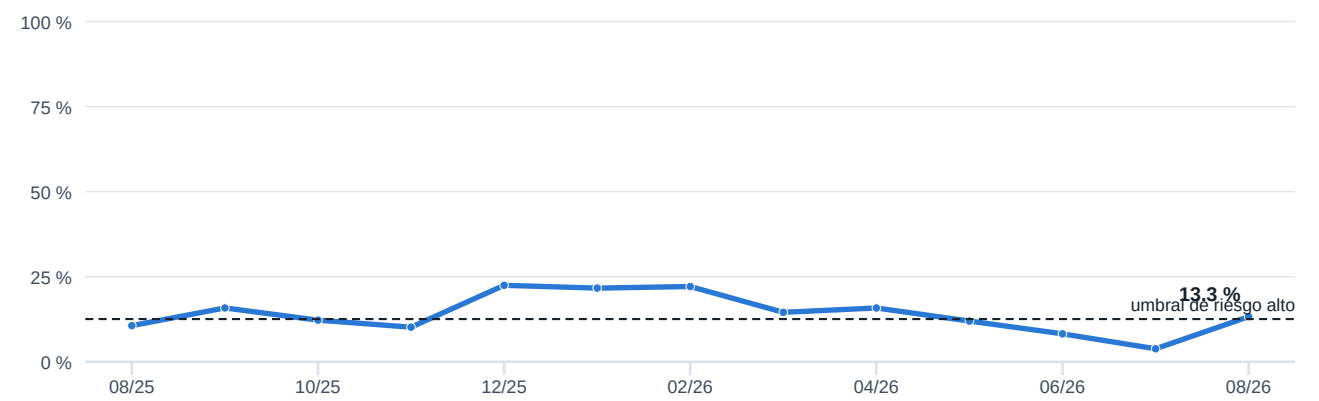

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.535 |
| El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.266 |
| Departamento: Tacna                                                                                     | Características de la obra     | <div></div>    | +0.243 |
| El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.160 |
| Faltan 273 días para el fin del plazo original                                                          | Datos del contrato             | <div></div>    | -0.149 |
| 1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno                                     | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.138 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.113 |
| Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 4,431,916                                                    | Ejecución del gasto (SIAF)     | <div></div>    | -0.105 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes                 | 13.3 % | 13.1 %    | -0.2 pp |
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 13.3 % | 13.3 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 1221 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 31/08/2026

*anotacion de demora en emision de resolucion de adicionales de obra n 01 y n 02 . en respuesta a los asientos n 1216 y n 1217, la supervision precisa que la emision y notificacion de las resoluciones que se pronuncien s...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1217 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 28/08/2026

*demora de la entidad en la emision y notificacion de la resolucion sobre la procedencia de ejecucion de la prestacion adicional de obra n. 02 configuracion de causal de ampliacion de plazo . se deja constan...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1216 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 28/08/2026

*demora de la entidad en la emision y notificacion de la resolucion sobre la procedencia de ejecucion de la prestacion adicional de obra n. 01 configuracion de causal de ampliacion de plazo . se deja constan...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1214 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 27/08/2026

*SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA RELLENO Y COMPACTACIÓN EN EL BLOQUE 9 (B9): SE HACE DE CONOCIMIENTO, Y SE SOLICITA AL SUPERVISOR DE OBRA PROCEDER CON LA REVISIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA ZONA DE RELLENO, Y SU LIBERACIÓN RESPECTIVA, PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACIÓN EN EL BLOQUE 9 (B9), DE LA PARTIDA 02.09.01.05.00.00. PARA LO CUAL, SE EMPLEARÁN MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONADO, Y EQUIPOS LIVIANOS,...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1209 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 26/08/2026

*EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REVISIÓN, LIBERACIÓN Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN BLOQUE 06 Y BLOQUE 14: EN RESPUESTA A LOS ASIENTOS N° 1206 Y N° 1207 DEL RESIDENTE DE OBRA, ESTA SUPERVISIÓN TOMA CONOCIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS FRENTE DE TRABAJO Y COMUNICA QUE EL EQUIPO TÉCNICO PROCEDERÁ EN CAMPO A REALIZAR LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DETALLADA DEL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADOS (CARAVISTA Y NORMAL), CO...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1189 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 20/08/2026

*...es programadas en los frentes de trabajo, tal como se acredita mediante el registro fotografico adjunto al presente asiento, por lo que desestimamos categoricamente cualquier intento de atribucion de retrasos injustificados o reserva de derecho respecto a dicho evento meteorologico.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1162 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 14/08/2026

*...l 1083, 1087 al 1089, 1093, 1096 al 1098, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1121, 1122, 1127 y 1128, mediante los cuales se dejo constancia de la restricción crítica de liquidez del proyecto derivada del incumplimiento de la entidad en el pago de valorizaciones y desembolso de adelantos vinculados al fideicomiso, así como de la consecuente afectación y paralización de las actividades de ejecución de obra reg...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 1152 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 10/08/2026

*TRABAJOS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL CONTRATISTA: DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL REINICIO DE LABORES, LA SUPERVISIÓN DE OBRA FISCALIZÓ Y CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO Y LABORES PERMANENTES DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS FRENTE DE TRABAJO. AL RESPECTO, SE VERIFICÓ QUE DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN EN Estricto cumplimiento de los estándares ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 1147 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 03/08/2026**

...unicaciones formales y asientos del cuaderno de obra emitidos con anterioridad a la suspensión del plazo contractual, los cuales evidenciaron el desequilibrio económico-financiero generado por dichos incumplimientos.no obstante, lo anterior, el contratista procede al reinicio de la ejecución de la obra en cumplimiento del acta de levantamiento de suspensión del plazo contractual y de las condiciones acor...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 440 · Aplicación de penalidades · SOEC\_INSP · 15/12/2025**

ROL DE INSPECTOR DE OBRA(AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE SSOMA): En atención del asiento n° 438/439, el personal clave SSOMA de la contratista no ha presentado su descargo correspondiente por la ausencia en obra los días viernes 12/12/2025 y sábado 13/12/2025, así como el día 15/12/2025, en el cual esta inspección a la hora de registro del asiento no ha podido encontrar en obra al profesional SSOMA, por lo tanto ha incurri...

Fuente: cod-asientos202512.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
